Valortec
Tasaciones

Valortec Tasaciones


BBVA

N° de Solicitud Banco	1383350
N° de Servicio Tasadora	06-26-68-BBVA
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de Caducidad	20-Jun-2027

BANCO BBVA PERU

CONSTRUYO SEGUNDO TRAMO







Tipo de Tasación	Hipotecaria	Nueva		**N° de Garantía**	
Solicitante	BANCO BBVA PERÚ	OF.	CC EL TRIGAL	FUNC.	Nicole Torres Paucar
Cliente	NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO				
Propietario (s)	NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO y NORMA ELIZABETH FERREYRA SANCHEZ SUAREZ DE ZLOSILO				
Fecha de inspección	12/06/2026				
Dirección Registral	UNIDAD INMOBILIARIA 12 CON FRENTE A LA AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE NUMERO 470, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				
Dirección Municipal	ALM. MANUEL PRADO UGARTECHE N° 470 UI 12 RINCONADA BAJA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				
Dirección según inspección ocular	UNIDAD INMOBILIARIA S/N CON FRENTE A LA AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE NUMERO 470, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				
Tipo de inmueble	Casa Habitación	**Ocupante**	Desocupado		

Descripción	TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
	En construcción			

Zonificación	RDMB		**Material de construcción**	Ladrillo	
Año de construcción	En construcción		**Obra finalizada**	SÍ	NO
	*De acuerdo a expediente documental y tipo de construcción predominante				
Area de terreno	703.93 m²		**Área construida**	395.55 m²	
Declaratoria de fábrica	No tiene		**Gravámenes**	Sí, ver cuadro detalle	
Cargas	No				
Zona de Peligrosidad	SI	NO X	**Predio rústico**	SI	NO X
Zona de Riesgo (desastre natural)	SI	NO X	**Terreno agrícola o forestal**	Ninguno.	

VALORES TOTALES	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACION PROYECTADA
VALOR COMERCIAL PROYECTADO	US$	1,195,127.32	675,772.80	519,354.52
	S/	4,077,774.41	2,305,736.79	1,772,037.62
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	956,101.86	540,618.24	415,483.62
	S/	3,262,219.53	1,844,589.43	1,417,630.10

VALORES INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN
VALOR COMERCIAL	US$	675,772.80	675,772.80	
	S/	2,305,736.79	2,305,736.79	
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	540,618.24	540,618.24	
	S/	1,844,589.43	1,844,589.43	

VALORES NO INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN
VALOR COMERCIAL	US$	519,354.52		519,354.52
	S/	1,772,037.62		1,772,037.62
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	415,483.62		415,483.62
	S/	1,417,630.10		1,417,630.10

VALORES NO INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA
VALOR COMERCIAL	US$	519,354.52	222,456.92	42.83%
	S/	1,772,037.62	759,023.00	
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	415,483.62	177,965.53	42.83%
	S/	1,417,630.10	607,218.40	

VALORES DE RECONSTRUCCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL (VSN PROYECTADO)	VALOR DE RECONSTRUCCIÓN (VSN DEL AVANCE)	(VSN PENDIENTE)	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN
V. RECONSTRUCCIÓN (INCL. CONSTRUCCIONES DECLAR. Y NO DECLAR.)	US$	519,354.52	222,456.91	296,897.60	15 de Setiembre de 2026
	S/	1,772,037.61	759,022.99	1,013,014.62	

Tipo de cambio aplicado 3.412 Soles / Dólar

Observaciones

Se corrobora la ubicación del inmueble mediante las numeraciones halladas in situ y del colindante.

Atendió durante la inspección ocular el Arq. Renzo Gonzales

Según información del banco el inicio de la obra fue el 15 de enero de 2026 y finalizaría el 15 de setiembre de 2026, cabe precisar que esto no guarda relación con el cronograma enviado.

Hipoteca: Inscrita en el asiento D0002 de la p.E. N° 14046330 a favor del BANCO BBVA PERU hasta por la suma de US$ 462,315.00 dólares americanos. Así consta en la escritura pública del 29 de enero de 2025.

Según lo solicitado por el banco se trata de un informe de valorización parcial para el financiamiento de la futura edificación para el cliente Nicola Dávila Zlosilo Toso. Para el desarrollo del presente informe se consideran los documentos adjuntos en los anexos, correspondientes, al presupuesto, cronograma de obra, licencia de edificación, presupuesto disgregado de gastos generales, solicitud construyo (formato de solicitud del banco), planos de arquitectura y memoria descriptiva, Partida registral del inmueble, Hoja Resumen y Predio Urbano del Autoavalúo.

Se cuenta con autorización del área de operaciones para realizar este informe de valorización parcial el cual esta alineada a la licencia de edificación y el monto que se indica en el presupuesto, el cual asciende a S/. 1,772,037.61 Soles donde el responsable profesional de dicha propuesta es el Ingeniero Pedro Luis Yarleque CIP 292673.

Se observa que el presupuesto presentado genera un valor unitario aproximado de US$ 1,312.99 de área construida, calculado sobre un área construida/techada de 395.55 m² correspondiente a la vivienda principal, el cual supera los rangos referenciales usualmente considerados para edificaciones de vivienda unifamiliar de características similares, por lo que se recomienda que el profesional responsable sustente técnicamente los costos, acabados y partidas consideradas, a fin de que se evalúe la razonabilidad económica del presupuesto presentado.

A la fecha de inspección realizada el 12/06/2026, se verificó que la estructura de concreto armado y los muros de albañilería, completamento tarrajeados,de la edificación de dos niveles se encuentran ejecutados. Asimismo, se observó avance parcial en las instalaciones eléctricas y sanitarias. La piscina se encuentra pendiente y no se evidenció la escalera de concreto contemplada en el cronograma de obra.

Advertencias **Ninguna.**

Inmueble en zona de riesgo SÍ NO X **Ninguna.**

Valor comercial Tasación Anterior US$ S/ FECHA PERITO

PERITO	ING. FRANK SALAZAR OCAMPO
REPEV	CIP: 279570

PERITO	ING. JOSE HUARACHI MARILUZ
	CIP: 220317
	VALORTEC SAC
REPEV	RESOLUCION S.B.S. N° 1147-2012

Valortec Tasaciones

BBVA

N° de Solicitud Banco	**1383350**
N° de Servicio Tasadora	**06-26-68-BBVA**
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de caducidad	20-Jun-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. INFORMACION GENERAL

Objeto y Propósito

Estimar el Valor Comercial del inmueble para fines de Garantía Hipotecaria

Alcance y Limitaciones

Durante la visita SI se dieron las facilidades para la inspección ocular y toma de registro fotográfico al interior del inmueble.

Reglamentación

Reglamento Nacional de Tasaciones según R.M. N° 172-2016-VIVIENDA, Modificatoria R.M. N° 424-2017-VIVIENDA, Modificatoria R.M. N° 124-2020 - VIVIENDA y la Resolución S.B.S N° 11356-2008 para la determinación del valor de realización en el mercado.

Metodología Empleada

Se utilizan los Métodos Directos (Comparación, Costos) o Indirectos establecidos en el Artículo 3. Inciso 3.1.5 del Título I del Reglamento Nacional de Tasaciones.

Documentación Proporcionada

X	Partida Registral	X	Predio Urbano	X	Planos		CRI
	Parámetros Urb.		Tasación anterior		Cuadro de acabados	X	Memoria Des.
X	Otros	Especificar		Presupuesto de obra, Licencia de construcción			

Titulación e Inscripción

Lote	Partida Electrónica	Nº	14046330	Fecha	6/04/2026

La valuación se efectúa con total independencia de criterio, aplicando las normas vigentes; no asumiendo responsabilidad el perito, por la veracidad o no de la información y de los documentos proporcionados por el cliente y solicitante. De igual manera se exime de los vicios ocultos, deficiencias generadas en el proceso de construcción como las características físicas y estructurales que no se pueden verificar y evidenciar durante la inspección.

2. DATOS GENERALES

Tipo de Tasación	Nueva		Hipotecaria		CONSTRUYO SEGUNDO TRAMO
Solicitante	BANCO BBVA	**Of.**	CC EL TRIGAL	**Func.**	Nicole Torres Paucar
Cliente	**NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO**				
Propietario(s)	**NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO y NORMA ELIZABETH FERREYRA SANCHEZ SUAREZ DE ZLOSILO**				
Fecha de Inspección	12/06/2026	**Ocupante**	Desocupado	**En construcción**	
Georeferencias	Latitud/Longitud	-12.081666	/ -76.936839	(*) Datos obtenidos Google Maps	
Ubicación según Partida Electrónica	UNIDAD INMOBILIARIA 12 CON FRENTE A LA AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE NUMERO 470, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				
Ubicación según el Predio Urbano	ALM. MANUEL PRADO UGARTECHE N° 470 UI 12 RINCONADA BAJA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				
Ubicación Según la Inspección Ocular	UNIDAD INMOBILIARIA S/N CON FRENTE A LA AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE NUMERO 470, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.				

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL ENTORNO

Características del Sector y del Entorno

Tipo de Zona	Urbana	Nivel Socioeconómico	Estrato Medio
Uso Predominante	Vivienda	Altura de Edificación	Media
Tendencia del Desarrollo Urbano	Consolidado Homogéneo	Estado de Conservación	Bueno
Demanda / Interés	Media	Velocidad de Cambio	Media
Desarrollo	Estacionario		

Equipamiento del Entorno

	Nivel de Equipamiento		Nivel de Equipamiento
Comercial	Escaso	Asistencial	Escaso
Escolar	Suficiente	Áreas Verdes	Escaso
Estacionamiento	Suficiente	Zonas recreativas	Suficiente

Infraestructura de Servicio Urbano

	Dispone	Calidad	Estado de Conservación
Vías Asfaltadas o concreto	Completas	Medio	Bueno
Veredas	Completas	Medio	Bueno
Alcantarillado	Completas	Medio	Bueno
Agua Potable	Completas	Medio	Bueno
Alumbrado	Completas	Medio	Bueno

Vías Principales del Entorno: Av Raul Ferrero, Av. Rinconada Baja.

4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Terreno

Forma / Topografía	Zonificación	Ubicación	Zona de Riesgo
Regular / Plana	RDMB	En Condominio	No

Número de frentes
1

Construcciones y Obras Complementarias

Material Estructural	Edad Efectiva (años)	Declaratoria de Fábrica	Estado de Conservación
Ladrillo	1	No tiene	Muy Bueno

Descripción General

TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
En construcción	100%		

Tipo de Inmueble	Gravámenes	Cargas	Obras Complementarias
Casa Habitación	Sí, ver cuadro detalle	No	No

N° de Pisos de la Edificación	N° de Piso ocupado	N° Sótanos	Conexión de Servicios
2	Todos	0	Sí, todos

Áreas Comúnes	Mantenimiento	Vista Inmueble	Ascensor
Sí, especificadas en cuadro detalle	Regularmente	Interior	No

Descripción y Distribución Detallada del Inmueble

Se trata de un inmueble tipo casa habitación ubicado dentro de un condominio el cual se encuentra en construcción, encontrándose actualmente en proceso de construcción, habiendo terminado el piso 1 y 2, quedando pendiente acabados e instalaciones en general.
Se encuentra en cercanías a Centro de Salud La Molina, Universidad Agraria de la Molina, Club Hípico Militar, Molicentro y entre otros.

Distribución a futuro:
Piso 1: Sala principal, terraza techada, cocina, área de servicio, cochera y estudio.
Piso 2: Habitación principal, 2 habitaciones secundarias, sala de estar, almacén o depósito.

Valortec Tasaciones

BBVA

N° de Solicitud Banco	**1383350**
N° de Servicio Tasadora	**06-26-68-BBVA**
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de Caducidad	20-Jun-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. LINDEROS

Orientación		Medida (Metros)
Frente	Curva Área comun	11.43
Izquierda	Unidad Inmobiliaria 13	32.21
Derecha	Unidad Inmobiliaria 11	47.15
Fondo	Colinda con propiedad de terceros	37.77
		128.56

2. TERRENO

Unidad Inmobiliaria	Unidad Métrica	A.M. Prop. Horiz/ Vert.	% Participación	Área Privativa	Obtención del Área	Observación
Lote	m2		5.38%	703.93	F. Reg/Part. Elect	-
Total área de terreno			5.38%	703.93		

3. CONSTRUCCIÓN

INMUEBLE PRINCIPAL

Descripción	Unidad Métrica	Área Techada	Área sin Techar	Área Ocupada	Obtención del Área	Edificación Declarada
Piso 1	m2	218.00			Solicitud	No
piso 2	m2	177.55			Solicitud	No
Total áreas construidas		395.55				

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Calidad de la construcción	Muy Buena		**Tipo de construcción**	Definitiva	
	Buena			Parcial	
	Regular			Provisional	
	Mala			Autoconstrucción	

Estructura general	
Cimentación	
Estructura	
Muros	
Techos	
Cobertura	
Inst. Eléctricas	
Inst. Gas	
Inst. Sanitarias	

5. ACABADOS

Puertas	Tipo			
	Material			
	Sistema			
Ventanas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Mamparas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Muebles de cocina	Tipo			
	Material			
	Tableros			
	Lavaderos			
Baños	Tipo			
	Color			
	Grifería			
Closets				
Pisos				
Revestimientos				
Cerradura				
Otros y Comentarios				

Valortec Tasaciones

BBVA

N° de Solicitud Banco	**1383350**
N° de Servicio Tasadora	**06-26-68-BBVA**
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de Caducidad	20-Jun-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

1. MÉTODO DE COSTOS O REPOSICIÓN (OFERTA DE MERCADO PARA TERRENOS)

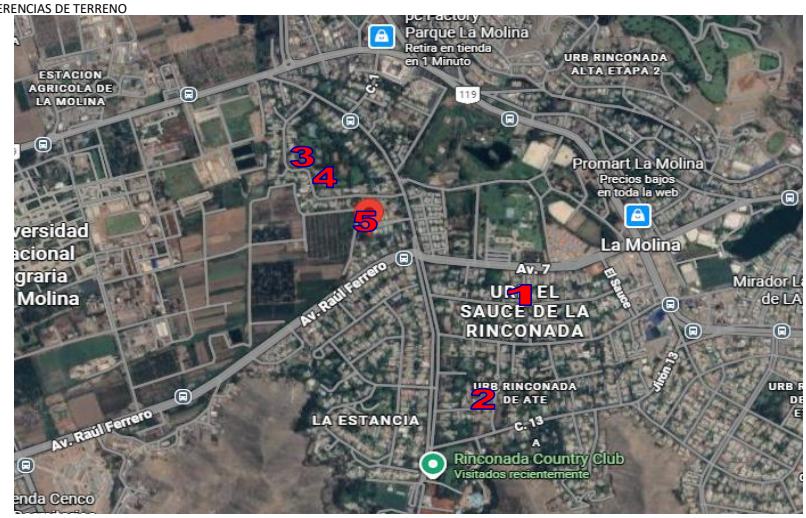
A. DATOS GENERALES DE REFERENCIAS DE MERCADO

	Ubicación / Descripción	Fuente / Página Web	Número de Frentes	Nombre Contacto / tel	Forma / Topografía	Vía	Zonificación	Distancia al bien (m)	Fecha
1	Venta de inmueble como terreno en Calle 9 con Albetos, La Molina. Frentes: 2 Coord. : -12.083925, -76.932135 **AT = 2,662.0 m2** **US$ 2,928,000.00**	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclttein-terreno-en-venta-en-la-molina-146769391.html	2	Hogar & Estilo Inmobiliaria	Regular / Plana	Calle / Jirón	RDMB	570	19-Jun-26
2	Venta de inmueble como terreno en Condominio en calle 12, La Molina. Frentes: 1 Coord. : -12.087673, -76.933453 **AT = 3,328.0 m2** **US$ 3,500,000.00**	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclttein-terreno-en-venta-en-la-molina-146769333.html	1	Hogar & Estilo Inmobiliaria	Regular / Plana	Calle / Jirón	RDMB	760	19-Jun-26
3	Venta de casa en condominio en Haras de La Molina, La mOlina. Coord. : -12.079582218340105, -76.938138 AT = 1,519.0 m2 AC = 700.0 m2 US$ 1,750,000.00	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclttein-venta-amplisima-casa-en-el-haras-de-la-molina-147137700.html	1	MONHOUSE BIENES RAICES	Regular / Plana	Calle / Jirón	RDMB	350	19-Jun-26
4	Venta de casa en condominio en Haras de La Molina, La mOlina. Coord. : -12.079582, -76.938138 **AT = 2,579.0 m2** **AC = 500.0 m2** **US$ 2,965,850.00**	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclttein-venta-casa-a-precio-de-terreno.-urb.-el-haras-de-la-146063031.html	1	MONHOUSE BIENES RAICES	Regular / Plana	Calle / Jirón	RDMB	400	19-Jun-26
5	Venta de terreno ubicado dentro del condominio en la Av. Manuel P. Ugarteche N° 270, La mOlina. Coord. : -12.081209, -76.936834 **AT = 621.0 m2** **US$ 500,000.00**	https://www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/veclttein-vendo-terreno-en-la-molina-prado-ugarteche-super-61843101.html	1	SIMON SAMAAN	Regular / Plana	Calle / Jirón	RDMB	60	19-Jun-26

B. HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS DE MERCADO DE TERRENOS

	Valor del Inmueble Referencial (US$)	Área (m2)	Valor Unitario Terreno ofertado	Factores de HOMOLOGACIÓN						Factor Resultante	Valor Unit. Terreno Homologado (US$/m2)
				Ub	Ent	Sup	Ser	Zon	F.N.		
1	2,928,000.00	2,662.00	1,099.92	1.00	1.05	1.04	1.00	1.00	0.90	0.98	1,077.93
2	3,500,000.00	3,328.00	1,051.68	1.00	1.00	1.05	1.00	1.00	0.90	0.94	988.58
3	1,575,000.00	1,519.00	1,036.87	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00	0.90	0.92	953.92
4	2,840,850.00	2,579.00	1,101.53	1.00	1.00	1.04	1.00	1.00	0.90	0.94	1,035.44
5	500,000.00	621.00	805.15	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	724.64
	Valor Unitario Terreno Homologado Promedio [$/m²]		956.10	VUT Prom. Homologado ajustado[$/m²]							960.00


C. PLANO DE UBICACIÓN Y REFERENCIAS DE TERRENO



RESUMEN VALORES UNITARIOS

	Referencias	Ofertado	Homologado
COMPARABLES	2,928,000.00	1,099.92	1,077.93
	3,500,000.00	1,051.68	988.58
	1,575,000.00	1,036.87	953.92
	2,840,850.00	1,101.53	1,035.44
	500,000.00	805.15	724.64
	Promedio	US$ 1,019.03	US$ 956.10
	Máximo	US$ 1,101.53	US$ 1,077.93
	Mínimo	US$ 805.15	US$ 724.64
	Difer. Max Min	US$ 296.38	US$ 353.29

COMPORTAMIENTO DE VALORES UNITARIOS



Valor Comercial Unitario por m² de Terreno

Valortec Tasaciones

BBVA

N° de Solicitud Banco	**1383350**
N° de Servicio Tasadora	**06-26-68-BBVA**
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de Caducidad	20-Jun-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

1. MÉTODO DIRECTO DE COSTOS O REPOSICIÓN

A. VALOR DE TERRENO (VT)

De acuerdo a la Investigación de Mercado de Terrenos con características similares al inmueble tasado se obtiene;

Valor del dominio exclusivo

Unidad Inmobiliaria	Área de terreno (m2)	% de Participación	V.U. de Terreno (US$/m2)	Valor de Terreno (US$)
Lote	703.93	5.38%	960.00	675,772.80
Subtotal Terreno (VT)	703.93			675,772.80
VALOR TOTAL DEL TERRENO				675,772.80

B. VALOR DE LAS EDIFICACIONES (VSNE Y VE)

De acuerdo a las características constructivas y a los acabados del inmueble observados en la inspección realizada se estima;

Región de la Edificación
Lima_Metropolitana_y_Callao

Código	Partida	VUE1		VUE2		VUE3		VUE4		VUE5		VUE6	
		Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2
1	Muros y Columnas												
2	Techos												
3	Pisos												
4	Puertas y Ventanas												
5	Revestimientos												
6	Baños												
7	Instalaciones Eléctricas y Sanitarias												

Costo Unitario de Edificación (S/)

Gastos Generales 4% (Obra Grande)

Utilidad 10% Tipo de Cambio S/. 3.412

Valor Unitario de Edificación (S/)

Valor Unitario de Edificación redondeado (US$)

Cálculo del Valor Similar a Nuevo o Valor de Reconstrucción de las Edificaciones (VSNE) y el Valor de las Edificaciones (VE)

Descripción	Área (m2)	VUE (US$/m2)	Valor Similar a Nuevo (US$)	Material Predominante	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	FA (**)	Valor de Edificación (US$)
Piso 1	218.00	1,312.99	286,232.55	Concreto	1	Muy Bueno	1.00	1.00	286,232.55
piso 2	177.55	1,312.99	233,121.97	Concreto	1	Muy Bueno	1.00	1.00	233,121.97
Subtotal Edificaciones (VSNE)	395.55	US$	519,354.52	Subtotal Edificaciones (VE)			US$		519,354.52

C. VALOR DE ÁREAS COMUNES (VAC)

Según el Reglamento General de Tasaciones del Perú, para el valor de las Áreas Comunes, se asigna un % del valor de la edificación;

Descripción	% de Áreas Comunes	Valor Unitario de Áreas Comunes (US$/m2)	Valor de Reconstrucción Áreas Comunes (US$)	FD (*)	Valor de Áreas Comunes (US$)
Subtotal Áreas Comunes (VAC)		US$		US$	

D. VALOR DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (VI + VOC)

Descripción	Cantidad	Unidad (u)	Valor Unitario (US$/u)	Valor de Reconstrucción (US$)	FD (*)	Valor de Inst. y Obras Complem. (US$)
Subtotal Instalaciones y Obras Complementarias (VI + VOC)			US$		US$	

(*) Factor de Depreciación

(**) Factor de Ajuste

E. VALOR TOTAL EDIFICACIONES (VETP1)	[Mediante el Método de Costos Directos = VE + VAC + VI + VOC]	US$	519,354.52
F. VALOR TOTAL DEL PREDIO (VTP1)	[Mediante el Método de Costos Directos = VT + VE + VAC + VI + VOC]	US$	1,195,127.32
G. VALOR DE RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE TASADO (VSN)	[= VSNE + VSNAC + VSNVI + VSNVOC]	US$	519,354.52

Valortec Tasaciones

BBVA

N° de Solicitud Banco	**1383350**
N° de Servicio Tasadora	**06-26-68-BBVA**
Fecha de Expedición	19-Jun-2026
Fecha de Caducidad	20-Jun-2027

RESULTADOS

1. RESUMEN GENERAL DE TASACIÓN

A. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DIRECTOS

	VTP (US$)	VU (US$/m2)	VTP (S/)
Método de Costos o Reposición	1,195,127.32	3,021.43	4,077,774.42
Método de Comparación o de Mercado	No considerado		

B. RESULTADO DEL MÉTODO INDIRECTO

Método de la Renta o Capitalización	No considerado		

2. VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE

A. VALOR COMERCIAL (VC)

Para determinar la conclusión del Valor Comercial del inmueble motivo de la presente tasación, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones

a La zona está consolidada y es de carácter residencial.

b El método que mejor refleja el Valor Comercial es por **Método Directo de Costos (O de Reposición)**

	Valor Comercial
Valor Comercial en Dólares (Moneda Extranjera)	
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE CON 32/100 DÓLARES AMERICANOS	US$ 1,195,127.32
Valor Comercial en Soles (Moneda Local)	
CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 42/100 SOLES	S/ 4,077,774.42

3. VALOR DE REALIZACIÓN

A. VALOR DE REALIZACIÓN INMEDIATA (VRI)

El Valor de Realización Inmediata, es el Valor Neto del inmueble que se esperaría recuperar como consecuencia de la eventual venta del bien en el menor tiempo posible y en las condiciones actuales del inmueble y el mercado. Se obtiene descontando los castigos y cargos por los conceptos indicados a continuación;

	Concepto de la Deducción	% de la Deducción	Importe (US$)
A	Gastos de Publicidad.	2.00%	23,902.55
B	Gastos de tasación del inmueble para la Realización.	0.20%	2,390.25
C	Comisiones de Ventas.	5.00%	59,756.37
D	Mantenimiento.	2.00%	23,902.55
E	Factor por la venta del inmueble (Realización) en un plazo de 60 días.	10.80%	129,073.75
F	Otras Deducciones (Sólo casos especiales)	0.00%	0.00
	Total Deducciones	**20.00%**	**US$ 239,025.47**

	Valor Realización Inmediata
En Dólares (Moneda Extranjera)	
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO UN CON 86/100 DÓLARES AMERICANOS	US$ 956,101.86
En Soles (Moneda Local)	
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 55/100 SOLES	S/ 3,262,219.55

4. RESPONSABLE

EMPRESA TASADORA	**VALORTEC S.A.C.**
REGISTRO REPEV	**Resolución SBS N° 1147-2012**
PERITO RESPONSABLE DE INSPECCIÓN OCULAR	**Rolando Paredes**

PERITO	
PROFESIÓN	ING. FRANK SALAZAR OCAMPO
REPEV	CIP: 279570

PERITO	ING. JOSE HUARACHI MARILUZ
PROFESIÓN	CIP: 220317
REPEV	VALORTEC SAC RESOLUCION S.B.S. N° 1147-2012

5. OBSERVACIONES DEL PERITO

Se corrobora la ubicación del inmueble mediante las numeraciones halladas in situ y del colindante.

Atendió durante la inspección ocular el Arq. Renzo Gonzales

Según información del banco el inicio de la obra fue el 15 de enero de 2026 y finalizaría el 15 de setiembre de 2026, cabe precisar que esto no guarda relación con el cronograma enviado.

Hipoteca: Inscrita en el asiento D0002 de la p.E. N° 14046330 a favor del BANCO BBVA PERU hasta por la suma de US$ 462,315.00 dólares americanos. Así consta en la escritura pública del 29 de enero de 2025.

Según lo solicitado por el banco se trata de un informe de valorización parcial para el financiamiento de la futura edificación para el cliente Nicola Dávila Zlosilo Toso. Para el desarrollo del presente informe se consideran los documentos adjuntos en los anexos, correspondientes, al presupuesto, cronograma de obra, licencia de edificación, presupuesto disgregado de gastos generales, solicitud construyo (formato de solicitud del banco), planos de arquitectura y memoria descriptiva, Partida registral del inmueble, Hoja Resumen y Predio Urbano del Autoavalúo.

Se cuenta con autorización del área de operaciones para realizar este informe de valorización parcial el cual esta alineada a la licencia de edificación y el monto que se indica en el presupuesto, el cual asciende a S/. 1,772,037.61 Soles donde el responsable profesional de dicha propuesta es el Ingeniero Pedro Luis Yarleque CIP 292673.

Se observa que el presupuesto presentado genera un valor unitario aproximado de US$ 1,312.99 de área construida, calculado sobre un área construida/techada de 395.55 m² correspondiente a la vivienda principal, el cual supera los rangos referenciales usualmente considerados para edificaciones de vivienda unifamiliar de características similares, por lo que se recomienda que el profesional responsable sustente técnicamente los costos, acabados y partidas consideradas, a fin de que se evalúe la razonabilidad económica del presupuesto presentado.

A la fecha de inspección realizada el 12/06/2026, se verificó que la estructura de concreto armado y los muros de albañilería, completamento tarrajeados,de la edificación de dos niveles se encuentran ejecutados. Asimismo, se observó avance parcial en las instalaciones eléctricas y sanitarias. La piscina se encuentra pendiente y no se evidenció la escalera de concreto contemplada en el cronograma de obra.

6. ADVERTENCIAS DEL PERITO

Ninguna.

7. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS DEL INFORME

1. La finalidad de la Tasación es únicamente la garantía hipotecaria de prestamos que forman parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades a que se refiere. En nigún caso, servirá para determinar una asesoría legal, técnicas, ni de otro caracter.
2. La información utilizada ha sido proporcionada por el banco, no habiéndose revisado documentos distintos sin el consentimiento del banco. No se asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de la información ni sobre conclusiones erradas que eventualmente podrían haberse derivado de su contenido.
3. La interpretación de los documentos y sus condiciones, especificamente aplicada a la pericia, se asume como razonablemente válida a los efectos del presente trabajo, pero no sustituye una asesoría jurídica sobre los términos que se refieren a las materias de su contenido.
4. Se considera que la información y documentación técnica proporcionada proviene de fuentes realistas y confiables, por lo que no se asume responsabilidad por eventuales errores inducidos por el contenido de éstas.
5. Las áreas de terreno, áreas construidas, áreas libres y áreas ocupadas fueron obtenidas de la documentación registral, documetación predial, planos, etc.; adjuntadas por el banco, no habiendo realizado el perito levantamiento de áreas ni medidas perimétricas.
6. Las conclusiones de este informe son válidas a la fecha de emisión de la misma y durante el periodo de vigencia establecido, siempre que no varíen significativamente las condiciones de los bienes, en cuyo caso deberá requerirse una actualización de la misma.
7. La existencia de documentos adicionales no proporcionados, que puedan contener información diferente de la acreditada, puede invalidar las conclusiones del presente trabajo sin responsabilidad alguna de parte de los peritos.
8. El presente informe se emite considerando que no existen condiciones o intereses ocultos y que se cumple con todos los requisitos legales relativos a la propiedad, tenencia y transferencia de los derechos.
9. El valor comercial a la fecha del presente inmueble se argumenta en base a la inspección ocular realizada por el perito y los documentos facilitados por el banco.
10. Queda prohibida la reproducción total o parcial del informe de valuación o cualquier referencia a los mismos documentos, informes o publicaciones de cualquier tipo, sin la autorización escrita de Valortec S.A.C. y fuera de la forma y contexto en el que se encuentran. La utilización de la valorización para otros fines distintos de los establecidos al realizar el encargo, eximirá a Valortec S.A.C. de cualquier responsabilidad.



ENTORNO



ENTORNO



FACHADA DEL INMUEBLEM ATRIZ



PLACA DEL INMUEBLE MATRIZ



ENTORNO INTERNO



ENTORNO INTERNO



FACHADA DE PROYECTO



FACHADA COLINDANTE IZQUIERDO



NUMERACIÓN COLINDANTE IZQUIERDO



FACHADA INTERIOR



INTERIOR




INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 1/10/2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL (S/.)	PRIMER CONSTRUYO		SEGUNDO CONSTRUYO	
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES VIVIENDA 2 NIVELES Y EXTERIORES					50,837.60				
01.01.00	OBRAS PROVISIONALES					30,057.60	8/04/2026		12/06/2026	
01.01.01	CERCO PERIMÉTRICO DE OBRA Y PROTECCION VECINOS	ML	38.00	S/ 55.20	S/ 2,097.60		75%	S/ 1,573.20	20%	S/ 419.52
01.01.02	ALMACENES, VESTUARIOS Y COMEDORES	GLB	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00		80%	S/ 1,000.00	15%	S/ 187.50
01.01.03	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00		80%	S/ 1,000.00	15%	S/ 187.50
01.01.04	MOVILIZACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ETAPA DE MUROS DE CONTENCION	GLB	1.00	S/ 2,150.00	S/ 2,150.00		80%	S/ 1,720.00	15%	S/ 322.50
01.01.05	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA PROCESO DE CASCO	GLB	1.00	S/ 8,750.00	S/ 8,750.00		90%	S/ 7,875.00	10%	S/ 875.00
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00		100%	S/ 380.00		S/ 0.00
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00		100%	S/ 380.00		S/ 0.00
01.01.08	ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN	MES	5.00	S/ 280.00	S/ 1,400.00		85%	S/ 1,190.00	5%	S/ 70.00
01.01.09	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	MES	5.00	S/ 220.00	S/ 1,100.00		85%	S/ 935.00	5%	S/ 55.00
01.01.10	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES DE STAFF Y OBREROS	MES	5.00	S/ 520.00	S/ 2,600.00		85%	S/ 2,210.00	5%	S/ 130.00
01.01.11	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	GLB	1.00	S/ 3,900.00	S/ 3,900.00		70%	S/ 2,730.00	10%	S/ 390.00
01.01.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (SOLO CASCO). CONSIDERA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	GLB	1.00	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00		70%	S/ 3,360.00	15%	S/ 720.00
01.02.00	TRANSPORTE DE MATERIALES					15,400.00				
01.02.01	TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL	GLB	1.00	S/ 15,400.00	S/ 15,400.00		70%	S/ 10,780.00	15%	S/ 2,310.00
01.03.00	SEGURIDAD Y SALUD					5,380.00				
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00	S/ 5,380.00	S/ 5,380.00		80%	S/ 4,304.00	10%	S/ 538.00
02.00.00	ESTRUCTURAS					360,376.65				
02.01.00	ESTRUCTURA CASCO					S/ 230,975.35				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					S/ 1,715.52				
02.01.01.01	CORTE DE TERRENO, AREA DE PISCINA	M3	68.08	S/ 25.20	S/ 1,715.52		100%	S/ 1,715.52		S/ 0.00
02.01.02	EXCAVACIONES MANUAL					S/ 1,218.32				
02.01.02.01	EXCAVACION DE ZAPATAS AISLADAS	M3	34.81	S/ 35.00	S/ 1,218.32		100%	S/ 1,218.32		S/ 0.00
02.01.03	RELLENOS					S/ 4,302.31				
02.01.03.01	RELLENOS CON MATERIAL PROPIO	M3	8.70	S/ 38.00	S/ 330.69		70%	S/ 231.48	25%	S/ 82.67
02.01.03.02	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.15 m	M2	378.25	S/ 10.50	S/ 3,971.63		30%	S/ 1,191.49	50%	S/ 1,985.81
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO					S/ 2,836.88				
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	378.25	S/ 7.50	S/ 2,836.88		100%	S/ 2,836.88		S/ 0.00
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					S/ 6,200.00				
02.01.05.01	ELIMINACION DE DESMONTE DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	S/ 6,200.00	S/ 6,200.00		50%	S/ 3,100.00	15%	S/ 930.00
02.01.05.02	CONCRETO SIMPLE Y ANCLAJES						0%			
02.01.06	CONCRETO SIMPLE					S/ 12,484.00				
02.01.06.01	SOLADO e=3" CIMENTACION Y MURO	M2	125.00	S/ 26.00	S/ 3,250.00		100%	S/ 3,250.00		S/ 0.00
02.01.06.02	CONCRETO CICLOPEO	M3	32.40	S/ 285.00	S/ 9,234.00		100%	S/ 9,234.00		S/ 0.00
02.01.07	CONCRETO ARMADO									
02.01.07.01	ZAPATAS					S/ 17,729.69				
02.01.07.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO ELEMENTOS HORIZONTALES F'C=210	M3	35.41	S/ 357.50	S/ 12,659.08		100%	S/ 12,659.08		S/ 0.00
02.01.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ZAPATA	M2	35.17	S/ 55.00	S/ 1,934.16		100%	S/ 1,934.16		S/ 0.00
02.01.07.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	518.42	S/ 6.05	S/ 3,136.45		100%	S/ 3,136.45		S/ 0.00
02.01.07.02	VIGA DE CIMENTACION					S/ 16,953.71				
02.01.07.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO ELEMENTOS HORIZONTALES F'C=210	M3	18.50	S/ 357.50	S/ 6,613.75		100%	S/ 6,613.75		S/ 0.00
02.01.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE VIGA DE CIMENTACION	M2	125.00	S/ 55.00	S/ 6,875.00		100%	S/ 6,875.00		S/ 0.00
02.01.07.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	500.56	S/ 6.05	S/ 3,028.37		100%	S/ 3,028.37		S/ 0.00
02.01.07.02.04	CURADO	M2	363.83	S/ 1.20	S/ 436.59		100%	S/ 436.59		S/ 0.00
02.01.07.03	LOSA DE PISO e=15 cm, SIMPLE					S/ 21,074.24				
02.01.07.03.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	53.11	S/ 357.50	S/ 18,985.40		60%	S/ 11,391.24	40%	S/ 7,594.16
02.01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSA DE PISOS	M2	25.60	S/ 65.00	S/ 1,664.00		60%	S/ 998.40	40%	S/ 665.60
02.01.07.03.03	CURADO	M2	354.04	S/ 1.20	S/ 424.85		60%	S/ 254.91	40%	S/ 169.94
02.01.07.04	COLUMNAS					S/ 41,921.00				
02.01.07.04.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	25.20	S/ 357.50	S/ 9,009.00		100%	S/ 9,009.00		S/ 0.00
02.01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE COLUMNAS	M2	245.20	S/ 55.00	S/ 13,486.00		100%	S/ 13,486.00		S/ 0.00
02.01.07.04.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	3,150.00	S/ 6.05	S/ 19,057.50		100%	S/ 19,057.50		S/ 0.00
02.01.07.04.04	CURADO	M2	307.08	S/ 1.20	S/ 368.50		100%	S/ 368.50		S/ 0.00
02.01.07.05	COLUMNETAS					S/ 7,219.15				
02.01.07.05.01	CONCRETO MANUAL F'C=210	M3	5.20	S/ 357.50	S/ 1,859.00		100%	S/ 1,859.00		S/ 0.00
02.01.07.05.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE COLUMNETAS	M2	57.94	S/ 75.00	S/ 4,345.31		100%	S/ 4,345.31		S/ 0.00
02.01.07.05.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	156.25	S/ 6.05	S/ 945.31		100%	S/ 945.31		S/ 0.00
02.01.07.05.04	CURADO	M2	57.94	S/ 1.20	S/ 69.53		100%	S/ 69.53		S/ 0.00
02.01.07.06	VIGAS Y CORTES					S/ 35,730.66				
02.01.07.06.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	24.50	S/ 357.50	S/ 8,758.75		100%	S/ 8,758.75		S/ 0.00
02.01.07.06.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE VIGAS	M2	142.10	S/ 65.00	S/ 9,236.72		100%	S/ 9,236.72		S/ 0.00
02.01.07.06.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	2,903.25	S/ 6.05	S/ 17,564.66		100%	S/ 17,564.66		S/ 0.00
02.01.07.06.04	CURADO	M2	142.10	S/ 1.20	S/ 170.52		100%	S/ 170.52		S/ 0.00
02.01.07.07	LOSA ALIGERADA					S/ 57,426.63				
02.01.07.07.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	55.41	S/ 357.50	S/ 19,809.08		80%	S/ 15,847.26	20%	S/ 3,961.82
02.01.07.07.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSAS ALIGERADAS	M2	429.83	S/ 42.50	S/ 18,267.75		50%	S/ 9,133.87	50%	S/ 9,133.87
02.01.07.07.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	KG	1,457.12	S/ 6.05	S/ 8,815.58		100%	S/ 8,815.58		S/ 0.00
02.01.07.07.04	CURADO DE LOSA POSTERIOR A VACEADO	M2	429.83	S/ 1.20	S/ 515.80		50%	S/ 257.90	50%	S/ 257.90
02.01.07.07.05	LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15 cm x 30 cm x 30 cm	UND	3,915.75	S/ 2.56	S/ 10,018.44		100%	S/ 10,018.44		S/ 0.00
02.01.07.08	ESCALERAS					S/ 4,163.25				
02.01.07.08.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	3.50	S/ 357.50	S/ 1,251.25		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.01.07.08.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ESCALERAS	M2	19.99	S/ 78.00	S/ 1,559.23		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.01.07.08.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	219.44	S/ 6.05	S/ 1,327.59		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.01.07.08.04	CURADO	M2	20.99	S/ 1.20	S/ 25.19		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.02.00	ESTRUCTURA PISCINA					S/ 40,707.86				
02.02.01	LOSA DE PISO e=15 cm, CONCRETO ARMADO					S/ 5,712.02				
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	5.97	S/ 357.50	S/ 2,135.88		100%	S/ 2,135.88		S/ 0.00
02.02.01.02	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	586.30	S/ 6.05	S/ 3,547.10		100%	S/ 3,547.10		S/ 0.00
02.02.01.03	CURADO	M2	24.20	S/ 1.20	S/ 29.04		100%	S/ 29.04		S/ 0.00
02.02.02	CONCRETO ARMADO PISCINA MUROS					S/ 34,995.84				
02.02.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 CON IMPERMEABILIZANTE	M3	35.00	S/ 418.00	S/ 14,630.00		100%	S/ 14,630.00		S/ 0.00
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE MUROS DE CONTENCION	M2	199.66	S/ 65.20	S/ 13,017.67		100%	S/ 13,017.67		S/ 0.00
02.02.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	1,010.82	S/ 6.05	S/ 6,115.48		100%	S/ 6,115.48		S/ 0.00
02.02.02.04	RELLENO DE TERRENO	M3	25.00	S/ 28.50	S/ 712.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 712.50
02.02.02.05	COMPACTADO DE TERRENO	M2	20.48	S/ 25.40	S/ 520.19		0%	S/ 0.00	100%	S/ 520.19
02.03.00	ESTRUCTURA CISTERNA					S/ 23,326.00				
02.03.01	EXCAVACION MANUAL DE CISTERNA	M3	54.00	S/ 35.00	S/ 1,890.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,890.00

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 1/10/2025

02.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 CON IMPERMEABILIZANTE	M3	24.20	S/ 418.00	S/ 10,115.60		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENC. DE MUROS	M2	67.00	S/ 65.20	S/ 4,368.40		0%	S/ 0.00	100%	S/ 4,368.40
02.03.04	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	650.00	S/ 6.05	S/ 3,932.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 3,932.50
02.03.05	RELLENO DE TERRENO	M3	25.00	S/ 28.50	S/ 712.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.03.06	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	26.00	S/ 7.50	S/ 195.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.03.07	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADO	M2	60.00	S/ 35.20	S/ 2,112.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
02.04.00	**ESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO**					**S/ 59,263.27**				
02.04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					**S/ 6,453.82**				
02.04.01.01	EXCAVACION Y DESQUINCHADO DE TERRENO DE MANERA MANUAL	M3	52.30	S/ 35.00	S/ 1,830.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,830.50
02.04.01.02	ACARREO HORIZONTAL INTERNO HACIA PUNTO DE ACOPIO	M3	67.99	S/ 30.00	S/ 2,039.70		0%	S/ 0.00	100%	S/ 2,039.70
02.04.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	67.99	S/ 38.00	S/ 2,583.62		0%	S/ 0.00	100%	S/ 2,583.62
02.04.02	**ZAPATAS Y SOBRECIMIENTO 183 ML**					**S/ 52,809.45**				
02.04.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATA Y SOBRECIMIENTO F'C=210	M3	68.70	S/ 357.50	S/ 24,560.25		0%	S/ 0.00	100%	S/ 24,560.25
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ZAPATA Y SOBRECIMIENTO	M2	125.00	S/ 65.20	S/ 8,150.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 8,150.00
02.04.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	3,105.24	S/ 6.05	S/ 18,786.70		0%	S/ 0.00	100%	S/ 18,786.70
02.04.02.04	TECNOOPOR LADO DE JUNTA	M2	125.00	S/ 10.50	S/ 1,312.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,312.50
02.05.00	**ESTRUCTURA PARA CAMARA DE DESAGUE**					**S/ 6,104.17**				
02.05.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					**S/ 1,485.30**				
02.05.01.01	EXCAVACION DE TERRENO	M3	12.00	S/ 35.00	S/ 420.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 420.00
02.05.01.02	ACARREO HORIZONTAL INTERNO HACIA PUNTO DE ACOPIO	M3	12.00	S/ 30.00	S/ 360.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 360.00
02.05.01.03	PERFILAMIENTO CONTRA TERRENO AREA DE ENCOFRADO	M2	9.00	S/ 12.50	S/ 112.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 112.50
02.05.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	15.60	S/ 38.00	S/ 592.80		0%	S/ 0.00	100%	S/ 592.80
02.05.02	**LOSA DE CIMENTACION**					**S/ 249.58**				
02.05.02.01	CONCRETO PARA LOSA E=20 CM f'c=210 kg/cm2	M3	0.32	S/ 367.00	S/ 116.27		0%	S/ 0.00	100%	S/ 116.27
02.05.02.02	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	4.00	S/ 1.20	S/ 4.80		0%	S/ 0.00	100%	S/ 4.80
02.05.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	21.07	S/ 6.10	S/ 128.51		0%	S/ 0.00	100%	S/ 128.51
02.05.03	**MUROS DE CONTENCION**					**S/ 3,120.26**				
02.05.03.01	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES f'c=210 kg/cm2	M3	1.80	S/ 367.00	S/ 660.60		0%	S/ 0.00	100%	S/ 660.60
02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALTURA NORMAL EN PLACAS	M2	24.00	S/ 65.20	S/ 1,564.80		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,564.80
02.05.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	118.44	S/ 6.10	S/ 722.48		0%	S/ 0.00	100%	S/ 722.48
02.05.03.04	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	143.65	S/ 1.20	S/ 172.38		0%	S/ 0.00	100%	S/ 172.38
02.05.04	**LOSAS MACIZAS e=20 cm**					**S/ 1,249.03**				
02.05.04.01	CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c= 210 kg/cm2	M3	0.32	S/ 367.00	S/ 116.27		0%	S/ 0.00	100%	S/ 116.27
02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALTURA NORMAL EN LOSAS MACIZAS	M2	2.50	S/ 65.20	S/ 163.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 163.00
02.05.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	21.07	S/ 6.10	S/ 128.51		0%	S/ 0.00	100%	S/ 128.51
02.05.04.04	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	2.50	S/ 1.20	S/ 3.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 3.00
02.05.04.05	RELLENO DE TERRENO	M3	4.50	S/ 28.50	S/ 128.25		0%	S/ 0.00	100%	S/ 128.25
02.05.04.06	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	8.00	S/ 7.50	S/ 60.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 60.00
02.05.04.07	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADO	GLB	1.00	S/ 650.00	S/ 650.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 650.00
03.00.00	**ARQUITECTURA**					**243,968.61**				
03.01.00	**ARQUITECTURA CASA E INTERIORES**					**S/ 243,968.61**				
03.01.01	**ELIMINACION DE MATERIAL**					**S/ 3,500.00**				
03.01.01.01	ELIMINACION DE DESMONTE DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00		30%	S/ 1,050.00		S/ 0.00
03.01.02	**TABIQUE LADRILLO KING KONG**					**S/ 72,303.47**				
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KING KONG 12 CM TIPO SOGA	M2	564.48	S/ 95.20	S/ 53,738.50		100%	S/ 53,738.50		S/ 0.00
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO P/TARRAJEAR - E: 0.25 TIPO CABEZA	M2	148.05	S/ 125.40	S/ 18,564.98		100%	S/ 18,564.98		S/ 0.00
03.01.03	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**					**S/ 86,072.78**				
03.01.03.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.	M2	1,425.05	S/ 34.50	S/ 49,164.36		15%	S/ 7,374.65	85%	S/ 41,789.71
03.01.03.02	TARRAJEO EN CIELORASOS CON MEZCLA +REND	M2	417.57	S/ 35.20	S/ 14,698.46		0%	S/ 0.00	100%	S/ 14,698.46
03.01.03.03	TARRAJEO DE LADO ESCALERAS	M2	2.50	S/ 52.00	S/ 130.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 130.00
03.01.03.04	FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS	ML	34.00	S/ 37.00	S/ 1,258.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,258.00
03.01.03.05	BRUÑA ENTRE TECHO Y MURO	ML	415.25	S/ 3.80	S/ 1,577.95		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,577.95
03.01.03.06	TARRAJEO DE FONDOS DE ESCALERAS	M2	4.15	S/ 35.80	S/ 148.57		0%	S/ 0.00	100%	S/ 148.57
03.01.03.07	VESTIDURA DE DERRAMES MUROS. PUERTAS Y VENTANAS	ML	189.68	S/ 15.50	S/ 2,940.04		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.03.08	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE-JARDINERAS	M2	58.00	S/ 32.50	S/ 1,885.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,885.00
03.01.03.09	TARRAJEO DE VIGAS	M2	149.21	S/ 35.20	S/ 5,252.14		10%	S/ 525.21		S/ 0.00
03.01.03.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES EN SOBRECIMIENTO	M2	125.00	S/ 38.50	S/ 4,812.50		0%	S/ 0.00	100%	S/ 4,812.50
03.01.03.11	DERRAMES PARTE SUPERIOR MURO	ML	122.00	S/ 14.50	S/ 1,769.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 1,769.00
03.01.03.12	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR VERDE	M2	108.30	S/ 22.50	S/ 2,436.75		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.04	**ALBAÑILERIA**					**S/ 652.50**				
03.01.04.01	FORJADO DE MEDIDORES DE LUZ (CORTE Y CONSTRUCCION DE NICHO)	UND	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.04.02	FORJADO DE MEDIDORES DE AGUA	UND	1.00	S/ 65.00	S/ 65.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ALUMINIO EN CANTO DE ESCALERA	ML	17.00	S/ 12.50	S/ 212.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.04.04	FORJADO DE TABLERO ELECTRICOS	UND	1.00	S/ 125.00	S/ 125.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.05	**PISO DE CEMENTO**					**S/ 24,845.81**				
03.01.05.01	CONTRAPISO DE 48 MM.	M2	584.96	S/ 32.50	S/ 19,011.20		0%	S/ 0.00	100%	S/ 19,011.20
03.01.05.02	NIVELACION Y EMPAREJAMIENTO DE PISO PARA RECIBIR ACABADO PISO ESTRUCTURAL DE MADERA	M2	204.00	S/ 13.80	S/ 2,815.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.05.03	SARDINELES CONCRETO F'C=140	M3	3.80	S/ 420.00	S/ 1,595.16		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.05.04	SARDINELES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	37.98	S/ 37.50	S/ 1,424.25		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.06	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**					**S/ 70.80**				
03.01.06.01	NICHOS PARA VALVULAS	UND	1.00	S/ 35.60	S/ 35.60		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.06.02	RESANE DE CAJAS DE PASE	UND	1.00	S/ 35.20	S/ 35.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.07	**COBERTURAS**					**S/ 16,240.00**				
03.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO,1RA CAPA EN LOSA DE 2D NIVEL.(NO INCLUYE IMPERME	M2	224.00	S/ 72.50	S/ 16,240.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.08	**ESTRUCTURA METALICAS**					**S/ 40,283.25**				S/ 0.00
03.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2" x 2" CALIBRE N10, SE CONSIDERA ANGULO DE 1" X COLUMNA DE 2" X 2" X 2.5 MM, SE CONSIDERA QUE LA ALTURA DEL CERCO SE MANTENDRA EN 3 MT DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL SOBRECIMIENTO.	M2	233.00	S/ 98.50	S/ 22,950.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
03.01.08.02	SUMINSITRO E INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2" x 2" CALIBRE N10, SE CONSIDERA ANGULO DE 1" X COLUMNA DE 4" X 8" X 4.0 MM, SE CONSIDERA QUE LA ALTURA DEL CERCO SE MANTENDRA EN 4.5 MT DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL SOBRECIMIENTO.	M2	169.10	S/ 102.50	S/ 17,332.75		0%	S/ 0.00		S/ 0.00

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 1/10/2025

04.00.00	ACABADOS					S/ 589,039.23				
04.01.00	ENCHAPE DE CERAMICO EN PISOS Y MUROS					S/ 175,349.78				
04.01.01	ENCHAPE DE CERAMICO EN PISOS	M2	335.60	S/ 125.20	S/ 42,017.12		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.01.02	ENCHAPE DE CERAMICO EN MUROS	M2	414.20	S/ 125.00	S/ 51,775.00		0%	S/ 0.00	5%	S/ 2,588.75
04.01.03	SUMINSITRO E INSTALACION DE PISO DE MADERA ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA DESPERDICIO 10%	M2	224.40	S/ 339.57	S/ 76,199.51		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.01.04	SUMINSITRO E INSTALACION DE ZOCALO SOBRE AREA DE PISO DE MADERA ESTRUCTURAL.	ML	145.80	S/ 36.75	S/ 5,358.15		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.02.00	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS , GRIFERIAS Y TAPAS DE VALVULAS					S/ 4,333.00				
04.02.01	TAPA PARA VALVULAS - PVC	UND.	12.00	S/ 35.00	S/ 420.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.02.02	VARIOS PARA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (accesorios)	GLB	16.00	S/ 70.00	S/ 1,120.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.02.03	VARIOS PARA INSTALACION DE GRIFERIA (accesorios)	UND	15.00	S/ 41.20	S/ 618.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.02.04	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, SOLO MANO DE OBRA	UND	16.00	S/ 75.00	S/ 1,200.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.02.05	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, SOLO MANO DE OBRA	UND	15.00	S/ 65.00	S/ 975.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.00	PINTURA Y REVESTIMIENTO					S/ 95,132.15				
04.03.00	PINTURA 2 MANOS DE MUROS INTERIORES LATEX, PINTURA DURALATEX.	M2	492.03	S/ 30.50	S/ 15,006.85		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.01	PINTURA 2 MANOS EN CIELO RASO,PINTURA DURALATEX.	M2	339.08	S/ 30.50	S/ 10,341.79		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.02	PINTURA TEXTURADO FINO EN CIELO RASO INGRESO	M2	94.08	S/ 75.00	S/ 7,056.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.03	MURO ACABADO PINTURA LATEX MATE COLOR GRIS OSCURO. RAL POR DEFINIR. VER MUESTRA EN OBRA	M2	15.00	S/ 35.00	S/ 525.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.04	REVESTIMIENTO TEXTUPRO TIPO MADERA	M2	131.09	S/ 85.20	S/ 11,169.17		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.03.05	REVESTIMIENTO CON LADRILLO ROCOCHO DESTONALIZADO	M2	291.29	S/ 175.20	S/ 51,033.34		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.04.00	COBERTURA EXTERIOR (CARPORT Y PERGOLA)					S/ 48,580.71				
04.04.01	ESTRUCTURAS METALICAS EN COLUMNA Y PERGOLA	KG	2,352.14	S/ 16.20	S/ 38,104.68		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.04.02	REVESTIMIENTO DE MADERA EN PERGOLA	M2	26.87	S/ 357.50	S/ 9,606.03		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.04.03	VIGA DE DE DRYWALL ZONA DE NICHO PARILLA	GLB	1.00	S/ 870.00	S/ 870.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.00	CARPINTERIA DE MELAMINA Y MADERA					S/ 39,302.25				
04.05.01	MUEBLES DE COCINA EN MELAMINE BLANCO						0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.01.01	MUEBLE DE COCINA - BAJO	ML	7.75	S/ 950.00	S/ 7,362.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.01.02	MUEBLE DE MESA DE COMEDOR - BAJO	ML	2.35	S/ 1,180.00	S/ 2,773.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.01.03	MUEBLE DE COCINA - ALTO	ML	6.75	S/ 1,050.00	S/ 7,087.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.02	CLOSETS - DISEÑO MODULAR SIN FONDO						0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.02.01	CLOSET DE PARED - DORMITORIO (incluye D.Serv.)	ML	20.05	S/ 880.00	S/ 17,644.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.02.02	REVESTIMIENTO DE DRYWALL PARA CABECERA DE CLOSET, CONSIDERA ACABADO.	ML	20.05	S/ 165.00	S/ 3,308.25		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.05.02.03	TIRADORES EN CLOSET	UND	46.00	S/ 24.50	S/ 1,127.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.06.00	MUEBLES DE BAÑO					S/ 3,630.00				
04.03.01	MUEBLE BAJO EN BAÑOS PRINCIPAL Y FAMILIAR	ML	6.60	S/ 550.00	S/ 3,630.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.07.00	PUERTAS					S/ 20,250.00				
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION (0.75, 0.80, 0.90) X2.10. PUERTA DE MDF Y MARCO EN MADERA DE 4" X 1.5 " ACABADOS EN ENCHAPE DE MADERA	UND	15.00	S/ 1,350.00	S/ 20,250.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.00	PANELES Y CERRAMIENTO					S/ 49,696.13				S/ 0.00
04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MOVIBLE 2DO NIVEL	UND	3.00	S/ 4,550.00	S/ 13,650.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.02	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLO BAMBU 2DO NIVEL ZONA DE TERRAZA.	M2	23.70	S/ 325.00	S/ 7,702.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.03	CERRAMIENTO EN ZONA DE BAÑO SEGUNDO NIVEL CON MURO CIEGO (LISTONES DE MADERA CON ESTRUCTURA DE FIERRO)	UND	10.00	S/ 125.00	S/ 1,250.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.04	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLOR BAMBU 1ER NIVEL ZONA DE INGRESO.	M2	25.95	S/ 325.00	S/ 8,433.75		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.05	COLOCACION DE CERRAMIENTO CON COLUMNAS DE MADERA EN ZONA DE FACHADA 1ER NIVEL.	UND	52.00	S/ 145.00	S/ 7,540.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.08.06	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLOR BAMBU 1ER NIVEL ZONA DE HALL EXTERIOR BAÑO DE VIISITA.	M2	34.22	S/ 325.00	S/ 11,119.88		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.00	TABLEROS					S/ 27,648.00				
04.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN COCINA	ML	8.75	S/ 580.00	S/ 5,075.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN BAÑOS	ML	7.60	S/ 580.00	S/ 4,408.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN MESA DE COMEDOR DE DIARIO	ML	1.20	S/ 700.00	S/ 840.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MELAMINE COLOR MADERA SEGÚN MUESTRA COMEDOR DE DIARIO.	ML	1.25	S/ 780.00	S/ 975.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.05	REVESTIMIENTO CON PIEDRA SINTERIZADA SOBRE MUEBLE ZONA DE PARILLA	ML	5.80	S/ 1,250.00	S/ 7,250.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA BORDE PISCINA	ML	28.00	S/ 325.00	S/ 9,100.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.00	VIDRIOS					S/ 93,366.19				
04.10.01	VIDRIOS - CARPINTERIA DE ALUMINIO NEGRO					S/ 69,347.51				
04.10.01.01	VIDRIO EN SISTEMA DE ALUMINIO NEGRO - MAMPARAS Y PUERTAS	M2	61.88	S/ 550.00	S/ 34,034.96		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.01.02	VIDRIO EN SISTEMA DE ALUMINIO NEGRO - VENTANAS	M2	67.91	S/ 520.00	S/ 35,312.55		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.02	BARANDA					S/ 24,018.68				
04.10.02.01	VIDRIO EMBUTIDO BARANDA DE 10 MM (BARANDAS EN TERRAZAS EMBUTIDAS)	M2	18.26	S/ 520.00	S/ 9,497.28		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.02.02	VIDRIO EMBUTIDO BARANDA DE 10 MM (BARANDAS EN JARDIN EMBUTIDAS)	M2	3.82	S/ 520.00	S/ 1,986.40		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.02.03	BARANDA DE FIERRO NEGRO EN ESCALERA DE ACCESO DE 1ER NIVEL A 2DO NIVEL	ML	9.80	S/ 450.00	S/ 4,410.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.10.02.04	BARANDA CON ESTRUCTURA DE FIERRO Y PAÑOS METALICOS SEGÚN DETALLE DE ARQUITECTURA	ML	6.50	S/ 1,250.00	S/ 8,125.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.11.00	APARATOS SANITARIOS					S/ 6,129.10				
04.11.01	INODOROS EN LOSA (se cotiza los insumos para instal y m.o)					S/ 3,118.90				
05.01.01	INODORO ONE PIECE SETELLA BLANCO DE VAINSA3.6 LITROS	UND	5.00	S/ 583.12	S/ 2,915.59		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.02	INODORO ARUBA DE ITALGRIF, INCLUYE PEDESTAL	UND	1.00	S/ 203.31	S/ 203.31		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.11.02	LAVATORIO DE BAÑOS					S/ 1,920.20				
04.11.02.01	LAVATORIO INCEPA/CELITE 505x370mm- BAJO ENCIMERA	PZ	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.11.02.02	LAVATORIO ARUBA CON PEDESTAL VALLARTA DE ITALGRIF	PZ	1.00	S/ 110.00	S/ 110.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.11.02.03	LAVATORIO BOWL CR 35-350MM	PZ	1.00	S/ 310.20	S/ 310.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.11.03	LAVADERO DE COCINA Y LAVANDERIA (se considera insumos sikaflex y m.o)					S/ 1,090.00				
04.11.03.01	LAVADERO CUBETA LAVÍNIA 40 BL-TRAMONTINA SATINADO 0.43x0.37x0.17m	PZA	2.00	S/ 545.00	S/ 1,090.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.00	GRIFERIAS EN GENERAL						0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.01	GRIFERIA (se cotiza los insumos para instal, m.o y resanes)					S/ 4,321.91				
04.12.01.01	GRIFERIA MONOCOMANDO ALTA MODELO KORBY, MARCA DELTA.	UND	6.00	S/ 340.20	S/ 2,041.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.01.02	GRIFERIA ITALGRIF Grifo Monocomando Tahiti	UND	1.00	S/ 20.20	S/ 20.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.01.03	MONOMANDO MEZCLADOR DE DUCHA MARCA DELTA MODELO KORBY CON BRAZO DE DUCHA DE 39CM MARCA DELTA Y CABEZA DE DUCHA CUADRADA DE 20CM MARCA DELTA	UND	5.00	S/ 180.40	S/ 902.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.01.04	GRIFERIA ITALGRIF. DUCHA MONOCOMANDO TAHITI SALIDA TECNO	UND	1.00	S/ 450.20	S/ 450.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.12.01.05	MONOCOMANDO DE COCINA CON CABEZAL EXTRAIBLE IN 938	UND	2.00	S/ 454.15	S/ 908.31		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.13.00	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES					S/ 21,300.00				
04.13.01	EQUIPAMIENTO (PISCINA Y BOMBA DE AGUA)	GLB	1.00	S/ 12,800.00	S/ 12,800.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
04.13.02	EQUIPAMIENTO (CAMARA DE DESAGUE)	GLB	1.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 1/10/2025

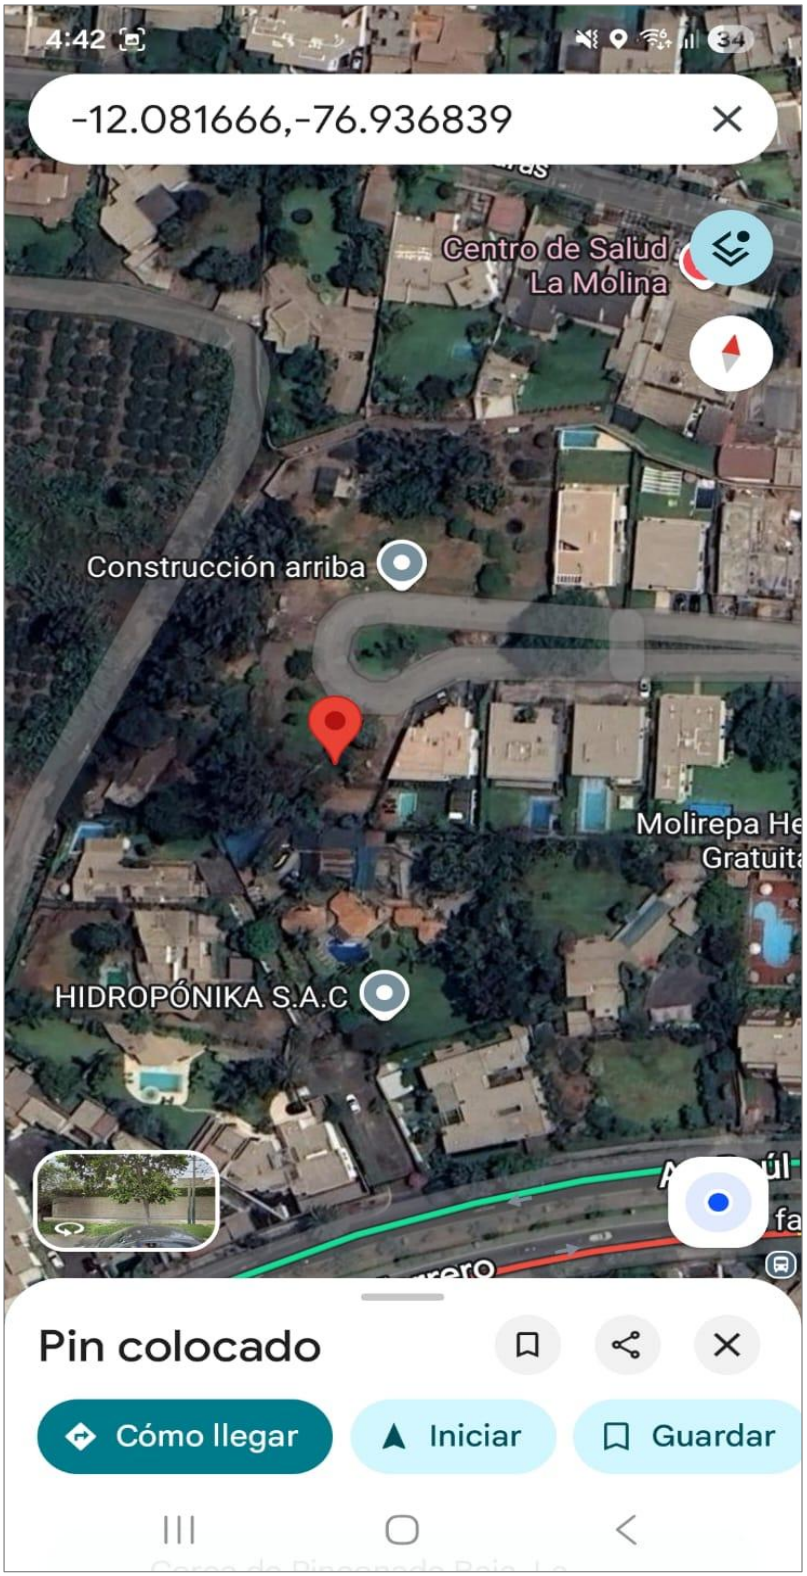
05.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS					S/ 31,399.00				
05.01.00	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION					S/ 14,861.41				
05.01.01	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION					S/ 1,647.50				
05.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 2'	PTO	15.00	S/ 62.50	S/ 937.50		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.01.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 4"	PTO	8.00	S/ 74.20	S/ 593.60		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.01.03	SALIDAS DE VENTILACION DE PVC SAP 2"	PTO	2.00	S/ 58.20	S/ 116.40		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.02	TUBERIAS ENTERRADAS					S/ 2,616.39				
05.01.02.01	TUBERÍA PVC C-P 2" ENTERRADA	ML	27.00	S/ 22.43	S/ 605.61		80%	S/ 484.49	20%	S/ 121.12
05.01.02.02	TUBERÍA PVC C-P 4" ENTERRADA	ML	67.25	S/ 29.90	S/ 2,010.78		80%	S/ 1,608.62	20%	S/ 402.16
05.01.03	TUBERIAS ADOSADAS Y MONTANTES					S/ 2,147.54				
05.01.03.01	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 3"	ML	42.10	S/ 31.20	S/ 1,313.52		80%	S/ 1,050.82	20%	S/ 262.70
05.01.03.02	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 4"	ML	22.30	S/ 37.40	S/ 834.02		80%	S/ 667.22	20%	S/ 166.80
05.01.04	TUBERIAS VENTILACION					S/ 880.40				
05.01.04.01	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 2"	ML	31.00	S/ 28.40	S/ 880.40		80%	S/ 704.32	20%	S/ 176.08
05.01.05	COLECTORES					S/ 2,073.60				
05.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS DE DESAGUE	ML	112.00	S/ 1.80	S/ 201.60		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.05.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y RELLENO COMPACTO PARA TUBERIAS DE DESAGUE	ML	48.00	S/ 16.50	S/ 792.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.05.03	CAMA DE APOYO MATERIAL FINO E=0.10 m	ML	48.00	S/ 22.50	S/ 1,080.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.06	CAJAS DE REGISTRO					S/ 2,100.00				
05.01.06.01	CAJAS DE REGISTRO DE 12"X24"	PZ	6.00	S/ 350.00	S/ 2,100.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.07	INSTALACIONES ESPECIALES DE DESAGUE					S/ 564.55				
05.01.07.01	INSTALACION DE DESAGUE EN CISTERNA INCLUYE REJILLAS	UND	1.00	S/ 564.55	S/ 564.55		0%	S/ 0.00	50%	S/ 282.27
05.01.08	PRUEBAS HIDRAULICAS					S/ 641.43				
05.01.08.01	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA	ML	142.21	S/ 1.10	S/ 156.43		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.08.02	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CISTERNA	UND	1.00	S/ 485.00	S/ 485.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.09	VARIOS					S/ 2,190.00				
05.01.09.01	BRIDA ROMPEAGUA 4" CON PLATINA DE 1/4"	GLB	2.00	S/ 695.00	S/ 1,390.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.09.02	PRUEBA DE ESTANQUIDAD DE CISTERNA	ML	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.00	SISTEMA DE AGUA FRIA					S/ 14,654.34				
05.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA					S/ 2,495.00				
05.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2"	PTO	22.00	S/ 72.50	S/ 1,595.00		20%	S/ 319.00	80%	S/ 1,276.00
05.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4"	PTO	12.00	S/ 75.00	S/ 900.00		20%	S/ 180.00	80%	S/ 720.00
05.02.02	REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA					S/ 3,086.60				
05.02.02.01	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	UND	10.00	S/ 72.50	S/ 725.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.02.02	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	UND	24.00	S/ 98.40	S/ 2,361.60		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.03	TUBERIAS COLGANTE					S/ 1,697.58				
05.02.03.01	TUBERÍA PVC C-10 - 2" EMPOTRADA	ML	11.20	S/ 58.60	S/ 656.32		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.03.02	TUBERÍA PVC C-10 - 2 1/2" EMPOTRADA	ML	12.15	S/ 85.70	S/ 1,041.26		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.04	TUBERÍAS EMPOTRADAS					S/ 2,549.70				
05.02.04.01	TUBERÍA PVC C-10 - 1/2" EMPOTRADA	ML	45.00	S/ 24.50	S/ 1,102.50		40%	S/ 441.00		S/ 0.00
05.02.04.02	TUBERÍA PVC C-10 - 3/4" EMPOTRADA	ML	54.00	S/ 26.80	S/ 1,447.20		40%	S/ 578.88		S/ 0.00
05.02.05	TUBERÍAS ADOSADAS					S/ 3,936.46				
05.02.05.01	TUBERÍA PVC C-10 - 2" EMPOTRADA	ML	46.40	S/ 65.60	S/ 3,043.84		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.05.02	TUBERÍA PVC C-10 - 3/4" ADOSADA	ML	26.10	S/ 34.20	S/ 892.62		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.06	INSTALACIONES ESPECIALES DE AGUA FRIA					S/ 565.00	0%			
05.02.06.01	INSTALACION DE AGUA FRIA DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 145.00	S/ 145.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.06.02	INSTALACION DE AGUA CONTRA INCENDIO DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 170.00	S/ 170.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.06.03	CONEXION EXTERIOR DE AGUA FRIA (EMPALME)	GLB	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.07	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE AGUA FRIA					S/ 324.00				
05.02.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE AGUA FRIA	ML	120.00	S/ 2.70	S/ 324.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE					S/ 1,883.26				
05.03.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE					S/ 580.00				
05.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC	PTO	8.00	S/ 72.50	S/ 580.00		0%	S/ 0.00	100%	S/ 580.00
05.03.02	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE					S/ 833.08				
05.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA CPVC D=1/2"	ML	15.00	S/ 23.40	S/ 351.00		20%	S/ 70.20	80%	S/ 280.80
05.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA CPVC D=3/4"	ML	18.40	S/ 26.20	S/ 482.08		20%	S/ 96.42	80%	S/ 385.66
05.03.03	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE					S/ 90.18				
05.03.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE AGUA CALIENTE	ML	33.40	S/ 2.70	S/ 90.18		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
05.03.04	OTROS					S/ 380.00				
05.05.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					S/ 65,206.42				
06.01.00	ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES					S/ 11,097.21				
06.01.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	45.00	S/ 55.21	S/ 2,484.45		60%	S/ 1,490.67		S/ 0.00
06.01.02	SALIDA DE TOMACORRIENTES	UND	59.00	S/ 55.21	S/ 3,257.39		60%	S/ 1,954.43		S/ 0.00
06.01.03	SALIDA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21		60%	S/ 33.13		S/ 0.00
06.01.04	SALIDA PARA LUMINARIAS	UND	94.00	S/ 55.21	S/ 5,189.74		60%	S/ 3,113.84		S/ 0.00
06.01.05	SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21		60%	S/ 33.13		S/ 0.00
06.01.06	SALIDA PARA TIMBRE	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21		60%	S/ 33.13		S/ 0.00
06.02.00	SALIDAS CAJA Y TUBERIA					S/ 487.50				
06.02.01	SALIDA PARA TV-CABLE	UND	4.00	S/ 48.75	S/ 195.00		30%	S/ 58.50		S/ 0.00
06.02.02	SALIDA PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA	UND	5.00	S/ 48.75	S/ 243.75		30%	S/ 73.13		S/ 0.00
06.02.03	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PORTERO	UND	1.00	S/ 48.75	S/ 48.75		30%	S/ 14.63		S/ 0.00
06.03.00	SALIDAS DE FUERZA (ENTUBADO Y CABLEADO)					S/ 468.34				
06.03.01	SALIDA PARA BOMBA PISCINA	UND	1.00	S/ 150.00	S/ 150.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.03.02	SALIDA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00	S/ 145.00	S/ 145.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.03.03	SALIDA PARA TABLERO PISCINA	UND	1.00	S/ 88.34	S/ 88.34		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.03.04	SALIDA PARA TABLERO GENERAL	UND	1.00	S/ 85.00	S/ 85.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.04.00	SISTEMA DE PUESTA ATIERRA					S/ 6,851.10				
06.04.01	POZO A TIERRA	UND	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA MALLA DE 0.6x0.4m -- SE CONSIDERA EN M3	ML	25.00	S/ 50.88	S/ 1,272.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.04.03	FAVIGEL O CEMENTO CONDUCTIVO ALREDEDOR DEL CABLE DE COBRE DESNUDO DE LA MALLA --SE CONSIDERA BOLSA CEMENTO CONDUCTIVO	M3	8.50	S/ 125.20	S/ 1,064.20		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.04.04	RELLENO DE ZANJA CON TIERRA DE CHACRA	M3	14.10	S/ 107.44	S/ 1,514.90		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.05.00	ENTUBADO DE MEDIDOR A CAJA MONTANTE ELECTRICA					S/ 3,008.95				
06.05.01	CANALIZACION ELECTRICA	UND	5.00	S/ 301.79	S/ 1,508.95		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.05.02	CAJAS DE PASE	UND	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.06.00	CABLEADO					S/ 1,809.23				
06.06.01	CANALIZADO Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE TV-CABLE EMPOTRADO EN PISO - 25mmØ PVC-P SALVO INDICACION.	ML	48.00	S/ 22.50	S/ 1,080.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.06.02	CANALIZADO Y CABLEADO TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEFONIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED 25mmØ PVC SAP SALVO INDICACION.	ML	32.41	S/ 22.50	S/ 729.23		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.07.00	CAJAS DE PASE (INCLUYE PICADO , ENTUBADO Y CABLEADO)					S/ 1,274.43				
06.07.01	1 - CAJA DE PASO 150X150X100mm	UND	5.00	S/ 55.41	S/ 277.05		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.07.02	2 - CAJA DE PASO 200X200X100mm	UND	10.00	S/ 55.41	S/ 554.10		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.07.03	3 - CAJA DE PASO 300X300X100mm	UND	8.00	S/ 55.41	S/ 443.28		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.00	MONTAJE DE EQUIPOS Y PLACAS ELECTRICAS						0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.01	ALIMENTADORES, TABLEROS					S/ 15,695.10				
06.08.01.01	ALIMENTADOR TABLERO TDG / TF-P1 3-1X6 mm2 N2XOH+1X6mm2 (T)NH-80	ML	218.40	S/ 27.48	S/ 6,001.63		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.01.02	ALIMENTADOR LUMINARIAS 3-1X10 mm2 N2XOH+1X10mm2 (T)NH-80	ML	195.10	S/ 36.33	S/ 7,087.98		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.01.03	ALIMENTADOR TOMACORRIENTES 3-1X10 mm2 N2XOH+1X10mm2 (T)NH-80	ML	35.41	S/ 36.33	S/ 1,286.45		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.01.04	ALIMENTADOR TABLERO CUARTO DE BOMBAS 3-1X6 mm2 N2XOH+1X6mm2 (T)NH-80	ML	48.00	S/ 27.48	S/ 1,319.04		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (Se enviara según plano unifilar plano mecanico para su ejecucion previa aprobacion de la supervision) ITM Y DIF son marca schneider semi industrial.					S/ 14,802.77				
06.08.02.01	TABLERO TG-B	UND	1.00	S/ 9,043.63	S/ 9,043.63		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.02.02	TABLERO CUARTO DE BOMBAS	UND	1.00	S/ 2,859.14	S/ 2,859.14		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.08.02.03	TABLERO DE PISCINAS	UND	1.00	S/ 2,900.00	S/ 2,900.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.09.00	PRUEBAS ELECTRICAS					S/ 9,711.79				
06.09.01	PRUEBAS ELECTRICAS, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO (INCLUYE MEDICION ARMANICOS EN TABLEROS/ NIVEL DE LUX/ ESTUDIO TERMICO TABLEROS/ BALANCEO DE CARGA/ETC)	GLB	1.00	S/ 4,151.02	S/ 4,151.02		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.09.02	PRUEBAS Y MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ALIMENTADORES Y DERIVADOS	Glb	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00		0%	S/ 0.00		S/ 0.00
06.09.03	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES (TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, CINTA AISLANTE, CINTILLOS, TERMINALES TIPO TUBULAR Y OJAL, MANGA TERMOCONTRAIBLE, TAPA CIEGAS, BORNERAS, SEÑALIZACIONES, STICKERS, OTROS).	Glb	1.00	S/ 3,160.77	S/ 3,160.77		0%	S/ 0.00		S/ 0.00

SUB TOTAL		S/ 1,340,827.49		S/ 372,220.71	S/ 202,100.56
GASTOS GENERALES - UTILIDADES	12%	S/ 160,899.30		S/ 44,666.49	S/ 24,252.07
SUB TOTAL		S/ 1,501,726.79	27.76%	S/ 416,887.20	15.07% S/ 226,352.63
IGV	18%	S/ 270,310.82		S/ 75,039.70	S/ 40,743.47
CSOTO TOTAL		S/ 1,772,037.61		S/ 491,926.89	S/ 267,096.10

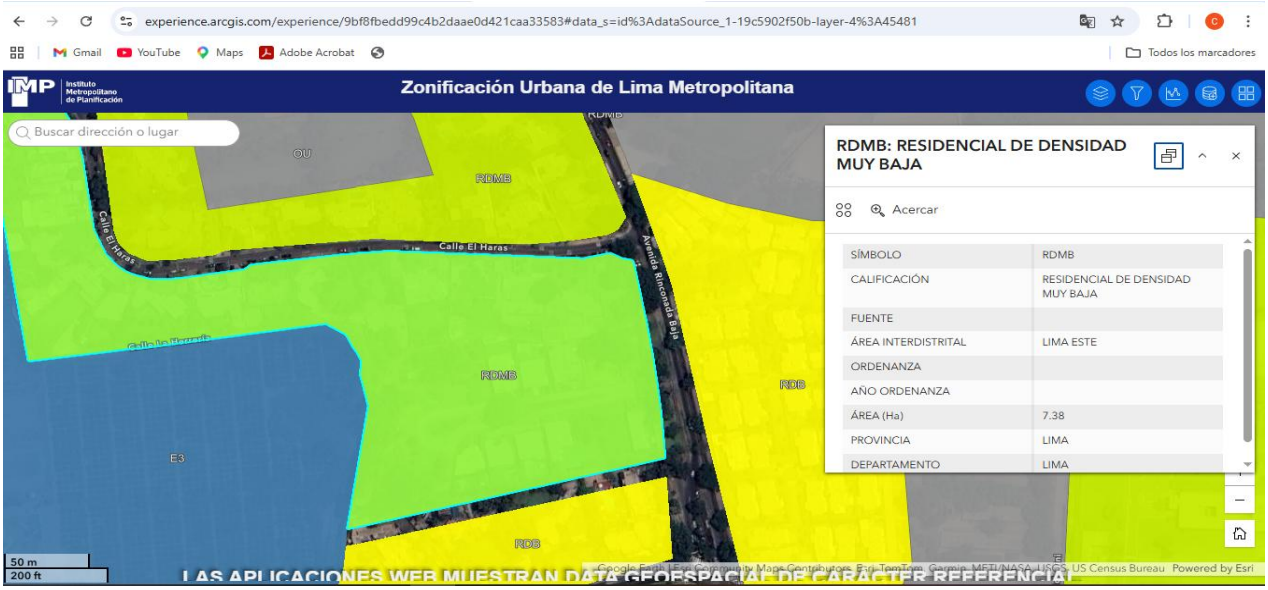


RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION:	NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN :	CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO :	CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA:	ALTO STUDIO SAC
RUC:	20555558776
FECHA:	1/10/2025


4:42
-12.081666,-76.936839
Centro de Salud La Molina
Construcción arriba
HIDROPÓNIKA S.A.C
Pin colocado
Cómo llegar
Iniciar
Guardar

ZONIFICACIÓN



sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº IX - SEDE LIMA
OFICINA REGISTRAL LIMA
Nº Partida: 14046330

INSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE PREDIOS
UNIDAD INMOBILIARIA 12
CON FRENTE A LA AVENIDA MANUEL PRADO UGARTECHE NUMERO 470
DISTRITO DE LA MOLINA

REGISTRO DE PREDIOS
PARTIDA DE INDEPENDIZACION: RÉGIMEN DE INDEPENDIZACIÓN Y COPROPIEDAD (Proyecto Integral)

A00001 - ANTECEDENTE DOMINIAL:
Independizado de la Partida Electrónica Nº13784819 del Registro de Predios.- LIMA, 08 de Marzo del 2018.-

B00001 - DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE:
UBICACIÓN: UNIDAD INMOBILIARIA 12
PORCENTAJE DE ZONAS COMUNES: 5.38%
ÁREA OCUPADA: 703.93 m2. **ÁREA TECHADA:** 0.00 m2.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
Por el Frente: con una línea curva de 11.43ml., que colinda con el área común.
Por la Izquierda: con una línea recta de 32.21ml., que colinda con Unidad Inmobiliaria 13.
Por la Derecha: con una línea recta de 47.15ml., que colinda con la Unidad Inmobiliaria 11.
Por el Fondo: con una línea recta de 37.77ml., que colinda con propiedad de terceros.- LIMA, 08 de Marzo del 2018.

C00001 - TITULO DE DOMINIO: La Independización se hace en virtud del pedido formulado por su propietaria, **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK**, en calidad de fiduciario, inscrito en la Partida N°11009129 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, ha adquirido el dominio fiduciario del inmueble inscrito en la presente partida, en mérito al contrato de fideicomiso de administración y garantía celebrado con GUIDO RODRIGO LUCIONI STRUQUE, CAMILA LUCIONI STRUQUE y CARLA FRANCESCA LUCIONI STRUQUE, en calidad de fideicomitentes.
Se deja constancia; que se realiza la presente independización por haberlo autorizado la Municipalidad de La Molina en mérito a la Resolución Subgerencial N° 0084-2018-MDLM-GDUE-SGPHU de fecha 06/02/2018, que dispone: *"…se aprueba el Proyecto Integral consistente en 19 unidades inmobiliarias (18 unidades inmobiliarias con diseño de vivienda tipo y 1 unidad inmobiliaria reservada para futura construcción) y obras complementarias, con un total de 10,585.98 m2, de área techada total, que podrá ejecutarse por etapas de manera individual y progresiva que podrán ser objeto de independización de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 63° del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios*". Así consta en la Resolución Subgerencial N°0883-2017-MDLM-GDUE-SGOPHU de fecha 25/10/2017, expedido por la Municipalidad de La Molina; Resolución Subgerencial N°0084-2018-MDLM-GDUE-SGOPHU de fecha 06/02/2018, expedido por la Municipalidad de La Molina; Memoria Descriptiva de Independización, Documento Privado de Reglamento Interno y Documento Privado Aclaratorio con firmas certificadas de fecha 14/11/2017; por Notario de Lima Dr. Ricardo Fernandini Barreda.
Se realiza la presente inscripción por haberlo dispuesto así ***el TRIBUNAL REGISTRAL mediante Resolución N° 402-2018-SUNARP-TR-L de fecha 20/02/2018*** expedido por el Tribunal Registral. - **Presentación y Derechos**: El título fue presentado el 25/08/2017 a las 11:25:44 AM horas, bajo el Nº 2017-01815301 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/ 2,218.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00019779-760 00030488-205.- LIMA, 08 de Marzo del 2018.-

D00001 - GRAVÁMENES Y CARGAS:
Anteriores a la independización y con treinta años de antigüedad.- NINGUNA.- LIMA, 08 de Marzo del 2018.-

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 124-97-SUNARP

Municipalidad de La Molina

2026
DECLARACIÓN JURADA MECANIZADA DEL IMPUESTO PREDIAL

T.U.O. DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
(Art. 14 del D.S. N° 156 - 2004 EF)

PU
PREDIO URBANO

DECLARACIÓN TRIBUTARIA N°: 00547822-2026

AÑO	CÓDIGO PREDIO	ANEXO
2026	120117093777	001

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	CÓDIGO CONTRIBUYENTE
FERREYRA SUAREZ DE ZLOSILO NORMA ELIZABETH	01291768
APELLIDOS Y NOMBRES DE CÓNYUGE O REPRESENTANTE LEGAL	**D.N.I./C.E./R.U.C.**
ZLOSILO TOSO NICOLA DAVID	40377500

UBICACIÓN DEL PREDIO

NOMBRE DE LA VÍA	N°	BLOCK	DPTO.	MZ.	LOTE	SUBLOTE
ALM. MANUEL PRADO UGARTECHE	470		UI.12		7A	
URB. / ASOC. / AA.HH. / OTROS					**CÓDIGO CATASTRAL**	
RINCONADA BAJA					15011407560112010100 11	

CARACTERÍSTICAS

CONDICIÓN DE PROPIEDAD	TIPO	USO	ESTADO	% CONDOMINIO
PROPIETARIO UNICO	Predio en Quinta.	Terreno Sin Construir	Terr.sin Construir	100.00

PISO	MAT.	E.C.	CLASIF.	AÑO CONST.	CATEGORÍA	VALOR UNITARIO M2	INC. 5%	DEPRECIACIÓN	VALOR UNITARIO DEP.	ÁREA CONSTRUIDA	VALOR AREA CONSTRUIDA	% A.C.E.	% A.C.P.	VALOR AREA COMÚN	VALOR DE LA CONSTRUC.

OTRAS INSTALACIONES PROPIAS

TIPO	ANT	EC.	DIMENSIÓN	VALOR
VALOR TOTAL OTRAS INSTALACIONES PROPIAS				0.00

OTRAS INSTALACIONES COMUNES

TIPO	ANT	EC.	DIMENSIÓN	% O.I.C.E.	% O.I.C.P.	VALOR
CERCO DE LADRILLO	1963	2	8.00	0.000	5.380	202.30
VALOR TOTAL OTRAS INSTALACIONES COMUNES						202.30

ÁREA DE TERRENO
703.93

A.C. TERR. EDIF.
0.00

% A.C. TERR. EDIF.
0.00

A.C. TERR. PRIV.
2,205.32

% A.C. TERR. PRIV.
5.38

V. ARANCEL M²
280.00

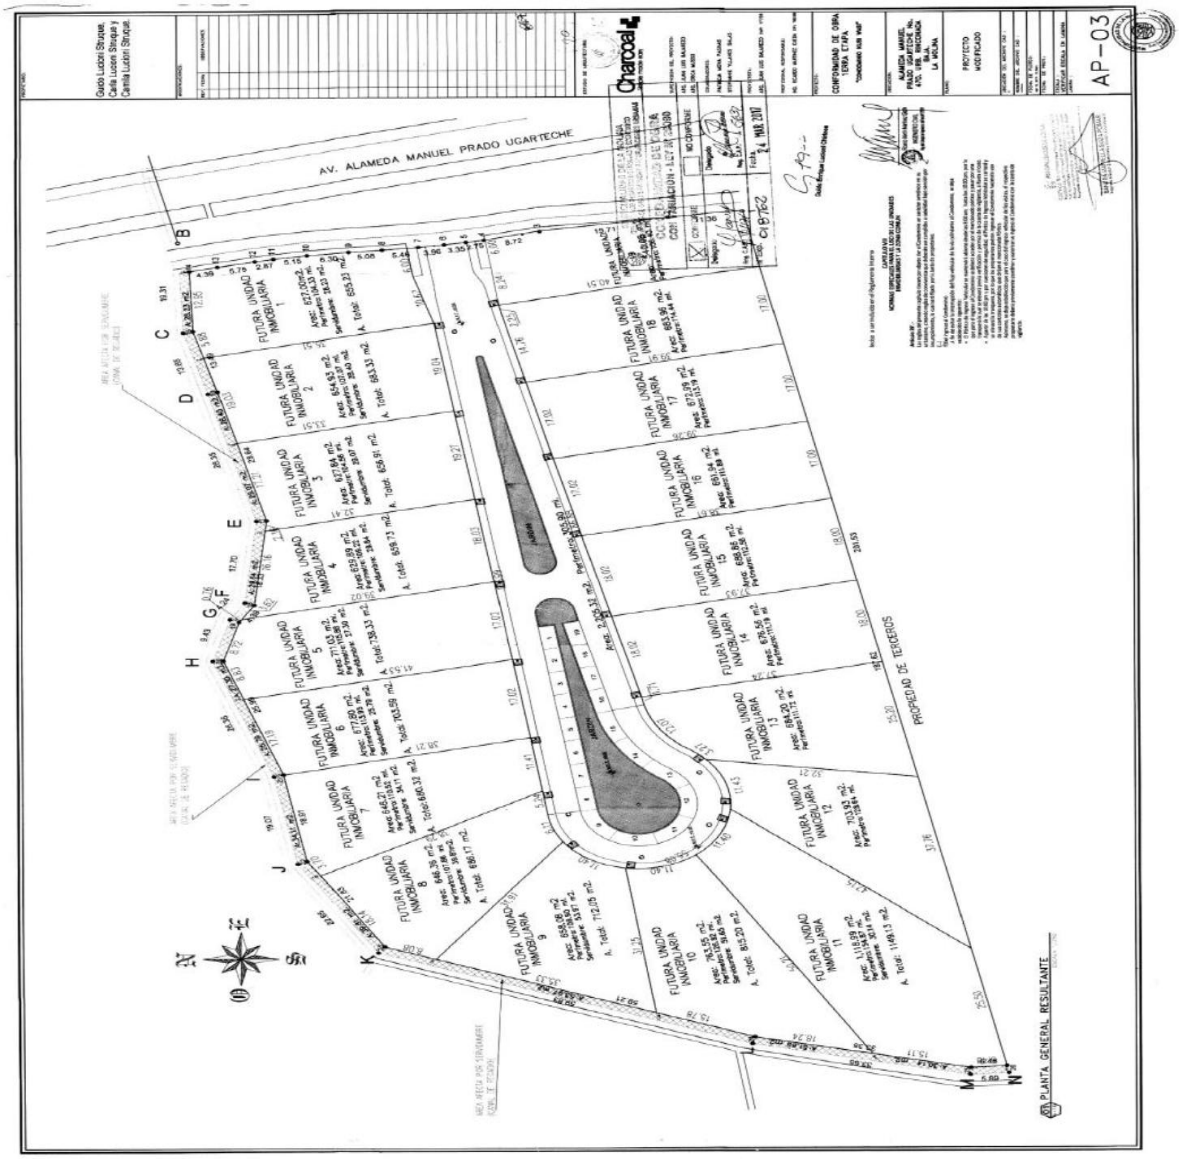
VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN	0.00
VALOR DE OTRAS INSTALACIONES	202.30
VALOR TOTAL DE TERRENO	230,321.34
AUTOVALÚO	230,523.64
CONDOMINIO % 100.00	230,523.64
DEDUCCIÓN	0.00
AUTOVALÚO AFECTO	230,523.64

OBSERVACIONES

LA UBICACIÓN DEL PREDIO CORRESPONDE A LA NOMENCLATURA VIAL DEL DISTRITO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO 129-99

% A.C.E, O.I.C.E, A.T.C.E : % ÁREA COMÚN EDIFICIOS, OTRAS INSTALACIONES COMÚN EDIFICIOS; ÁREA TERRENO COMÚN EDIFICIOS.
% A.C.P, O.I.C.P, A.T.C.P : % ÁREA COMÚN PRIVADOS, OTRAS INSTALACIONES COMÚN PRIVADOS, ÁREA TERRENO COMÚN PRIVADOS.

(IMP. 260430) 547822 – 2 / 4 – PL (65430) **N° ORDEN: 547822** 2 / 4


AV. ALAMEDA MANUEL PRADO UGARTECHE
PROPIEDAD DE TERCEROS
PLANTA GENERAL RESULTANTE
AP-03

Solicitud Construyo

1) Nombre del cliente:
NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO Y NORMA ELIZABETH FERREYRA SUAREZ DE ZLOSILO

2) Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):
URBANIZACIÓN RINCONADA BAJA, SUB LOTE 7A ALAMEDA MANUEL PRADO UGARTECHE,
UNIDAD INMOBILIARIA 12. LA MOLINA

3) N° de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):
PARTIDA N° 14046330

4) Cuadro de áreas: Areas que están incluidas en el proyecto y licencia de construcción.

	AREA TECHADA (EXISTENTE)	AREA TECHADA (NUEVAS)
PRIMER PISO	-	218.00
SEGUNDO PISO	-	177.55
OTRAS INSTALACIONES		
PISCINA	-	25.30
CISTERNA	-	5.81

5) Descripción del proyecto:

Primer nivel: se dispone en los siguientes ambientes:

La vivienda al estar dentro de un condominio no tiene muro de cerco, a la que se accede mediante una losa de concreto enchapada con piedra tipo Talamolle desde la vía interior del condominio que se encuentra a 0.00 y una plaza exterior del mismo material, que se encuentra a - 0.70m.

La puerta de ingreso es de carpintería PVC con cierre hermético, el Hall de doble altura tiene un piso de madera Shihuahuaco de 0.20x1.20m flotante acabado con Barathane natural y zócalo de madera de 10cm. Adjunto a este espacio esta la escalera metálica color grafito con pasos de madera volados, que lleva al 2do nivel donde está el área intima de la vivienda.

Al lado de la escalera en el 1er nivel se encuentra el Estudio y una jardinera, seguido de unos escalones los cuales nos llevan al baño de visita y a la sala, la cual tiene vista a la terraza exterior. Este ambiente está al costado del comedor principal, y ambos tienen piso de Madera Shihuahuaco de 0.20x1.20m flotante acabado con Barathane natural y zócalo de madera de 10cm. La mampara es de carpintería PVC con cierre hermético y vidrio templado, los muros laterales son pintados color blanco Todo el 1er nivel tiene una altura interna de 3m y se encuentra a -1.05m con respecto a la vía de ingreso al lote.

El comedor se ilumina por 2 lados, por la mampara de la terraza y por un patio interior central, que da iluminación también a la cocina, al comedor de diario y a la escalera de acceso al 2do piso.

La cocina está al lado del comedor se ingresa por dos puertas vaivén de madera; una de las cual da a la sala y otra hacia el comedor. Tiene una isla de piedra sinterizada la cual funciona como comedor de diario. Todos los muebles de la cocina son de melamina tropical de 18mm al interior y los frentes de MDF de 18mm acabado poliuretano y enchape de madera. El tablero será de piedra sinterizada color negro de 12mm y el back splash de 6mm (ente los muebles), el piso es de porcelanato importado antideslizante de 0.60x0.60m.

A continuación de la cocina se ubica el área de servicio, donde se proyecta el Dormitorio de Servicio con baño incorporado y la Lavandería que cuenta con un acceso secundario desde y hacia el Garage.

Desde la cocina se tiene una mampara hacia un jardín japones en el exterior el cual te conduce hacia la terraza exterior, acá se tiene un área destinada para una parrilla de acero con un lavacopas y mueble bajo para guardar cosas. La piscina tiene profundidad variada; cuenta con el sistema recirculante y agua temperada; y esta revestida con porcelanato. Atrás de la zona techada de la terraza se tiene un servicio higiénico completo para uso de visita y piscina y un depósito.

El área restante del terreno no construido es jardín que tiene vegetación apta para la zona y cuenta con iluminación de tipo estacas.

Segundo nivel:

Este nivel se desarrolla a +2.25m con respecto a la vía de ingreso y se accede a través de la escalera principal metálica que se encuentra en el ingreso de la vivienda. Esta nos lleva a un puente el cual separa un closet del área de dormitorios. El área de dormitorios esta precedida por un estar, el cual cuenta iluminación natural.

Sobre el lado interior del predio y con vista al jardín interno se proyecta el dormitorio principal, al cual se accede a través de un pasillo donde se tiene un closet para ropa blanca. El dormitorio principal tiene una iluminación natural mediante una mampara que da a un balcón con vista al jardín posterior, al lado del dormitorio se tiene el walking closet. El baño principal completo se encuentra al final del dormitorio y tiene un tablero con dos lavatorios, área para ducha y área para inodoro.

Los Dormitorios Secundarios (2), ambos con Madera Shihuahuaco flotante de 0.20x1.20m y zócalo de Madera Shihuahuaco de 0.10 de alto todo con acabado en Barathane natural, cuentan con su closets respectivo y el baño incorpordado, estos están enchapados con porcelanato importado de 60x60 antideslizante en piso y de 0.30x0.60m en pared, se enchapan las paredes de piso a techo, los tableros son con piedra sinterizada de 12mm, aparatos sanitarios de cerámica color blanco, y grifería importada de acero inoxidable color negro según el uso.

Los muebles de baño son en melamina tropical interior de 18mm, y los frentes son de madera.
Los closets tienen una o 2 cajoneras según el área, con repisas en la parte superior y tubo colgador en 2 niveles.

Todas las luminarias son de empotrar con placas eléctricas importadas en color negro mate.
Todos los dormitorios, así como la cocina, el estar, salón y sala. tienen punto para tv e intercomunicador.

Los closets tienen punto eléctrico para deshumecedor.
Se ha considerado en los dormitorios y en el estar aire acondicionado.

Toda la carpintería de vidrio es de PVC hermética con vidrio templado.

Fachada:

La materialidad de esta va a estar compuesta por muros de concreto expuesto de encofrado formato 1.20 x 0.60, y ladrillo rococho envejecido; reducidas áreas de pintura, carpintería de vidrios hermética de primera calidad y resaltado por un proyecto de iluminación ambiental.

6) Presupuesto global por especialidades (Soles):

Obras Provisionales	S/	50,837.60
Estructuras	S/	360,376.65
Arquitectura	S/	243,968.61
Acabados	S/	589,039.21
Sanitarias	S/	31,399.00
Eléctricas	S/	65,206.42
SUB TOTAL	S/	1,340,827.49
GASTOS GENERALES-UTILIDAD (12%)	S/	160,899.30
SUB TOTAL	S/	1,501,726.79
IGV(18%)	S/	270,310.82
TOTAL	S/	1,772,037.61

7) Fecha de finalización de obra estimada:

30 junio 2026

Pedro Luis Yarleque Nima
Ingeniero Civil
CIP. 292673

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Firma Digital Municipalidad de La Molina
Firmado digitalmente por: CUADROS DIAZ Gabriella Rosa Maria FAU 20131365722 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/12/2025 07:14:35-05

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Expediente Administrativo N° : E-08481-2025 (**Básico N° 024634**)
Fecha de la Emisión : 17 / 12 / 2025
Fecha de Vencimiento : 16 / 12 / 2028

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN N° 0269-2025-MDLM-GDU-SOP

ADMINISTRADA : **SOCIEDAD CONYUGAL: NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO y NORMA ELIZABETH FERREYRA SUAREZ DE ZLOSILO**

LICENCIA DE : Ampliación - Modalidad **B**
(Edificación nueva de vivienda unifamiliar en Unidad Inmobiliaria N° 12 que forma parte de una Quinta de 19 unidades de vivienda)
Aprobación de proyecto con evaluación previa por la Municipalidad

USO : Residencial - Quinta
ZONIFICACIÓN : RDMB
ALTURA : 02 pisos
ÁREA DE LOTE MATRIZ : 15,279.52 m²
(UNIDAD INM. N° 12) : **ÁREA OCUPADA** : 703.93 m²
UBICACIÓN :

Lima	Lima	La Molina
Departamento	**Provincia**	**Distrito**
Rinconada Baja	Sub Lote 7A	Alameda Manuel Prado Ugarteche, Unidad Inmobiliaria 12
Urbanización (3)	**Mz./Lote/Sublote**	**Av./Jr./Calle/Pasaje**

CUADRO DE AREAS :

PISOS	EXISTENTE		AMPLIACION	TOTAL
	ÁREA COMÚN	EDIFICACIONES	UNIDAD INM. N° 12	
SÓTANO	---	1,724.56 m²	---	1,724.56 m²
1° PISO	15.00 m²	2,394.71 m²	218.00 m²	2,612.71 m²
2° PISO	---	2,254.11 m²	177.55 m²	2,431.66 m²
TOTAL	15.00 m²	6,373.38 m²	395.55 m²	6,768.93 m²
OTRAS INSTALACIONES				
PISCINA	---	276.17 m²	25.30 m²	301.47 m²
CISTERNA	---	49.89 m³	5.81 m³	55.70 m³
TANQUE ELEVADO	---	178.88	---	178.88
CERCO PERIMÉTRICO	---	2.58	---	2.58
ÁREA COMÚN CON DECLARATORIA DE FÁBRICA				
CERCO FRONTAL				73.00 ml
TECHO SOL y SOMBRA (INGRESO PEATONAL y VEHICULAR)				40.50 m²
PISTAS				975.70 m²
VEREDAS				474.68 m²

1. El titular de la licencia de edificación se encuentra obligado a solicitar la conformidad de obra, posterior a la ejecución del proyecto de edificación, según lo dispuesto en el literal c) Art. 13° - del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 – **"Ley de Regulación de Licencias de Habilitación Urbana y de Edificación"** (D.S. N° 006-2017-VIVIENDA), bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas respectivas.
2. Asimismo, la obra deberá ajustarse al Proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial, este Municipio está facultado de adoptar medidas provisionales inmediatas previstas en el numeral 6 Artículo 10° del TUO de la Ley N° 29090.

OBSERVACIONES :

1. Para la adquisición de los derechos de construcción en el predio, bajo los términos y condiciones otorgados en la Resolución de Licencia de Edificación, deberá producirse su notificación legalmente realizada, conforme al literal a) numeral 3.4 Art. 3° - RLHULE y numeral 16.1 Art. 16° -TUO LPAG.

(VER ANOTACIONES EN EL REVERSO →)

GRMCD/KSHP

Este documento es una copia auténtica imprimible de un archivo electrónico registrado en la Municipalidad Distrital de La Molina, conforme al Art. 25 del D.S. N.° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Final del D.S. N.° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden verificarse mediante el escaneo del código QR ubicado en el encabezado del documento.

LA MOLINA Se Renueva

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 01/10/2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL (S/.)
01.00.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES VIVIENDA 2 NIVELES Y EXTERIORES					50,837.60
01.01.00	OBRAS PROVISIONALES					30,057.60
01.01.01	CERCO PERIMÉTRICO DE OBRA Y PROTECCION VECINOS	ML	38.00	S/ 55.20	S/ 2,097.60	
01.01.02	ALMACENES, VESTUARIOS Y COMEDORES	GLB	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	
01.01.03	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	GLB	1.00	S/ 1,250.00	S/ 1,250.00	
01.01.04	MOVILIZACIÓN Y RETIRO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ETAPA DE MUROS DE CONTENCION	GLB	1.00	S/ 2,150.00	S/ 2,150.00	
01.01.05	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA PROCESO DE CASCO	GLB	1.00	S/ 8,750.00	S/ 8,750.00	
01.01.06	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00	
01.01.07	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	GLB	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00	
01.01.08	ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN	MES	5.00	S/ 280.00	S/ 1,400.00	
01.01.09	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	MES	5.00	S/ 220.00	S/ 1,100.00	
01.01.10	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES DE STAFF Y OBREROS	MES	5.00	S/ 520.00	S/ 2,600.00	
01.01.11	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	GLB	1.00	S/ 3,900.00	S/ 3,900.00	
01.01.12	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (SOLO CASCO), CONSIDERA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	GLB	1.00	S/ 4,800.00	S/ 4,800.00	
01.02.00	TRANSPORTE DE MATERIALES					15,400.00
01.02.01	TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL	GLB	1.00	S/ 15,400.00	S/ 15,400.00	
01.03.00	SEGURIDAD Y SALUD					5,380.00
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GLB	1.00	S/ 5,380.00	S/ 5,380.00	
02.00.00	ESTRUCTURAS					369,376.52
02.01.00	ESTRUCTURA CASCO					S/ 230,975.35
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRA					S/ 1,715.52
02.01.01.01	CORTE DE TERRENO, AREA DE PISCINA	M3	68.08	S/ 25.20	S/ 1,715.52	
02.01.02	EXCAVACIONES MANUAL					S/ 1,218.32
02.01.02.01	EXCAVACION DE ZAPATAS AISLADAS	M3	34.81	S/ 35.00	S/ 1,218.32	
02.01.03	RELLENOS					S/ 4,302.31
02.01.03.01	RELLENOS CON MATERIAL PROPIO	M3	8.70	S/ 38.00	S/ 330.69	
02.01.03.02	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO E=0.15 m	M2	378.25	S/ 10.50	S/ 3,971.63	
02.01.04	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO					S/ 2,836.88
02.01.04.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	378.25	S/ 7.50	S/ 2,836.88	
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					S/ 6,200.00
02.01.05.01	ELIMINACION DE DESMONTE DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	S/ 6,200.00	S/ 6,200.00	
02.01.05.02	CONCRETO SIMPLE Y ANCLAJES					
02.01.06	CONCRETO SIMPLE					S/ 12,484.00
02.01.06.01	SOLADO e=3" CIMENTACION Y MURO	M2	125.00	S/ 26.00	S/ 3,250.00	
02.01.06.02	CONCRETO CICLOPEO	M3	32.40	S/ 285.00	S/ 9,234.00	
02.01.07	CONCRETO ARMADO					
02.01.07.01	ZAPATAS					S/ 17,729.69
02.01.07.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO ELEMENTOS HORIZONTALES F'C=210	M3	35.41	S/ 357.50	S/ 12,659.08	
02.01.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ZAPATA	M2	35.17	S/ 55.00	S/ 1,934.16	
02.01.07.01.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	518.42	S/ 6.05	S/ 3,136.45	
02.01.07.02	VIGA DE CIMENTACION					S/ 16,953.71
02.01.07.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO ELEMENTOS HORIZONTALES F'C=210	M3	18.50	S/ 357.50	S/ 6,613.75	
02.01.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE VIGA DE CIMENTACION	M2	125.00	S/ 55.00	S/ 6,875.00	
02.01.07.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	500.56	S/ 6.05	S/ 3,028.37	
02.01.07.02.04	CURADO	M2	363.83	S/ 1.20	S/ 436.59	
02.01.07.03	LOSA DE PISO e=15 cm, SIMPLE					S/ 21,074.24
02.01.07.03.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	53.11	S/ 357.50	S/ 18,985.40	
02.01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSA DE PISOS	M2	25.60	S/ 65.00	S/ 1,664.00	
02.01.07.03.03	CURADO	M2	354.04	S/ 1.20	S/ 424.85	
02.01.07.04	COLUMNAS					S/ 41,921.00
02.01.07.04.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	25.20	S/ 357.50	S/ 9,009.00	
02.01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE COLUMNAS	M2	245.20	S/ 55.00	S/ 13,486.00	
02.01.07.04.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	3,150.00	S/ 6.05	S/ 19,057.50	
02.01.07.04.04	CURADO	M2	307.08	S/ 1.20	S/ 368.50	
02.01.07.05	COLUMNETAS					S/ 7,219.15
02.01.07.05.01	CONCRETO MANUAL F'C=210	M3	5.20	S/ 357.50	S/ 1,859.00	
02.01.07.05.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE COLUMNETAS	M2	57.94	S/ 75.00	S/ 4,345.31	
02.01.07.05.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	156.25	S/ 6.05	S/ 945.31	
02.01.07.05.04	CURADO	M2	57.94	S/ 1.20	S/ 69.53	
02.01.07.06	VIGAS Y CORTES					S/ 35,730.66
02.01.07.06.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	24.50	S/ 357.50	S/ 8,758.75	
02.01.07.06.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE VIGAS	M2	142.10	S/ 65.00	S/ 9,236.72	
02.01.07.06.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	2,903.25	S/ 6.05	S/ 17,564.66	
02.01.07.06.04	CURADO	M2	142.10	S/ 1.20	S/ 170.52	
02.01.07.07	LOSA ALIGERADA					S/ 57,426.63
02.01.07.07.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	55.41	S/ 357.50	S/ 19,809.08	
02.01.07.07.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE LOSAS ALIGERADAS	M2	429.83	S/ 42.50	S/ 18,267.75	
02.01.07.07.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2	KG	1,457.12	S/ 6.05	S/ 8,815.58	
02.01.07.07.04	CURADO DE LOSA POSTERIOR A VACEADO	M2	429.83	S/ 1.20	S/ 515.80	
02.01.07.07.05	LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15 cm x 30 cm x 30 cm	UND	3,915.75	S/ 2.56	S/ 10,018.44	
02.01.07.08	ESCALERAS					S/ 4,163.25
02.01.07.08.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	3.50	S/ 357.50	S/ 1,251.25	
02.01.07.08.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ESCALERAS	M2	19.99	S/ 78.00	S/ 1,559.23	
02.01.07.08.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	219.44	S/ 6.05	S/ 1,327.59	
02.01.07.08.04	CURADO	M2	20.99	S/ 1.20	S/ 25.19	
02.02.00	ESTRUCTURA PISCINA					S/ 40,707.86
02.02.01	LOSA DE PISO e=15 cm, CONCRETO ARMADO					S/ 5,712.02
02.02.01.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210	M3	5.97	S/ 357.50	S/ 2,135.88	
02.02.01.02	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	586.30	S/ 6.05	S/ 3,547.10	
02.02.01.03	CURADO	M2	24.20	S/ 1.20	S/ 29.04	
02.02.02	CONCRETO ARMADO PISCINA MUROS					S/ 34,995.84
02.02.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 CON IMPERMEABILIZANTE	M3	35.00	S/ 418.00	S/ 14,630.00	
02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE MUROS DE CONTENCION	M2	199.66	S/ 65.20	S/ 13,017.67	
02.02.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	1,010.82	S/ 6.05	S/ 6,115.48	
02.02.02.04	RELLENO DE TERRENO	M3	25.00	S/ 28.50	S/ 712.50	
02.02.02.05	COMPACTADO DE TERRENO	M2	20.48	S/ 25.40	S/ 520.19	
02.03.00	ESTRUCTURA CISTERNA					S/ 23,326.00
02.03.01	EXCAVACION MANUAL DE CISTERNA	M3	54.00	S/ 35.00	S/ 1,890.00	

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 01/10/2025

02.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 CON IMPERMEABILIZANTE	M3	24.20	S/ 418.00	S/ 10,115.60	
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENC. DE MUROS	M2	67.00	S/ 65.20	S/ 4,368.40	
02.03.04	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	650.00	S/ 6.05	S/ 3,932.50	
02.03.05	RELLENO DE TERRENO	M3	25.00	S/ 28.50	S/ 712.50	
02.03.06	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	26.00	S/ 7.50	S/ 195.00	
02.03.07	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADO	M2	60.00	S/ 35.20	S/ 2,112.00	
02.04.00	**ESTRUCTURA CERCO PERIMETRICO**					**S/ 59,263.27**
02.04.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					**S/ 6,453.82**
02.04.01.01	EXCAVACION Y DESQUINCHADO DE TERRENO DE MANERA MANUAL	M3	52.30	S/ 35.00	S/ 1,830.50	
02.04.01.02	ACARREO HORIZONTAL INTERNO HACIA PUNTO DE ACOPIO	M3	67.99	S/ 30.00	S/ 2,039.70	
02.04.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	67.99	S/ 38.00	S/ 2,583.62	
02.04.02	**ZAPATAS Y SOBRECIMIENTO 183 ML**					**S/ 52,809.45**
02.04.02.01	CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATA Y SOBRECIMIENTO F'C=210	M3	68.70	S/ 357.50	S/ 24,560.25	
02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENC. DE ZAPATA Y SOBRECIMIENTO	M2	125.00	S/ 65.20	S/ 8,150.00	
02.04.02.03	ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - HABILITADO	KG	3,105.24	S/ 6.05	S/ 18,786.70	
02.04.02.04	TECNOPOR LADO DE JUNTA	M2	125.00	S/ 10.50	S/ 1,312.50	
02.05.00	**ESTRUCTURA PARA CAMARA DE DESAGUE**					**S/ 6,104.17**
02.05.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**					**S/ 1,485.30**
02.05.01.01	EXCAVACION DE TERRENO	M3	12.00	S/ 35.00	S/ 420.00	
02.05.01.02	ACARREO HORIZONTAL INTERNO HACIA PUNTO DE ACOPIO	M3	12.00	S/ 30.00	S/ 360.00	
02.05.01.03	PERFILAMIENTO CONTRA TERRENO AREA DE ENCOFRADO	M2	9.00	S/ 12.50	S/ 112.50	
02.05.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	15.60	S/ 38.00	S/ 592.80	
02.05.02	**LOSA DE CIMENTACION**					**S/ 249.58**
02.05.02.01	CONCRETO PARA LOSA E=20 CM f'c=210 kg/cm2	M3	0.32	S/ 367.00	S/ 116.27	
02.05.02.02	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	4.00	S/ 1.20	S/ 4.80	
02.05.02.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	21.07	S/ 6.10	S/ 128.51	
02.05.03	**MUROS DE CONTENCION**					**S/ 3,120.26**
02.05.03.01	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION PERIMETRALES f'c=210 kg/cm2	M3	1.80	S/ 367.00	S/ 660.60	
02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALTURA NORMAL EN PLACAS	M2	24.00	S/ 65.20	S/ 1,564.80	
02.05.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	118.44	S/ 6.10	S/ 722.48	
02.05.03.04	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	143.65	S/ 1.20	S/ 172.38	
02.05.04	**LOSAS MACIZAS e=20 cm**					**S/ 1,249.03**
02.05.04.01	CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS f'c= 210 kg/cm2	M3	0.32	S/ 367.00	S/ 116.27	
02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALTURA NORMAL EN LOSAS MACIZAS	M2	2.50	S/ 65.20	S/ 163.00	
02.05.04.03	ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	KG	21.07	S/ 6.10	S/ 128.51	
02.05.04.04	CURADO CON ADITIVO CURADOR	M2	2.50	S/ 1.20	S/ 3.00	
02.05.04.05	RELLENO DE TERRENO	M3	4.50	S/ 28.50	S/ 128.25	
02.05.04.06	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO	M2	8.00	S/ 7.50	S/ 60.00	
02.05.04.07	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES IMPERMEABILIZADO	GLB	1.00	S/ 650.00	S/ 650.00	
03.00.00	**ARQUITECTURA**					**243,968.61**
03.01.00	**ARQUITECTURA CASA E INTERIORES**					**S/ 243,968.61**
03.01.01	**ELIMINACION DE MATERIAL**					**S/ 3,500.00**
03.01.01.01	ELIMINACION DE DESMONTE DURANTE LA OBRA	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
03.01.02	**TABIQUE LADRILLO KING KONG**					**S/ 72,303.47**
03.01.02.01	MURO DE LADRILLO KING KONG 12 CM TIPO SOGA	M2	564.48	S/ 95.20	S/ 53,738.50	
03.01.02.02	MURO DE LADRILLO P/TARRAJEAR - E : 0.25 TIPO CABEZA	M2	148.05	S/ 125.40	S/ 18,564.98	
03.01.03	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**					**S/ 86,072.78**
03.01.03.01	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.	M2	1,425.05	S/ 34.50	S/ 49,164.36	
03.01.03.02	TARRAJEO EN CIELORASOS CON MEZCLA +REND	M2	417.57	S/ 35.20	S/ 14,698.46	
03.01.03.03	TARRAJEO DE LADO ESCALERAS	M2	2.50	S/ 52.00	S/ 130.00	
03.01.03.04	FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS	ML	34.00	S/ 37.00	S/ 1,258.00	
03.01.03.05	BRUÑA ENTRE TECHO Y MURO	ML	415.25	S/ 3.80	S/ 1,577.95	
03.01.03.06	TARRAJEO DE FONDOS DE ESCALERAS	M2	4.15	S/ 35.80	S/ 148.57	
03.01.03.07	VESTIDURA DE DERRAMES MUROS, PUERTAS Y VENTANAS	ML	189.68	S/ 15.50	S/ 2,940.04	
03.01.03.08	TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE-JARDINERAS	M2	58.00	S/ 32.50	S/ 1,885.00	
03.01.03.09	TARRAJEO DE VIGAS	M2	149.21	S/ 35.20	S/ 5,252.14	
03.01.03.10	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES EN SOBRECIMIENTO	M2	125.00	S/ 38.50	S/ 4,812.50	
03.01.03.11	DERRAMES PARTE SUPERIOR MURO	ML	122.00	S/ 14.50	S/ 1,769.00	
03.01.03.12	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR VERDE	M2	108.30	S/ 22.50	S/ 2,436.75	
03.01.04	**ALBAÑILERIA**					**S/ 652.50**
03.01.04.01	FORJADO DE MEDIDORES DE LUZ (CORTE Y CONSTRUCCION DE NICHO)	UND	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00	
03.01.04.02	FORJADO DE MEDIDORES DE AGUA	UND	1.00	S/ 65.00	S/ 65.00	
03.01.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ALUMINIO EN CANTO DE ESCALERA	ML	17.00	S/ 12.50	S/ 212.50	
03.01.04.04	FORJADO DE TABLERO ELECTRICOS	UND	1.00	S/ 125.00	S/ 125.00	
03.01.05	**PISO DE CEMENTO**					**S/ 24,845.81**
03.01.05.01	CONTRAPISO DE 48 MM.	M2	584.96	S/ 32.50	S/ 19,011.20	
03.01.05.02	NIVELACION Y EMPAREJAMIENTO DE PISO PARA RECIBIR ACABADO PISO ESTRUCTURAL DE MADERA	M2	204.00	S/ 13.80	S/ 2,815.20	
03.01.05.03	SARDINELES CONCRETO F'C=140	M3	3.80	S/ 420.00	S/ 1,595.16	
03.01.05.04	SARDINELES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	37.98	S/ 37.50	S/ 1,424.25	
03.01.06	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**					**S/ 70.80**
03.01.06.01	NICHOS PARA VALVULAS	UND	1.00	S/ 35.60	S/ 35.60	
03.01.06.02	RESANE DE CAJAS DE PASE	UND	1.00	S/ 35.20	S/ 35.20	
03.01.07	**COBERTURAS**					**S/ 16,240.00**
03.01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO 1RA CAPA EN LOSA DE 2D NIVEL (NO INCLUYE IMPERMEAB	M2	224.00	S/ 72.50	S/ 16,240.00	
03.01.08	**ESTRUCTURA METALICAS**					**S/ 40,283.25**
03.01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2" x 2" CALIBRE N10, SE CONSIDERA ANGULO DE 1" X COLUMNA DE 2" X 2" X 2.5 MM, SE CONSIDERA QUE LA ALTURA DEL CERCO SE MANTENDRA EN 3 MT DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL SOBRECIMIENTO.	M2	233.00	S/ 98.50	S/ 22,950.50	
03.01.08.02	SUMINSITRO E INSTALACION DE CERCO METALICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 2" x 2" CALIBRE N10, SE CONSIDERA ANGULO DE 1" X COLUMNA DE 4" X 8" X 4.0 MM, SE CONSIDERA QUE LA ALTURA DEL CERCO SE MANTENDRA EN 4.5 MT DE ALTURA DESDE EL NIVEL SUPERIOR DEL SOBRECIMIENTO.	M2	169.10	S/ 102.50	S/ 17,332.75	

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 01/10/2025

04.00.00	ACABADOS					589,039.21
04.01.00	ENCHAPE DE CERAMICO EN PISOS Y MUROS					S/ 175,349.78
04.01.01	ENCHAPE DE CERAMICO EN PISOS	M2	335.60	S/ 125.20	S/ 42,017.12	
04.01.02	ENCHAPE DE CERAMICO EN MUROS	M2	414.20	S/ 125.00	S/ 51,775.00	
04.01.03	SUMINSITRO E INSTALACION DE PISO DE MADERA ESTRUCTURAL, SE CONSIDERA DESPERDICIO 10%	M2	224.40	S/ 339.57	S/ 76,199.51	
04.01.04	SUMINSITRO E INSTALACION DE ZOCALO SOBRE AREA DE PISO DE MADERA ESTRUCTURAL.	ML	145.80	S/ 36.75	S/ 5,358.15	
04.02.00	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS , GRIFERIAS Y TAPAS DE VALVULAS					S/ 4,333.00
04.02.01	TAPA PARA VALVULAS - PVC	UND.	12.00	S/ 35.00	S/ 420.00	
04.02.02	VARIOS PARA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (accesorios)	GLB	16.00	S/ 70.00	S/ 1,120.00	
04.02.03	VARIOS PARA INSTALACION DE GRIFERIA (accesorios)	UND	15.00	S/ 41.20	S/ 618.00	
04.02.04	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, SOLO MANO DE OBRA	UND	16.00	S/ 75.00	S/ 1,200.00	
04.02.05	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS, SOLO MANO DE OBRA	UND	15.00	S/ 65.00	S/ 975.00	
04.03.00	PINTURA Y REVESTIMIENTO					S/ 95,132.15
04.03.00	PINTURA 2 MANOS DE MUROS INTERIORES LATEX, PINTURA DURALATEX.	M2	492.03	S/ 30.50	S/ 15,006.85	
04.03.01	PINTURA 2 MANOS EN CIELO RASO,PINTURA DURALATEX.	M2	339.08	S/ 30.50	S/ 10,341.79	
04.03.02	PINTURA TEXTURADO FINO EN CIELO RASO INGRESO	M2	94.08	S/ 75.00	S/ 7,056.00	
04.03.03	MURO ACABADO PINTURA LÁTEX MATE COLOR GRIS OSCURO. RAL POR DEFINIR. VER MUESTRA EN OBRA.	M2	15.00	S/ 35.00	S/ 525.00	
04.03.04	REVESTIMIENTO TEXTUPRO TIPO MADERA	M2	131.09	S/ 85.20	S/ 11,169.17	
04.03.05	REVESTIMIENTO CON LADRILLO ROCOCHO DESTONALIZADO	M2	291.29	S/ 175.20	S/ 51,033.34	
04.04.00	COBERTURA EXTERIOR (CARPORT Y PERGOLA)					S/ 48,580.71
04.04.01	ESTRUCTURAS METALICAS EN COLUMNA Y PERGOLA	KG	2,352.14	S/ 16.20	S/ 38,104.68	
04.04.02	REVESTIMIENTO DE MADERA EN PERGOLA	M2	26.87	S/ 357.50	S/ 9,606.03	
04.04.03	VIGA DE DE DRYWALL ZONA DE NICHO PARILLA	GLB	1.00	S/ 870.00	S/ 870.00	
04.05.00	CARPINTERIA DE MELAMINA Y MADERA					S/ 39,302.25
04.05.01	MUEBLES DE COCINA EN MELAMINE BLANCO					
04.05.01.01	MUEBLE DE COCINA - BAJO	ML	7.75	S/ 950.00	S/ 7,362.50	
04.05.01.02	MUEBLE DE MESA DE COMEDOR - BAJO	ML	2.35	S/ 1,180.00	S/ 2,773.00	
04.05.01.03	MUEBLE DE COCINA - ALTO	ML	6.75	S/ 1,050.00	S/ 7,087.50	
04.05.02	CLOSETS - DISEÑO MODULAR SIN FONDO					
04.05.02.01	CLOSET DE PARED - DORMITORIO (incluye D.Serv.)	ML	20.05	S/ 880.00	S/ 17,644.00	
04.05.02.02	REVESTIMIENTO DE DRYWALL PARA CABECERA DE CLOSET, CONSIDERA ACABADO.	ML	20.05	S/ 165.00	S/ 3,308.25	
04.05.02.03	TIRADORES EN CLOSET	UND	46.00	S/ 24.50	S/ 1,127.00	
04.06.00	MUEBLES DE BAÑO					S/ 3,630.00
04.03.01	MUEBLE BAJO EN BAÑOS PRINCIPAL Y FAMILIAR	ML	6.60	S/ 550.00	S/ 3,630.00	
04.07.00	PUERTAS					S/ 20,250.00
02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION (0.75, 0.80, 0.90) X2.10. PUERTA DE MDF Y MARCO EN MADERA DE 4" X 1.5 " ACABADOS EN ENCHAPE DE MADERA	UND	15.00	S/ 1,350.00	S/ 20,250.00	
04.08.00	PANELES Y CERRAMIENTO					S/ 49,696.13
04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MOVIBLE 2DO NIVEL	UND	3.00	S/ 4,550.00	S/ 13,650.00	
04.08.02	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLO BAMBU 2DO NIVEL ZONA DE TERRAZA.	M2	23.70	S/ 325.00	S/ 7,702.50	
04.08.03	CERRAMIENTO EN ZONA DE BAÑO SEGUNDO NIVEL CON MURO CIEGO (LISTONES DE MADERA CON ESTRUCTURA DE FIERRO)	UND	10.00	S/ 125.00	S/ 1,250.00	
04.08.04	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLOR BAMBU 1ER NIVEL ZONA DE INGRESO.	M2	25.95	S/ 325.00	S/ 8,433.75	
04.08.05	COLOCACION DE CERRAMIENTO CON COLUMNAS DE MADERA EN ZONA DE FACHADA 1ER NIVEL.	UND	52.00	S/ 145.00	S/ 7,540.00	
04.08.06	REVESTIMIENTO DE MURO CON WALL PANEL TIPO COLOR BAMBU 1ER NIVEL ZONA DE HALL EXTERIOR BAÑO DE VIISITA.	M2	34.22	S/ 325.00	S/ 11,119.88	
04.09.00	TABLEROS					S/ 27,648.00
04.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN COCINA	ML	8.75	S/ 580.00	S/ 5,075.00	
04.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN BAÑOS	ML	7.60	S/ 580.00	S/ 4,408.00	
04.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA EN MESA DE COMEDOR DE DIARIO	ML	1.20	S/ 700.00	S/ 840.00	
04.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MELAMINE COLOR MADERA SEGÚN MUESTRA COMEDOR DE DIARIO.	ML	1.25	S/ 780.00	S/ 975.00	
04.09.05	REVESTIMIENTO CON PIEDRA SINTERIZADA SOBRE MUEBLE ZONA DE PARILLA	ML	5.80	S/ 1,250.00	S/ 7,250.00	
04.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SINTERIZADA BORDE PISCINA	ML	28.00	S/ 325.00	S/ 9,100.00	
04.10.00	VIDRIOS					S/ 93,366.19
04.10.01	VIDRIOS - CARPINTERIA DE ALUMINIO NEGRO					S/ 69,347.51
04.10.01.01	VIDRIO EN SISTEMA DE ALUMINIO NEGRO - MAMPARAS Y PUERTAS	M2	61.88	S/ 550.00	S/ 34,034.96	
04.10.01.02	VIDRIO EN SISTEMA DE ALUMINIO NEGRO - VENTANAS	M2	67.91	S/ 520.00	S/ 35,312.55	
04.10.02	BARANDA					S/ 24,018.68
04.10.02.01	VIDRIO EMBUTIDO BARANDA DE 10 MM (BARANDAS EN TERRAZAS EMBUTIDAS)	M2	18.26	S/ 520.00	S/ 9,497.28	
04.10.02.02	VIDRIO EMBUTIDO BARANDA DE 10 MM (BARANDAS EN JARDIN EMBUTIDAS)	M2	3.82	S/ 520.00	S/ 1,986.40	
04.10.02.03	BARANDA DE FIERRO NEGRO EN ESCALERA DE ACCESO DE 1ER NIVEL A 2DO NIVEL	ML	9.80	S/ 450.00	S/ 4,410.00	
04.10.02.04	BARANDA CON ESTRUCTURA DE FIERRO Y PAÑOS METALICOS SEGÚN DETALLE DE ARQUITECTURA	ML	6.50	S/ 1,250.00	S/ 8,125.00	
04.11.00	APARATOS SANITARIOS					S/ 6,129.10
04.11.01	INODOROS EN LOSA (se cotiza los insumos para instal y m.o)					S/ 3,118.90
05.01.01	INODORO ONE PIECE SETELLA BLANCO DE VAINSA3.6 LITROS	UND	5.00	S/ 583.12	S/ 2,915.59	
05.01.02	INODORO ARUBA DE ITALGRIF, INCLUYE PEDESTAL	UND	1.00	S/ 203.31	S/ 203.31	
04.11.02	LAVATORIO DE BAÑOS					S/ 1,920.20
04.11.02.01	LAVATORIO INCEPA/CELITE 505x370mm- BAJO ENCIMERA	PZ	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00	
04.11.02.02	LAVATORIO ARUBA CON PEDESTAL VALLARTA DE ITALGRIF	PZ	1.00	S/ 110.00	S/ 110.00	
04.11.02.03	LAVATORIO BOWL CR 35-350MM	PZ	1.00	S/ 310.20	S/ 310.20	
04.11.03	LAVADERO DE COCINA Y LAVANDERIA (se considera insumos silkaflex y m.o)					S/ 1,090.00
04.11.03.01	LAVADERO CUBETA LAVIÑA 40 BL-TRAMONTINA SATINADO 0.43x0.37x0.17m	PZA	2.00	S/ 545.00	S/ 1,090.00	
04.12.00	GRIFERIAS EN GENERAL					
04.12.01	GRIFERIA (se cotiza los insumos para instal, m.o y resanes)					S/ 4,321.91
04.12.01.01	GRIFERIA MONOCOMANDO ALTA MODELO KORBY, MARCA DELTA.	UND	6.00	S/ 340.20	S/ 2,041.20	
04.12.01.02	GRIFERIA ITALGRIF Grifo Monocomando Tahiti	UND	1.00	S/ 20.20	S/ 20.20	
04.12.01.03	MONOMANDO MEZCLADOR DE DUCHA MARCA DELTA MODELO KORBY CON BRAZO DE DUCHA DE 39CM MARCA DELTA Y CABEZA DE DUCHA CUADRADA DE 20CM MARCA DELTA	UND	5.00	S/ 180.40	S/ 902.00	
04.12.01.04	GRIFERIA ITALGRIF. DUCHA MONOCOMANDO TAHITI SALIDA TECNO	UND	1.00	S/ 450.20	S/ 450.20	
04.12.01.05	MONOCOMANDO DE COCINA CON CABEZAL EXTRAIBLE IN 938	UND	2.00	S/ 454.15	S/ 908.31	
04.13.00	EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES					S/ 21,300.00
04.13.01	EQUIPAMIENTO (PISCINA Y BOMBA DE AGUA)	GLB	1.00	S/ 12,800.00	S/ 12,800.00	
04.13.02	EQUIPAMIENTO (CAMARA DE DESAGUE)	GLB	1.00	S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 01/10/2025

05.00.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**					**S/ 31,399.00**
05.01.00	**SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION**					**S/ 14,861.41**
05.01.01	**SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION**					**S/ 1,647.50**
05.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 2"	PTO	15.00	S/ 62.50	S/ 937.50	
05.01.01.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 4"	PTO	8.00	S/ 74.20	S/ 593.60	
05.01.01.03	SALIDAS DE VENTILACION DE PVC SAP 2"	PTO	2.00	S/ 58.20	S/ 116.40	
05.01.02	**TUBERIAS ENTERRADAS**					**S/ 2,616.39**
05.01.02.01	TUBERÍA PVC C-P 2" ENTERRADA	ML	27.00	S/ 22.43	S/ 605.61	
05.01.02.02	TUBERÍA PVC C-P 4" ENTERRADA	ML	67.25	S/ 29.90	S/ 2,010.78	
05.01.03	**TUBERIAS ADOSADAS Y MONTANTES**					**S/ 2,147.54**
05.01.03.01	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 3"	ML	42.10	S/ 31.20	S/ 1,313.52	
05.01.03.02	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 4"	ML	22.30	S/ 37.40	S/ 834.02	
05.01.04	**TUBERIAS VENTILACION**					**S/ 880.40**
05.01.04.01	MONTANTE DE DESAGUE DE PVC 2"	ML	31.00	S/ 28.40	S/ 880.40	
05.01.05	**COLECTORES**					**S/ 2,073.60**
05.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIAS DE DESAGUE	ML	112.00	S/ 1.80	S/ 201.60	
05.01.05.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y RELLENO COMPACTO PARA TUBERIAS DE DESAGUE	ML	48.00	S/ 16.50	S/ 792.00	
05.01.05.03	CAMA DE APOYO MATERIAL FINO E=0.10 m	ML	48.00	S/ 22.50	S/ 1,080.00	
05.01.06	**CAJAS DE REGISTRO**					**S/ 2,100.00**
05.01.06.01	CAJAS DE REGISTRO DE 12"X24"	PZ	6.00	S/ 350.00	S/ 2,100.00	
05.01.07	**INSTALACIONES ESPECIALES DE DESAGUE**					**S/ 564.55**
05.01.07.01	INSTALACION DE DESAGUE EN CISTERNA INCLUYE REJILLAS	UND	1.00	S/ 564.55	S/ 564.55	
05.01.08	**PRUEBAS HIDRAULICAS**					**S/ 641.43**
05.01.08.01	PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTÍA	ML	142.21	S/ 1.10	S/ 156.43	
05.01.08.02	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CISTERNA	UND	1.00	S/ 485.00	S/ 485.00	
05.01.09	**VARIOS**					**S/ 2,190.00**
05.01.09.01	BRIDA ROMPEAGUA 4" CON PLATINA DE 1/4"	GLB	2.00	S/ 695.00	S/ 1,390.00	
05.01.09.02	PRUEBA DE ESTANQUIDAD DE CISTERNA	ML	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00	
05.02.00	**SISTEMA DE AGUA FRIA**					**S/ 14,654.34**
05.02.01	**SALIDAS DE AGUA FRIA**					**S/ 2,495.00**
05.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 1/2"	PTO	22.00	S/ 72.50	S/ 1,595.00	
05.02.01.02	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC DE 3/4"	PTO	12.00	S/ 75.00	S/ 900.00	
05.02.02	**REDES DE DISTRIBUCION AGUA FRIA**					**S/ 3,086.60**
05.02.02.01	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	UND	10.00	S/ 72.50	S/ 725.00	
05.02.02.02	VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	UND	24.00	S/ 98.40	S/ 2,361.60	
05.02.03	**TUBERÍAS COLGANTE**					**S/ 1,697.58**
05.02.03.01	TUBERÍA PVC C-10 - 2" EMPOTRADA	ML	11.20	S/ 58.60	S/ 656.32	
05.02.03.02	TUBERÍA PVC C-10 - 2 1/2" EMPOTRADA	ML	12.15	S/ 85.70	S/ 1,041.26	
05.02.04	**TUBERÍAS EMPOTRADAS**					**S/ 2,549.70**
05.02.04.01	TUBERÍA PVC C-10 - 1/2" EMPOTRADA	ML	45.00	S/ 24.50	S/ 1,102.50	
05.02.04.02	TUBERÍA PVC C-10 - 3/4" EMPOTRADA	ML	54.00	S/ 26.80	S/ 1,447.20	
05.02.05	**TUBERÍAS ADOSADAS**					**S/ 3,936.46**
05.02.05.01	TUBERÍA PVC C-10 - 2" EMPOTRADA	ML	46.40	S/ 65.60	S/ 3,043.84	
05.02.05.02	TUBERÍA PVC C-10 - 3/4" ADOSADA	ML	26.10	S/ 34.20	S/ 892.62	
05.02.06	**INSTALACIONES ESPECIALES DE AGUA FRIA**					**S/ 565.00**
05.02.06.01	INSTALACION DE AGUA FRIA DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 145.00	S/ 145.00	
05.02.06.02	INSTALACION DE AGUA CONTRA INCENDIO DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 170.00	S/ 170.00	
05.02.06.03	CONEXION EXTERIOR DE AGUA FRIA (EMPALME)	GLB	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00	
05.02.07	**PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE AGUA FRIA**					**S/ 324.00**
05.02.07.01	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE AGUA FRIA	ML	120.00	S/ 2.70	S/ 324.00	
05.03.00	**SISTEMA DE AGUA CALIENTE**					**S/ 1,883.26**
05.03.01	**SALIDAS DE AGUA CALIENTE**					**S/ 580.00**
05.03.01.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE CPVC	PTO	8.00	S/ 72.50	S/ 580.00	
05.03.02	**REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE**					**S/ 833.08**
05.03.02.01	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA CPVC D=1/2"	ML	15.00	S/ 23.40	S/ 351.00	
05.03.02.02	RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA CPVC D=3/4"	ML	18.40	S/ 26.20	S/ 482.08	
05.03.03	**PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE**					**S/ 90.18**
05.03.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES DE AGUA CALIENTE	ML	33.40	S/ 2.70	S/ 90.18	
05.03.04	**OTROS**					**S/ 380.00**
05.05.01	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA	UND	1.00	S/ 380.00	S/ 380.00	
06.00.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**S/ 65,206.42**
06.01.00	**ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES**					**S/ 11,097.21**
06.01.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	45.00	S/ 55.21	S/ 2,484.45	
06.01.02	SALIDA DE TOMACORRIENTES	UND	59.00	S/ 55.21	S/ 3,257.39	
06.01.03	SALIDA PARA CALENTADOR ELÉCTRICO	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21	
06.01.04	SALIDA PARA LUMINARIAS	UND	94.00	S/ 55.21	S/ 5,189.74	
06.01.05	SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21	
06.01.06	SALIDA PARA TIMBRE	UND	1.00	S/ 55.21	S/ 55.21	
06.02.00	**SALIDAS CAJA Y TUBERIA**					**S/ 487.50**
06.02.01	SALIDA PARA TV-CABLE	UND	4.00	S/ 48.75	S/ 195.00	
06.02.02	SALIDA PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA	UND	5.00	S/ 48.75	S/ 243.75	
06.02.03	SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PORTERO	UND	1.00	S/ 48.75	S/ 48.75	
06.03.00	**SALIDAS DE FUERZA (ENTUBADO Y CABLEADO)**					**S/ 468.34**
06.03.01	SALIDA PARA BOMBA PISCINA	UND	1.00	S/ 150.00	S/ 150.00	
06.03.02	SALIDA PARA BOMBA DE AGUA	UND	1.00	S/ 145.00	S/ 145.00	
06.03.03	SALIDA PARA TABLERO PISCINA	UND	1.00	S/ 88.34	S/ 88.34	
06.03.04	SALIDA PARA TABLERO GENERAL	UND	1.00	S/ 85.00	S/ 85.00	
06.04.00	**SISTEMA DE PUESTA ATIERRA**					**S/ 6,851.10**
06.04.01	POZO A TIERRA	UND	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
06.04.02	EXCAVACION DE ZANJA PARA MALLA DE 0.6x0.4m – SE CONSIDERA EN M3	ML	25.00	S/ 50.88	S/ 1,272.00	
06.04.03	FAVIGEL O CEMENTO CONDUCTIVO ALREDEDOR DEL CABLE DE COBRE DESNUDO DE LA MALLA –SE CONSIDERA BOLSA CEMENTO CONDUCTIVO	M3	8.50	S/ 125.20	S/ 1,064.20	
06.04.04	RELLENO DE ZANJA CON TIERRA DE CHACRA	M3	14.10	S/ 107.44	S/ 1,514.90	
06.05.00	**ENTUBADO DE MEDIDOR A CAJA MONTANTE ELECTRICA**					**S/ 3,008.95**
06.05.01	CANALIZACION ELECTRICA	UND	5.00	S/ 301.79	S/ 1,508.95	
06.05.02	CAJAS DE PASE	UND	6.00	S/ 250.00	S/ 1,500.00	
06.06.00	**CABLEADO**					**S/ 1,809.23**
06.06.01	CANALIZADO Y CABLEADO PARA EL SISTEMA DE TV-CABLE EMPOTRADO EN PISO - 25mmØ PVC-P SALVO INDICACION.	ML	48.00	S/ 22.50	S/ 1,080.00	

RESUMEN DESAGREGADO : VIVIENDA UNIFAMILIAR

ATENCION: NICOLA ZLOSILO - TITA FERREYRA
UBICACIÓN : CONDOMINIO HARAS - LA MOLINA
SERVICIO : CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA HARAS
CONTRATISTA: ALTO STUDIO SAC
RUC: 20555558776
FECHA: 01/10/2025

06.06.02	CANALIZADO Y CABLEADO TUBERIA PARA SISTEMA DE TELEFONIA EMPOTRADO EN TECHO O PARED 25mmØ PVC SAP SALVO INDICACION.	ML	32.41	S/ 22.50	S/ 729.23	
06.07.00	**CAJAS DE PASE (INCLUYE PICADO , ENTUBADO Y CABLEADO)**					**S/ 1,274.43**
06.07.01	1 - CAJA DE PASO 150X150X100mm	UND	5.00	S/ 55.41	S/ 277.05	
06.07.02	2 - CAJA DE PASO 200X200X100mm	UND	10.00	S/ 55.41	S/ 554.10	
06.07.03	3 - CAJA DE PASO 300X300X100mm	UND	8.00	S/ 55.41	S/ 443.28	
06.08.00	**MONTAJE DE EQUIPOS Y PLACAS ELECTRICAS**					
06.08.01	ALIMENTADORES, TABLEROS					**S/ 15,695.10**
06.08.01.01	ALIMENTADOR TABLERO TDG / TF-P1 3-1X6 mm2 N2XOH+1X6mm2 (T)NH-80	ML	218.40	S/ 27.48	S/ 6,001.63	
06.08.01.02	ALIMENTADOR LUMINARIAS 3-1X10 mm2 N2XOH+1X10mm2 (T)NH-80	ML	195.10	S/ 36.33	S/ 7,087.98	
06.08.01.03	ALIMENTADOR TOMACORRIENTES 3-1X10 mm2 N2XOH+1X10mm2 (T)NH-80	ML	35.41	S/ 36.33	S/ 1,286.45	
06.08.01.04	ALIMENTADOR TABLERO CUARTO DE BOMBAS 3-1X6 mm2 N2XOH+1X6mm2 (T)NH-80	ML	48.00	S/ 27.48	S/ 1,319.04	
06.08.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (Se enviara según plano unifilar plano mecanico para su ejecucion previa aprobacion de la supervision) ITM Y DIF son marca schneider semi industrial.					**S/ 14,802.77**
06.08.02.01	TABLERO TG-B	UND	1.00	S/ 9,043.63	S/ 9,043.63	
06.08.02.02	TABLERO CUARTO DE BOMBAS	UND	1.00	S/ 2,859.14	S/ 2,859.14	
06.08.02.03	TABLERO DE PISCINAS	UND	1.00	S/ 2,900.00	S/ 2,900.00	
06.09.00	**PRUEBAS ELECTRICAS**					**S/ 9,711.79**
06.09.01	PRUEBAS ELECTRICAS, ARRANQUE Y PUESTA EN SERVICIO (INCLUYE MEDICION ARMANICOS EN TABLEROS/ NIVEL DE LUX/ ESTUDIO TERMICO TABLEROS/ BALANCEO DE CARGA/ETC)	GLB	1.00	S/ 4,151.02	S/ 4,151.02	
06.09.02	PRUEBAS Y MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ALIMENTADORES Y DERIVADOS	Glb	1.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	
06.09.03	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES (TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, CINTA AISLANTE, CINTILLOS, TERMINALES TIPO TUBULAR Y OJAL, MANGA TERMOCONTRAIBLE, TAPA CIEGAS, BORNERAS, SEÑALIZACIONES, STICKERS, OTROS).	Glb	1.00	S/ 3,160.77	S/ 3,160.77	
	SUB TOTAL					**S/ 1,340,827.49**
	GASTOS GENERALES - UTILIDADES		12%			S/ 160,899.30
	SUB TOTAL					**S/ 1,501,726.79**
	IGV		18%			S/ 270,310.82
	CSOTO TOTAL					**S/ 1,772,037.61**

Pedro Luis Valverde Nima
Ingeniero Civil
CIP. 292673

GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPICION	UND	CANTIDAD	PU	PRECIO (S/.)
1	GASTOS GENERALES (6%)				
1.1	OBRA				
1.1.1	Ingeniero Residente De Obra	Mes	6.00	S/ 4,500.00	S/ 27,000.00
1.1.4	Prevencionista De Seguridad De Obra	Mes	6.00	S/ 2,800.00	S/ 16,800.00
1.1.5	Almacenero	Mes	6.00	S/ 1,500.00	S/ 9,000.00
1.1.6	Maestro De Obra General	Mes	6.00	S/ 3,500.00	S/ 21,000.00
1.2	EQUIPAMIENTO DE OFICINA (MOBILIARIO PARA OFICINA)				
1.2.1	Computadoras	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.2.2	Impresoras	Glb	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
1.2.4	Internet	Mes	6.00	S/ 35.00	S/ 210.00
1.2.5	Equipamiento De Oficina (Mobiliario Para Oficina)	Und	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
1.3	VARIOS				S/ 0.00
1.3.1	Útiles De Escritorio Y Papelería	Mes	1.00	S/ 250.00	S/ 250.00
1.3.2	Accesorios Para Equipos De Cómputo	Mes	1.00	S/ 120.00	S/ 120.00
1.3.3	Útiles De Limpieza	Mes	1.00	S/ 200.00	S/ 200.00
1.3.4	Fotocopias Y Ploteos	Mes	1.00	S/ 150.00	S/ 150.00
1.3.5	Trámites Varios Y Entregables: Visita Notarial A Vecinos, Contrato De Person	Glb	1.00	S/ 100.00	S/ 100.00
1.3.6	Ploteo De Planos Para Obra Y Contrato	Glb	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00
1.4	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CALIDAD				
1.4.1	Implementación De Plan De Calidad Y Dossier	Glb	1.00	S/ 2,619.65	S/ 2,619.65
					S/ 80,449.65
2	UTILIDAD (6%)				
2.1	UTILIDAD DE OBRA	GLB	1.00	S/ 80,449.65	S/ 80,449.65
					S/ 80,449.65
	COSTO DIRECTO				S/ 160,899.30
	% DE GASTOS GENERALES (RESPECTO AL COSTO DIRECTO)				12.00%

Pedro Luis Yarleque Nima
Ingeniero Civil
CIP. 292873

CEIBOS ARQUITECTOS

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE LA UNIDAD INMOBILIARIA N°12

MEMORIA DESCRIPTIVA

I.- GENERALIDADES:

- UBICACIÓN:

La Unidad Inmobiliaria N° 12 se encuentra dentro del Condominio Kusi Wasi el cual se encuentra ubicado en Alameda Manuel Prado Ugarteche N° 470 Urb. Rinconada Baja en el Distrito de la Molina, teniendo como vías principales: (i) Alameda del Corregidor, (ii) Calle 7/Avenida La Molina.

- AREA:

La Unidad Inmobiliaria N° 12 tiene un área registrada de 703.93m2 con partida N° 14046330 y se proyecta una casa de 393.55 m2 techados.

- ENTORNO:

El proyecto se ubica en una excelente zona Residencial, teniendo en las cercanías zonas recreativas, como parques y zona comercial como centros comerciales.

II.- PROPUESTA DEL PROYECTO:

La vivienda plantea una arquitectura que, por mejora funcional, separa las áreas sociales, recreativas, privadas y de servicio en distintos niveles y volúmenes que componen la edificabilidad.
La calidad del diseño se presenta desde el ingreso al proyecto hasta el último detalle de los ambientes, generando así un espacio acogedor y moderno para satisfacer todas las necesidades de sus usuarios.
El proyecto cumple los lineamientos normativos del certificado de parámetros y de RNE.

- **CONCEPTO Y MOTIVACIÓN:**

El concepto de la vivienda es generar un proyecto de vivienda moderna de 2 niveles, un primer y segundo piso; que se incorpore a la naturaleza del entorno y preste especial atención en los materiales y detalles.

Este proyecto resalta no solo por el diseño de la edificación sino también por su excelente distribución, haciendo de este proyecto atractivo tanto funcional como formalmente.

III.-DESCRPCIÓN DE LOS AMBIENTES:

Primer nivel: se dispone en los siguientes ambientes:

La vivienda al estar dentro de un condominio no tiene muro de cerco, a la que se accede mediante una losa de concreto enchapada con piedra tipo Talamolle desde la vía interior del condominio que se encuentra a 0.00 y una plaza exterior del mismo material, que se encuentra a - 0.70m.

La puerta de ingreso es de carpintería PVC con cierre hermético, el Hall de doble altura tiene un piso de madera Shihuahuaco de 0.20x1.20m flotante acabado con Barathane natural y zócalo de madera de 10cm. Adjunto a este espacio esta la escalera metálica color grafito con pasos de madera volados, que lleva al 2do nivel donde está el área íntima de la vivienda.

Al lado de la escalera en el 1er nivel se encuentra el Estudio y una jardinera, seguido de unos escalones los cuales nos llevan al baño de visita y a la sala, la cual tiene vista a la terraza exterior. Este ambiente está al costado del comedor principal, y ambos tienen piso de Madera Shihuahuaco de 0.20x1.20m flotante acabado con Barathane natural y zócalo de madera de 10cm. La mampara es de carpintería PVC con cierre hermético y vidrio templado, los muros laterales son pintados color blanco Todo el 1er nivel tiene una altura interna de 3m y se encuentra a -1.05m con respecto a la vía de ingreso al lote.

El comedor se ilumina por 2 lados, por la mampara de la terraza y por un patio interior central, que da iluminación también a la cocina, al comedor de diario y a la escalera de acceso al 2do piso.

La cocina está al lado del comedor se ingresa por dos puertas vaivén de madera; una de las cual da a la sala y otra hacia el comedor. Tiene una isla de piedra sinterizada la cual funciona como comedor de diario. Todos los muebles de la cocina son de melamina tropical de 18mm al interior y los frentes de MDF de 18mm acabado poliuretano y enchape de madera. El tablero será de piedra sinterizada color negro de 12mm y el back splash de 6mm (ente los muebles), el piso es de porcelanato importado antideslizante de 0.60x0.60m.

A continuación de la cocina se ubica el área de servicio, donde se proyecta el Dormitorio de Servicio con baño incorporado y la Lavandería que cuenta con un acceso secundario desde y hacia el Garage.

Desde la cocina se tiene una mampara hacia un jardín japones en el exterior el cual te conduce hacia la terraza exterior, acá se tiene un área destinada para una parrilla de acero con un lavacopas y mueble bajo para guardar cosas. La piscina tiene profundidad variada; cuenta con el sistema recirculante y agua temperada; y esta revestida con porcelanato. Atrás de la zona techada de la terraza se tiene un servicio higiénico completo para uso de visita y piscina y un depósito.

El área restante del terreno no construido es jardín que tiene vegetación apta para la zona y cuenta con iluminación de tipo estacas.

Segundo nivel:

Este nivel se desarrolla a +2.25m con respecto a la vía de ingreso y se accede a través de la escalera principal metálica que se encuentra en el ingreso de la vivienda. Esta nos lleva a un puente el cual separa un closet del área de dormitorios. El área de dormitorios esta precedida por un estar, el cual cuenta iluminación natural.

Sobre el lado interior del predio y con vista al jardín interno se proyecta el dormitorio principal, al cual se accede a través de un pasillo donde se tiene un closet para ropa blanca. El dormitorio principal tiene una iluminación natural mediante una mampara que da a un balcón con vista al jardín posterior, al lado del dormitorio se tiene el walking closet. El baño principal completo se encuentra al final del dormitorio y tiene un tablero con dos lavatorios, área para ducha y área para inodoro.

Los Dormitorios Secundarios (2), ambos con Madera Shihuahuaco flotante de 0.20x1.20m y zócalo de Madera Shihuahuaco de 0.10 de alto todo con acabado en Barathane natural, cuentan con su closets respectivo y el baño incorporodado, estos están enchapados con porcelanato importado de 60x60 antideslizante en piso y de 0.30x0.60m en pared, se enchapan las paredes de piso a techo, los tableros son con piedra sinterizada de 12mm, aparatos sanitarios de cerámica color blanco, y grifería importada de acero inoxidable color negro según el uso.

Los muebles de baño son en melamina tropical interior de 18mm, y los frentes son de madera.
Los closets tienen una o 2 cajoneras según el área, con repisas en la parte superior y tubo colgador en 2 niveles.

Todas las luminarias son de empotrar con placas eléctricas importadas en color negro mate.
Todos los dormitorios, así como la cocina, el estar, salón y sala. tienen punto para tv e intercomunicador.

Los closets tienen punto eléctrico para deshumecedor.
Se ha considerado en los dormitorios y en el estar aire acondicionado.


Toda la carpintería de vidrio es de PVC hermética con vidrio templado.

Las puertas son de madera natural y como acondicionamiento interno se va a considerar paredes enchapadas en madera en algunas zonas.

Fachada:

La materialidad de esta va a estar compuesta por muros de concreto expuesto de encofrado formato 1.20 x 0.60, y ladrillo rococho envejecido; reducidas áreas de pintura, carpintería de vidrios hermética de primera calidad y resaltado por un proyecto de iluminación ambiental.

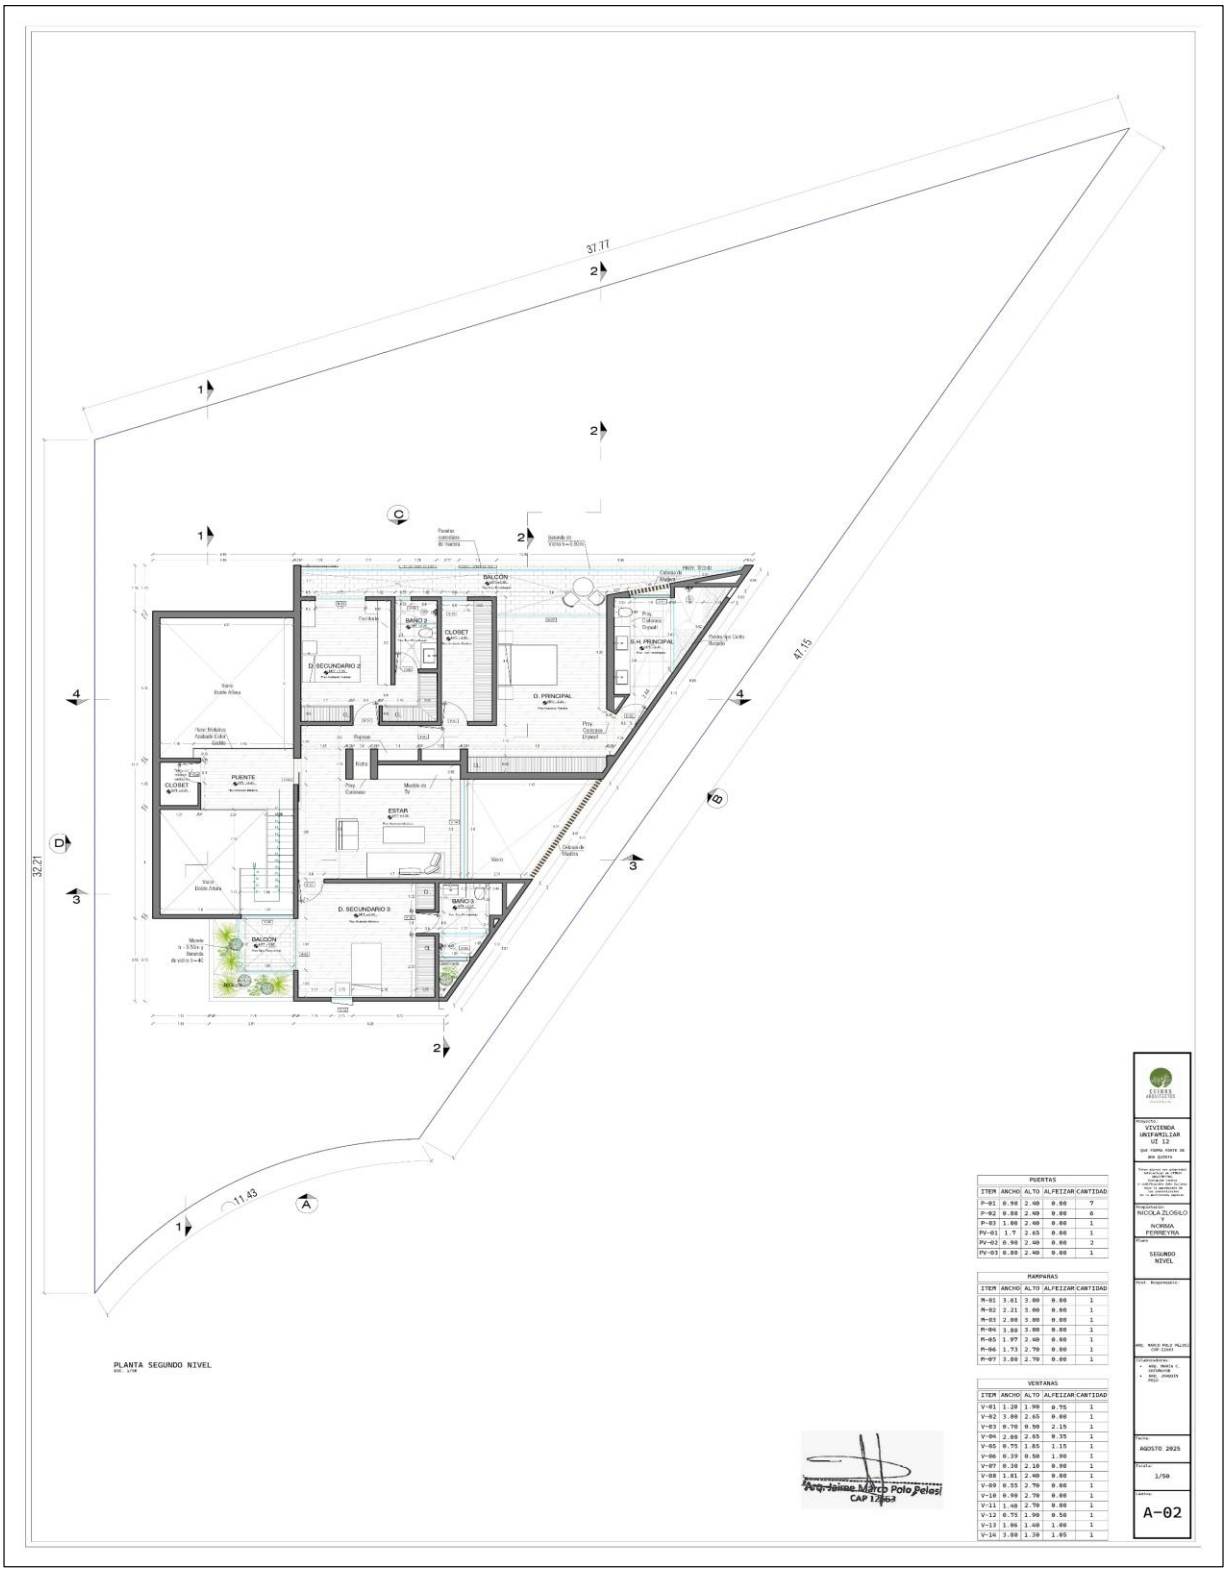
En su conjunto es una casa donde su atractivo se basa en su arquitectura misma y en los materiales que se proyectan a manera de detalle.

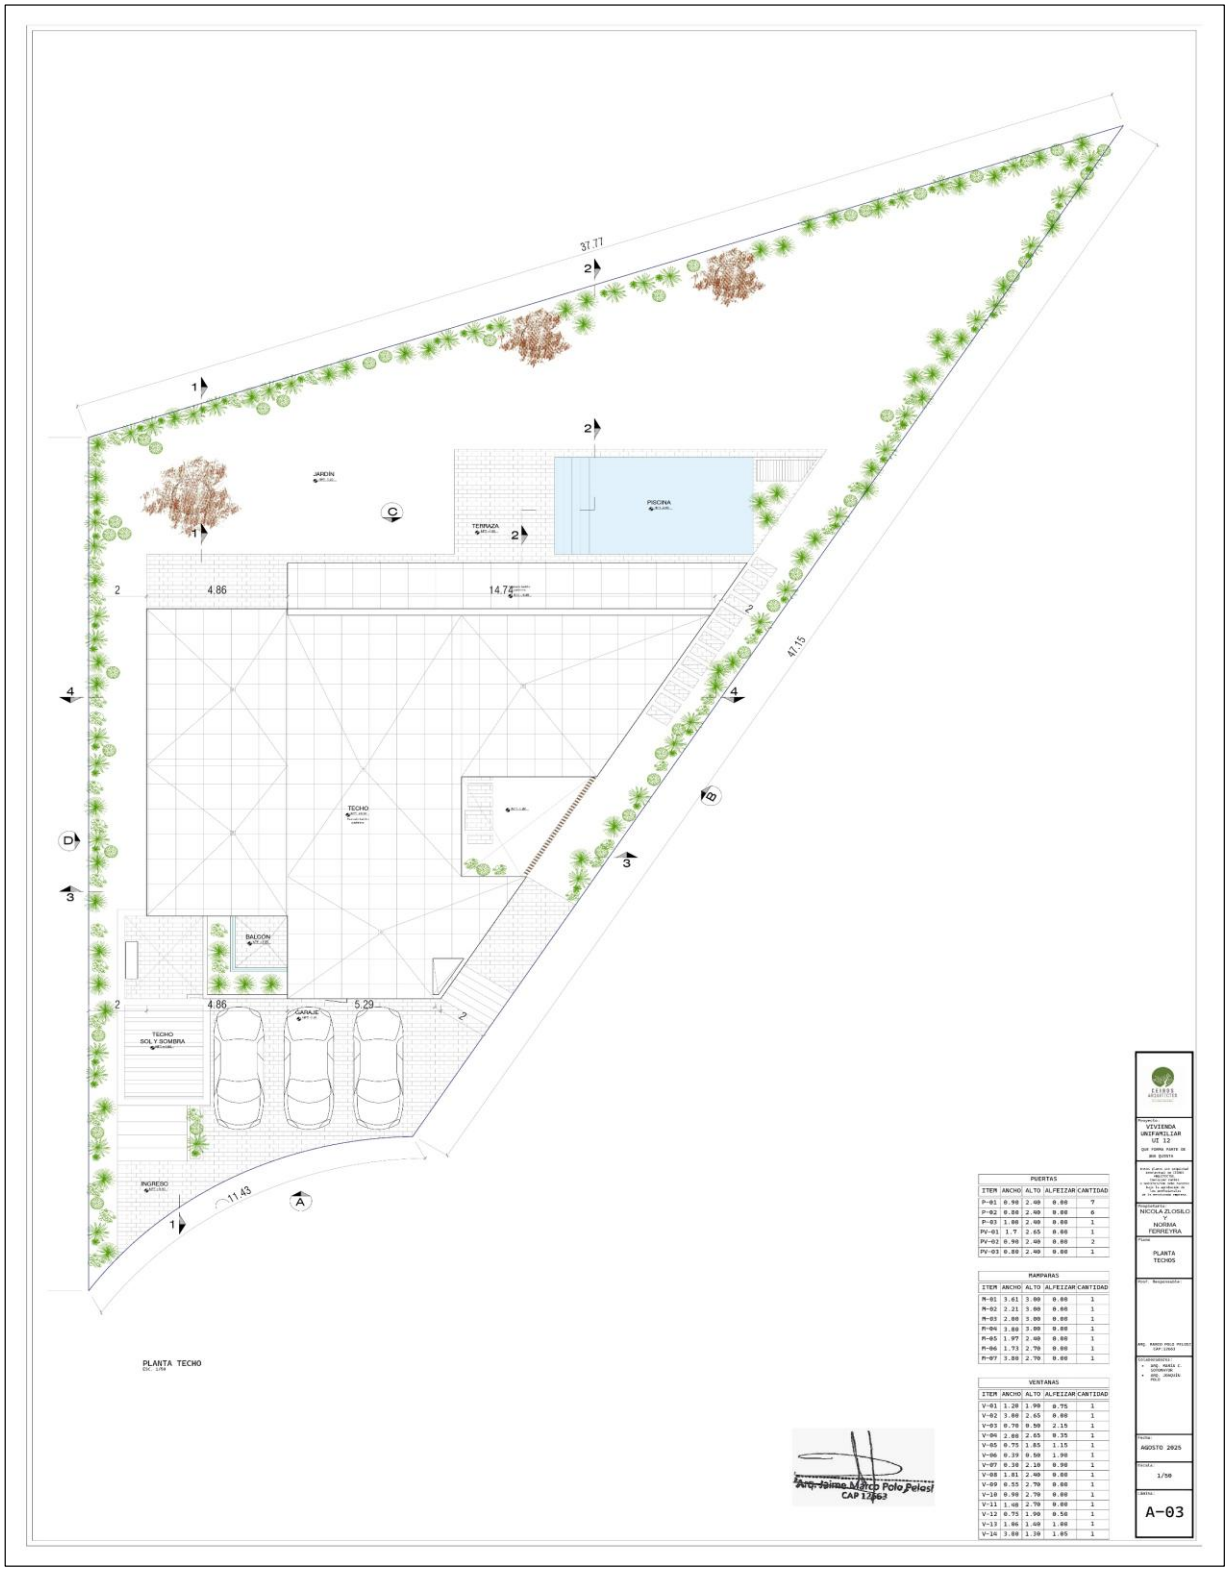


CAP 12663

CEIBOS ARQUITECTOS


PLANTA PRIMER NIVEL
JARDIN
TERRAZA
PISCINA
SALA
COMEDOR
TERRAZA TECHADA
DEPOSITO
BAÑO
COCINA
JARDIN JAPONES
HALL
LAVANDERIA
DORM. SERVICIO
ESTUDIO
PLAZA
GARAJE
INGRESO
PUERTAS
MAMPARAS
VENTANAS
VIVIENDA UNIFAMILIAR UI 12
AGOSTO 2025
1/50
A-01


37.77
47.15
32.21
11.43
BALCON
BAÑO 2
CLOSET
D. SECUNDARIO 2
S.H. PRINCIPAL
D. PRINCIPAL
PUENTE
ESTAR
BAÑO 3
D. SECUNDARIO 3
BALCON
PLANTA SEGUNDO NIVEL
PUERTAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
P-01 0.90 2.40 0.00 7
P-02 0.80 2.40 0.00 6
P-03 1.00 2.40 0.00 1
PV-01 1.7 2.65 0.00 1
PV-02 0.90 2.40 0.00 2
PV-03 0.80 2.40 0.00 1
MAMPARAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
M-01 3.61 3.00 0.00 1
M-02 2.21 3.00 0.00 1
M-03 2.80 3.00 0.00 1
M-04 1.80 3.00 0.00 1
M-05 1.97 2.40 0.00 1
M-06 1.73 2.70 0.00 1
M-07 3.80 2.70 0.00 1
VENTANAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
V-01 1.20 1.90 0.75 1
V-02 3.00 2.65 0.00 1
V-03 0.70 0.50 2.15 1
V-04 2.80 2.65 0.35 1
V-05 0.75 1.85 1.15 1
V-06 0.30 0.50 1.90 1
V-07 0.30 2.10 0.30 1
V-08 1.81 2.40 0.00 1
V-09 0.55 2.70 0.00 1
V-10 0.90 2.70 0.00 1
V-11 1.40 2.70 0.00 1
V-12 0.75 1.90 0.50 1
V-13 1.06 1.40 1.00 1
V-14 3.60 1.30 1.05 1
Arq. Jaime Marco Polo Pelosi
CAP 17868
VIVIENDA UNIFAMILIAR VE 12
NICOLA ZLOBILO Y NORMA FERREYRA
SEGUNDO NIVEL
AGOSTO 2025
1/50
A-02


31.77
47.15
11.43
4.86
14.74
5.29
JARDÍN
PISCINA
TERRAZA
TECHO
BALCÓN
GARAJE
TECHO SOL Y SOMBRA
INGRESO
PLANTA TECHO
PUERTAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
P-01 0.90 2.40 0.00 7
P-02 0.80 2.40 0.00 6
P-03 1.00 2.40 0.00 1
PV-01 1.7 2.65 0.00 1
PV-02 0.90 2.40 0.00 2
PV-03 0.80 2.40 0.00 1
MAMPARAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
M-01 3.61 3.00 0.00 1
M-02 2.21 3.00 0.00 1
M-03 2.00 3.00 0.00 1
M-04 3.80 3.00 0.00 1
M-05 1.97 2.40 0.00 1
M-06 1.73 2.70 0.00 1
M-07 3.80 2.70 0.00 1
VENTANAS
ITEM ANCHO ALTO ALFEIZAR CANTIDAD
V-01 1.20 1.90 0.75 1
V-02 1.80 2.65 0.00 1
V-03 0.70 0.50 2.15 1
V-04 2.80 2.65 0.35 1
V-05 0.75 1.85 1.15 1
V-06 0.30 0.50 1.90 1
V-07 0.30 2.10 0.90 1
V-08 1.81 2.40 0.00 1
V-09 0.55 2.70 0.00 1
V-10 0.90 2.70 0.00 1
V-11 1.40 2.70 0.00 1
V-12 0.75 1.90 0.50 1
V-13 1.06 1.40 1.00 1
V-14 3.80 1.30 1.05 1
Arq. Raissa Marco Polo Pelaez
CAP 12345
VIVIENDA UNIFAMILIAR UI 12
NICOLA ZLOSILO Y NORMA FERREYRA
PLANTA TECHOS
AGOSTO 2025
1/50
A-03


ELEVACIÓN A
ELEVACIÓN B
A-04


ELEVACIÓN C
ELEVACIÓN D
A-05


CORTE 1-1
CORTE 2-2
NTT +6.30
NPT +2.25
NPT +0.00
NPT -0.70
NPT -1.05
TERRAZA
SALA
HALL
PLAZA
INGRESO
BALCÓN
DORMITORIO PRINCIPAL
ESTAR
BAÑO 3
TERRAZA TECHADA
COCINA
LAVANDERIA
PISCINA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MZ 13
LOTE 12
MÚSICA ZLOBILO
NORMA FARFÁN YIA
AGOSTO 2025
1/50
A-06


CORTE 3-3
CORTE 4-4
NTT +6.30
NPT +2.25
NPT +0.00
NPT -0.70
NPT -1.05
ESTAR
COCINA
JARDÍN JAPONÉS
DORMITORIO PRINCIPAL
WCL
DORMITORIO 2
DEPÓSITO
TERRAZA TECHADA
COMEDOR
SALA
VIVIENDA UNIFAMILIAR
MZ 13
LOTE 12
MÚSICA ZLOBILO
NORMA FARFÁN YIA
AGOSTO 2025
1/50
A-07

Re: [External] CONSTRUYO PRIMER TRAMO 260406693 - NICOLA DAVID ZLOSILO TOSO

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

JD

JULIO DENNIS PALOMINO YARASCA <julio.palomino@bbva.com>

vie 22/05/2026 11:35

Para EDUARDO MAURICIO VIZCARRA LOAYZA; Revisión

CC GUISELLA HILDA ALPACA GUERRERO; EMILIO BARUA ZARRIA; JOSE LUIS CANALES BERNAL; TU TASACIÓN BBVA (BZG15005); To: Rodrigo Zapata; YSELA LORENA GUTIERREZ VELIZ; NICOLE MELISSA TORRES PAUCAR

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Hola Eduardo

La tasadora se encuentra revisando el caso, hoy debemos tener respuesta al respecto.

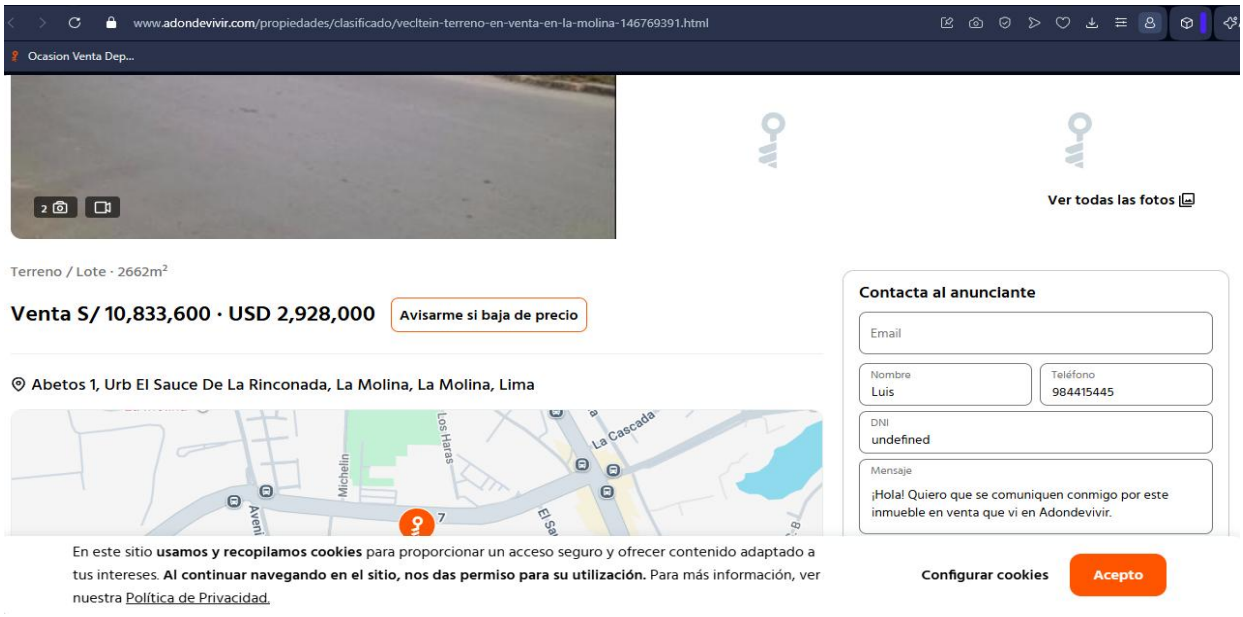
Como sabes este caso mantiene discrepancias de fondo que excepcionalmente vamos a dar nuestro VB para proceder siempre que la documentación este completa y guarde relación en base a lo acordado.

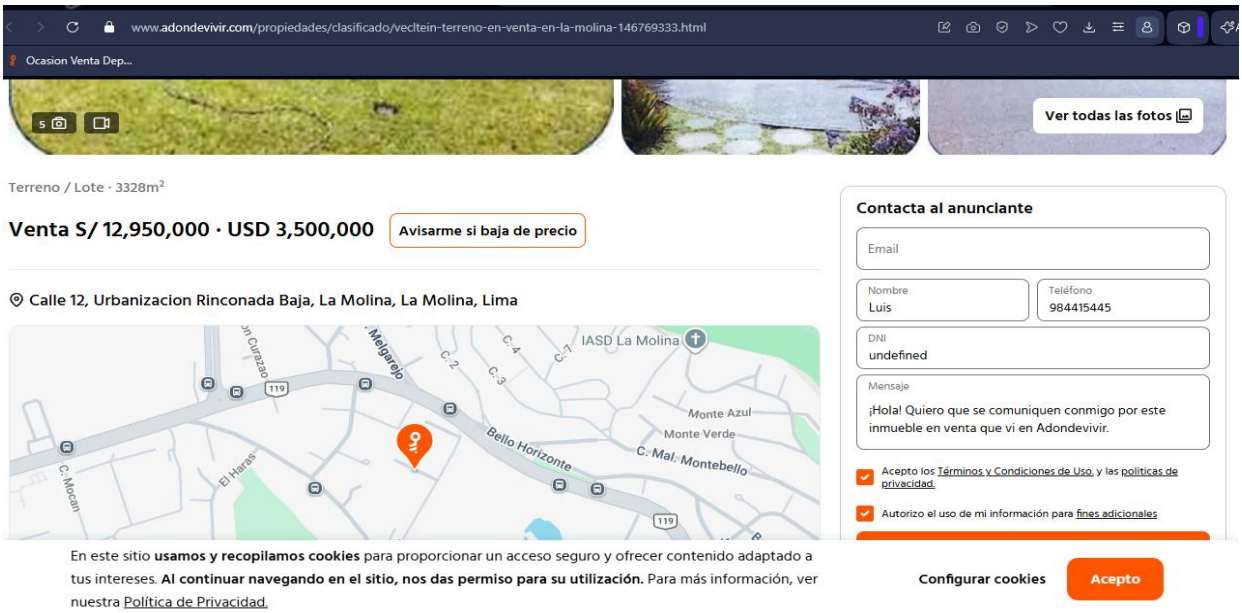
@Revisión Quedamos atentos al resultado de su revisión, sobre lo comentado de tener un informe solo sobre una parte del inmueble siendo un construyo, damos nuestro VB excepcional.

Saludos

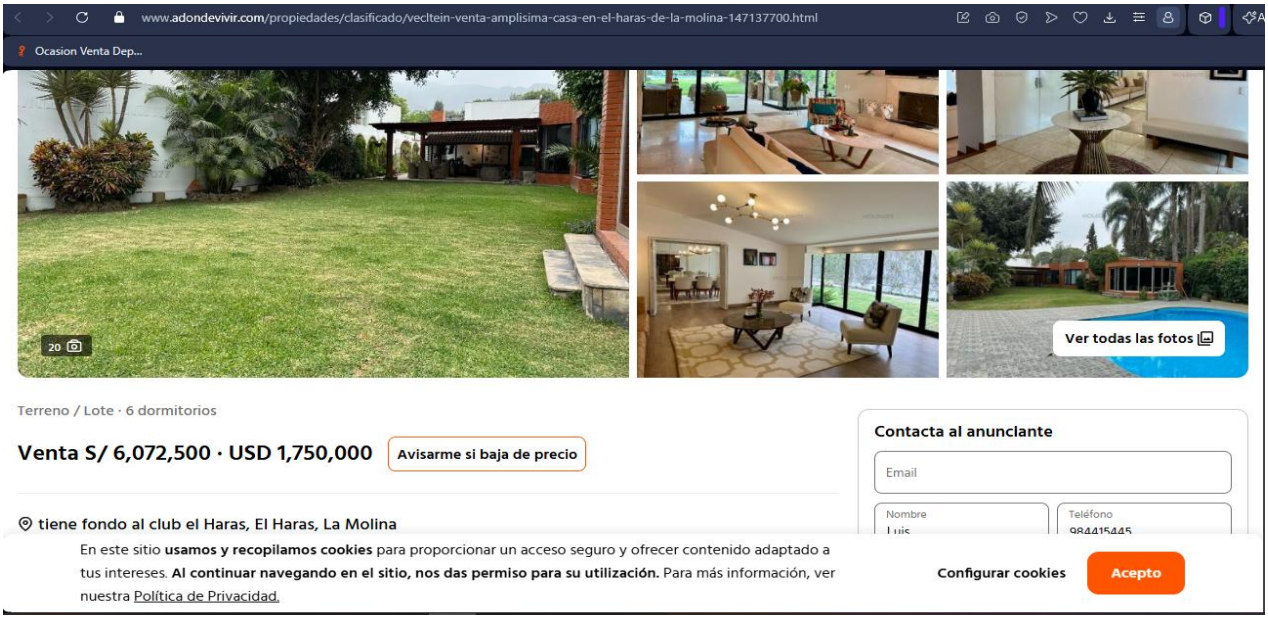
OperacIOnes
Somos inteligencia operacional

Julio Palomino
Manager - Garantías
#unstoppable team
Celular 967 761 916
Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima.


www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/vecltein-terreno-en-venta-en-la-molina-146769391.html
Ocasion Venta Dep...
2
Ver todas las fotos
Terreno / Lote · 2662m²
Venta S/ 10,833,600 · USD 2,928,000
Avisarme si baja de precio
Abetos 1, Urb El Sauce De La Rinconada, La Molina, La Molina, Lima
Los Haras
La Cascada
Michelin
Contacta al anunciante
Email
Nombre
Luis
Teléfono
984415445
DNI
undefined
Mensaje
¡Hola! Quiero que se comuniquen conmigo por este inmueble en venta que vi en Adondevivir.
En este sitio usamos y recopilamos cookies para proporcionar un acceso seguro y ofrecer contenido adaptado a tus intereses. Al continuar navegando en el sitio, nos das permiso para su utilización. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.
Configurar cookies
Acepto


www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/vecltein-terreno-en-venta-en-la-molina-146769333.html
Ocasion Venta Dep...
5
Ver todas las fotos
Terreno / Lote · 3328m²
Venta S/ 12,950,000 · USD 3,500,000
Avisarme si baja de precio
Calle 12, Urbanizacion Rinconada Baja, La Molina, La Molina, Lima
IASD La Molina
Melgarejo
Monte Azul
Monte Verde
Bello Horizonte
C. Mal. Montebello
El Haras
C. Mocan
Contacta al anunciante
Email
Nombre
Luis
Teléfono
984415445
DNI
undefined
Mensaje
¡Hola! Quiero que se comuniquen conmigo por este inmueble en venta que vi en Adondevivir.
Acepto los Términos y Condiciones de Uso, y las políticas de privacidad.
Autorizo el uso de mi información para fines adicionales
En este sitio usamos y recopilamos cookies para proporcionar un acceso seguro y ofrecer contenido adaptado a tus intereses. Al continuar navegando en el sitio, nos das permiso para su utilización. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.
Configurar cookies
Acepto


www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/vecltein-venta-casa-a-precio-de-terreno.-urb.-el-haras-de-la-146063031.html
Ocasion Venta Dep...
Ver todas las fotos
Terreno / Lote · 5 dormitorios
Venta S/ 10,291,499 · USD 2,965,850
Avisarme si baja de precio
Contacta al anunciante
Email
En este sitio usamos y recopilamos cookies para proporcionar un acceso seguro y ofrecer contenido adaptado a tus intereses. Al continuar navegando en el sitio, nos das permiso para su utilización. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.
Configurar cookies
Acepto


www.adondevivir.com/propiedades/clasificado/vecltein-venta-amplisima-casa-en-el-haras-de-la-molina-147137700.html
Ocasion Venta Dep...
Ver todas las fotos
Terreno / Lote · 6 dormitorios
Venta S/ 6,072,500 · USD 1,750,000
Avisarme si baja de precio
Contacta al anunciante
Email
Nombre
Teléfono
tiene fondo al club el Haras, El Haras, La Molina
En este sitio usamos y recopilamos cookies para proporcionar un acceso seguro y ofrecer contenido adaptado a tus intereses. Al continuar navegando en el sitio, nos das permiso para su utilización. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.
Configurar cookies
Acepto
