

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	0
N° de Servicio Tasadora	260704334
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

BBVA CONTINENTAL
PRIMER CONSTRUYO





Tipo de Tasación	Comercial		Nueva	**N° de Garantía**	-
Solicitante	BBVA CONTINENTAL	OF.	-	FUNC.	-
Cliente	HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR				
Propietario (s)	HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR				
Fecha de inspección	16/07/2026				
Dirección Registral	MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA, DISTRITO CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA				
Dirección Municipal	NO SE CONTÓ CON DOCUMENTO MUNICIPAL				
Dirección según inspección ocular	CALLE B, MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA, DISTRITO CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA				
Tipo de inmueble	Vivienda Unifamiliar	**Ocupante**	Propietario		

Descripción	TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
	Vivienda	100%	-	
	-		-	

Zonificación	RDA	**Material de construcción**	Concreto-Ladrillo		
Año de construcción	2026	**Obra finalizada**	SÍ		NO X

*De acuerdo a expediente documental y tipo de construcción predominante

Area de terreno	116.36 m²	**Area construida**	175.32 m²		
Declaratoria de fábrica	SÍ	NO X	**Tipo de declaratoria**	TOTAL	PARCIAL
Cargas	SÍ	NO X	**Gravámenes**	SÍ	NO X

VALORES TOTALES	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN PROYECTADA
VALOR COMERCIAL PROYECTADO	US$	174,897.28	41,889.60	133,007.68
	S/	595,175.44	142,550.31	452,625.13
VALOR DE REALIZACIÓN PROYECTADO	US$	131,172.96	31,417.20	99,755.76
	S/	446,381.58	106,912.73	339,468.85

VALORES INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	TERRENO	EDIFICACIÓN
VALOR COMERCIAL	US$	41,889.60	41,889.60	
	S/	142,550.31	142,550.31	
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	31,417.20	31,417.20	
	S/	106,912.73	106,912.73	

VALORES NO INSCRITOS EN RR.PP.	MONEDA	VALOR TOTAL	AVANCE DE OBRA	% AVANCE DE OBRA
VALOR COMERCIAL	US$	68,361.96	68,361.96	51.40%
	S/	232,635.76	232,635.76	
VALOR DE REALIZACIÓN	US$	51,271.47	51,271.47	
	S/	174,476.82	174,476.82	

VALORES DE RECONSTRUCCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL (VSN PROYECTADO)	VALOR DE RECONSTRUCCIÓN (VSN DEL AVANCE)	VALOR DE RECONSTRUCCIÓN (VSN PENDIENTE)	FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN
V. RECONSTRUCCIÓN (INCL. CONSTRUCCIONES DECLAR. Y NO DECLAR.)	US$	133,007.68	68,361.96	64,645.72	30/09/2026
	S/	452,625.13	232,635.76	219,989.38	

Tipo de cambio aplicado 3.403 Soles / Dólar

Observaciones

- El monto del presupuesto proporcionado por el cliente corresponde al monto contemplado en la "Solicitud Construyo".
- Las áreas construidas detalladas en la memoria corresponden a lo detallado en la Solicitud Construyo.
- En el presente informe el cliente ha presentado la Resolución de Licencia de Edificación N°052-2025-MDC/GDUREI-SGC con fecha 16/06/2025 (Ver anexo 6) donde el área construida es de 175.32m², la cual corresponde con la memoria, los planos y la Solicitud Construyo.
- El Valor Unitario de Edificación SI incluye los trabajos que se realizaran en obras complementarias (cisterna enterrada y tanque elevado) y equipamiento (kit de cocina, therma, interruptor con auricular).
- El presente informe se presenta en base a la documentación presentada (presupuesto de Obra y Memoria Descriptiva, resolución de licencia, planos de arquitectura).
- La fecha estimada de finalización de obra es 30/09/2026, al respecto el perito considera de acuerdo al estado de la construcción y a los materiales y mano de obra observada, sería conforme.

Advertencias

- La presente valorización considera las partidas ejecutadas al momento de la inspección, no incluye materiales puestos en obra.
- El presupuesto incluye IGV, no considera gastos generales y utilidades.
- Se sustenta la ubicación con el BGR, N° de suministro y recibo de servicio.
- La visita fue atendida por el propietario.
- El inmueble no cuenta con cargas o gravámenes inscritos vigentes.

Inmueble en zona de riesgo SÍ NO Comentarios

Valor comercial Tasación Anterior US$ S/ FECHA PERITO

PERITO	Arq. Evelyn Limaymanta Sánchez
REPEV	1436-2020

PERITO	Arq. Lizardo Rodriguez Joh
REPEV	1917 - 2024

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de caducidad	17-Jul-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

Objeto y Propósito
Estimar el Valor Comercial del inmueble para fines de Garantía Hipotecaria

Alcance y Limitaciones
Durante la visita SI se dieron las facilidades para la inspección ocular y toma de registro fotográfico al interior del inmueble.

Reglamentación
Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú - R.M. Nº 172-2016-VIVIENDA , Resolución S.B.S N° 11356-2008 para la determinación del valor de realizaciones el mercado.

Metodología Empleada
Se utilizan los Métodos Directos (Comparación, Costos) o Indirectos establecidos en el Artículo 3. Inciso 3.1.5 del Título I del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.

Documentación Proporcionada

X	Partida Registral	X	Licencia Edificación	X	Planos	X	Presupuesto
X	Solicitud Construyo		Tasación anterior		Cuadro de acabados	X	Memoria Des.
	Otro, especificar						

Titulación e Inscripción — **Principal**: Partida Electrónica | Nº: 11166474 | Fecha: 2/07/2026

Características Registrales

Cargas	Gravámenes	Declaratoria de Fábrica
No	No	No tiene

2. DATOS GENERALES

Solicitante: BBVA CONTINENTAL

Tipo de Tasación / Producto: COMERCIAL

Cliente: HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR

Propietario(s): HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR

Fecha de Inspección: 16/07/2026

Ocupante: Propietario

Georreferencias: Latitud -5.179595053 | Longitud -80.61293548 | (*) Datos obtenidos Google Maps

Ubicación Administrativa: Departamento Piura | Provincia Piura_ | Distrito Castilla

Ubicación según Partida Electrónica: MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA, DISTRITO CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

Ubicación según el Predio Urbano: NO SE CONTÓ CON DOCUMENTO MUNICIPAL

Ubicación Según la Inspección Ocular: CALLE B, MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA, DISTRITO CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL ENTORNO

Características del Sector y del Entorno

Tipo de Zona	Urbana	Demanda / Interés	Media
Uso Predominante	Vivienda	Zonificación	RDA
Desarrollo	Creciente	Altura de Edificación	Media
Nivel Socioeconómico	Medio	Velocidad de Cambio	Media
Tendencia del Desarrollo Urbano	Consolidado Homogéneo	Tipo de Suelo	Franco Arcilloso
Transporte Público	Regular	Estado de Conservación	Bueno

Equipamiento del Entorno

	Nivel de Equipamiento		Nivel de Equipamiento
Comercial	Suficiente	Estacionamiento	Suficiente
Escolar	Suficiente	Áreas Verdes	Suficiente
Asistencial	Suficiente	Zonas Recreativas	Suficiente

Infraestructura de Servicio Urbano

	Dispone	Calidad	Estado de Conservación
Vías Asfaltadas	Completas	Medio	Bueno
Veredas	Completas	Medio	Bueno
Alcantarillado	Completas	Medio	Bueno
Agua Potable	Completas	Medio	Bueno
Alumbrado	Completas	Medio	Bueno

Vías Principales del Entorno: Av. Alameda de los Ficus, Av. Camino Solar, Av. Andrés Avelino Cáceres

Riesgos de Origen Natural o Humano: Lluvias Intensas | Otro Tipo de Riesgos: FEN

4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Régimen de Propiedad: Propiedad Exclusiva

Tipo de inmueble: Vivienda Unifamiliar

Descripción

TIPO DE USO (*)	%	TIPO DE USO (*)	%
Vivienda	100%		

Terreno

Forma				Topografía				Posición			
Regular	X	Irregular		Plana	X	Pendiente		Interior		Exterior	X

Construcciones

Material Predominante	Edad Efectiva (años)	Estado de Conservación
Concreto-Ladrillo	0	En Construcción

Descripción General

N° de Pisos del edificio	Áreas Comunes	N° Unidades en el conjunto
3	No	1
N° de Sótanos del edificio	**Ascensor**	**Conexión de Servicios**
0	No	Sí, todos
Nivel ocupado en el edificio.	**Obras Complementarias**	**Mantenimiento**
3	Sí, especificadas en cuadro detalle	Constante

Descripción y Distribución Detallada del Inmueble

Se trata de un inmueble tipo Casa Habitación de tres niveles con estructura de concreto y ladrillo; emplazada sobre un terreno urbano medianero con forma regular y topografía plana, con acceso desde la Calle B, ubicado en un entorno residencial consolidado de forma homogénea, con zonificación RDM.
La edificación se encuentra en construcción. De acuerdo a lo observado en la inspección y a lo detallado en los planos, contará con la siguiente distribución:
- 1° piso: cochera, cisterna (tanque enterrado), ingreso peatonal, patio delantero, dormitorio con baño completo incorporado, sala - comedor con cocina integrada, escaleras al 2° piso, patio posterior y medio baño.
- 2° piso: consta de llegada de escaleras, pasadizo de distribución, dormitorio principal con balcón, WCL y baño completo incorporados, baño completo comun, dos dormitorios con CL.
- 3° piso: consta de llegada de escaleras, terraza con parrilla, baño completo comun, dormitorio, lavandería - tendal.
- Sobre el techo del 3° piso se proyecta el tanque elevado.

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

MEMORIA DESCRIPTIVA

4. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

4.1 LINDEROS

Orientación	Descripción	Medida (Metros)
Frente	Calle B	8.00
Derecha	Lote 4	14.55
Izquierda	Lote 2	14.54
Fondo	Urbanización Miraflores Country Club 5ta Etapa	8.00
		45.09

4.2 TERRENO

Unidad Inmobiliaria	Unidad Métrica	A.M. Prop. Horiz/ Vert.	% Participación	Área Privativa	Obtención del Área	Observación
Lote 3 Mz BU1	m²	116.36	100.00%	116.36	F. Reg/Part. Elect	
Total área de terreno				116.36		

Nota: -

4.3 CONSTRUCCIÓN

Descripción	Unidad Métrica	Área Techada	Área sin Techar	Área Ocupada	Antigüedad	Obtención del Área	Edificación Declarada
Primer piso	m²	71.36		71.36	1	Plano Arquitectónico	No
Segundo piso	m²	70.76		70.76	1	Plano Arquitectónico	No
Tercero piso	m²	33.20		33.20	1	Plano Arquitectónico	No
Total áreas construidas		175.32	0.00	175.32			

Nota:

4.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN

Calidad de la construcción

Muy Buena	X
Buena	
Regular	
Mala	

Tipo de construcción

Definitiva	X
Parcial	
Provisional	
Autoconstrucción	

Estructura general

Cimentación	Zapatas de Concreto Armado
Estructura	Albañilería Confinada
Muros	Albañilería (Ladrillo)
Techos	Losa Aligerada de C°A° Unidireccional
Cobertura	Otros
Inst. Eléctricas	Corriente Monofásica empotrada
Inst. Gas	Sin Instalación
Inst. Sanitarias	Sist. de Bombeo de agua potable y desagüe

4.5 ACABADOS

Puertas	Tipo			
	Material			
	Sistema			
Ventanas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Mamparas	Marco			
	Vidrio			
	Sistema			
Muebles de cocina	Tipo			
	Material			
	Tableros			
	Lavaderos			
Baños				
Closets				
Pisos				
Revestimientos				
Cerrajería				
Áreas Comunes				

Obras Complementarias e Instalaciones Fijas

Aire Acondicionado	X	Intercomunicador		Cerco	
Alarma		Sistema Hidroneumático		Cisterna	X
Ascensor		Sistema Contra Incendios		Iluminación Especial	
Parrilla		Tanque Elevado	X	Piscina	

Otros y Comentarios

-

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

MÉTODO DE COSTOS O REPOSICIÓN (OFERTA DE MERCADO PARA TERRENOS)

A. DATOS GENERALES DE REFERENCIAS DE MERCADO

	Ubicación / Descripción	Fuente Página Web	Zonificación	Distancia al bien (m)	Forma / Topografía	Teléfono	Nombre Contacto	Fecha
1	Terreno urbano en Mz G2 lote 20 Urb. Miraflores Country Club. Dimensiones: 8x20ml. N° de frentes: 01. Vista a parque: No.	https://www.delvallepropiedades.com/inmueble/terrenos/venta-de-terrenos-urbanos/venta-de-terreno-en-urb-miraflores-country-club-piura	RDA	707.00	Regular / Plana	971536802	Rosa Hernández	17-Jul-26
2	Terreno urbano Urb. Miraflores Country Club. Dimensiones: 8x15ml. N° de frentes: 01. Vista a parque: No.	https://www.salemaxinmobiliaria.com/inmueble/venta/terreno/terreno-en-venta-miraflores-country-club-1	RDA	598.00	Regular / Plana	980557434	Javier Ruesta	17-Jul-26
3	Terreno urbano Urb. Miraflores Country Club. Dimensiones: 7.80x18ml. N° de frentes: 01. Vista a parque: No.	https://www.delvallepropiedades.com/inmueble/terrenos/venta-de-terrenos-urbanos/venta-de-terreno-en-miraflores-country-club-excelente-ubicacion-14194-mts2	RDA	684.00	Regular / Plana	966691971	Javier Juárez	17-Jul-26
4	Terreno urbano en Mz BT Lote 34, Urb. Miraflores Country Club. Dimensiones: 8x15ml. N° de frentes: 01. Vista a parque: No.	https://casas.trovit.com.pe/detail/trovit-PE-2370001776585850492	RDA	126.00	Regular / Plana	978008915	Propietario	17-Jul-26
5	Terreno urbano en Mz AP lote 20 I etapa Urb. Miraflores Country Club. Dimensiones: 7x17.20ml. N° de frentes: 01. Vista a parque: No	https://www.doomos.com.pe/propiedad/venta-lindo-terreno-miraflores-country-club	RDA	398.00	Regular / Plana	973864895	Beatriz	17-Jul-26

B. HOMOLOGACIÓN DE REFERENCIAS DE MERCADO DE TERRENOS

	Valor del Inmueble Referencial (US$)	Área (m²)	Valor Unitario Terreno (US$/m²)	Factores de HOMOLOGACIÓN						Factor Resultante	Valor Unit. Terreno Homologado (US$/m²)
				Zonf.	Ent.	Topo.	Ub.	Sup.	F.N.		
1	57,000.00	160.00	356.25	1.00	1.05	1.00	1.00	1.02	0.95	1.02	363.38
2	45,000.00	120.00	375.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95	0.95	356.25
3	48,000.00	141.94	338.17	1.00	1.05	1.05	1.00	1.01	0.95	1.06	358.46
4	42,000.00	120.00	350.00	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00	0.95	1.00	350.00
5	50,000.00	120.00	416.67	1.00	0.95	1.00	0.95	1.00	0.95	0.86	358.33
	Valor Unitario Terreno Homologado Promedio [$/m²]		357.28	VUT Prom. Homologado ajustado[$/m²]							360.00

Los factores usados son: Zonificación, Entorno, Topografía, Ubicación, Superficie y Factor de Negociación


PLANO DE UBICACIÓN Y REFERENCIAS DE TERRENO



RESUMEN VALORES UNITARIOS

	Referencias	Ofertado	Homologado
COMPARABLES	57,000.00	356.25	363.38
	45,000.00	375.00	356.25
	48,000.00	338.17	358.46
	42,000.00	350.00	350.00
	50,000.00	416.67	358.33
	Promedio	US$ 367.22	US$ 357.28
	Máximo	US$ 416.67	US$ 363.38
	Mínimo	US$ 338.17	US$ 350.00
	Difer. Max Min	US$ 78.50	US$ 13.38

COMPORTAMIENTO DE VALORES UNITARIOS



BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

ANÁLISIS METODOLÓGICO

MÉTODO DIRECTO DE COSTOS O REPOSICIÓN

A. VALOR DE TERRENO (VT)

De acuerdo a la Investigación de Mercado de Terrenos con características similares al inmueble tasado se obtiene;

Unidad Inmobiliaria	Área de terreno (m²)	Factor de Ajuste	V.U. de Terreno (US$/m²)	Valor de Terreno (US$/m²)
Lote 3 Mz BU1	116.36	1	360.00	41,889.60
Subtotal Terreno (VT)	116.36			41,889.60

Nota	

VALOR DE LAS EDIFICACIONES

De acuerdo a las características constructivas y a los acabados del inmueble observados en la inspección realizada se estima;

Región de la Edificación
Costa

Código	Partida	VUE1		VUE2		VUE3		VUE4		VUE5		VUE6	
		Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2	Clas.	Costo/m2
1	Muros y Columnas												
2	Techos												
3	Pisos												
4	Puertas y Ventanas												
5	Revestimientos												
6	Baños												
7	Instalaciones Eléctricas y Sanitarias												
	Costo Unitario de Edificación (S/)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Tipo de Cambio	(Obra Pequeña) Gastos Generales 14%												
S/. 3.403	Utilidad 10%												
	Valor Unitario de Edificación (S/)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Valor Unitario de Edificación redondeado (US$)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Cálculo del Valor Similar a Nuevo o Valor de Reconstrucción de las Edificaciones (VSNE) y el Valor de las Edificaciones (VE)

Descripción	Área (m^2)	VUE (US$/$m^2$)	Valor Similar a Nuevo (US$)	Material Predominante	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	Valor de Edificación (US$)
Primer piso	71.36	758.66	54,137.74	Concreto-Ladrillo	1	Muy Bueno	1.00	54,137.74
Segundo piso	70.76	758.66	53,682.54	Concreto-Ladrillo	1	Muy Bueno	1.00	53,682.54
Tercero piso	33.20	758.66	25,187.40	Concreto-Ladrillo	1	Muy Bueno	1.00	25,187.40
Subtotal Edificaciones (VSNE)	175.32	US$	133,007.68	Subtotal Edificaciones (VE)			US$	133,007.68

Nota	El Valor Unitario SI/NO incluye el valor de obras complementarias.

C. VALOR DE ÁREAS COMUNES (VAC)

Según el Reglamento General de Tasaciones del Perú, para el valor de las Áreas Comunes, se asigna un % del valor de la edificación;

Descripción	% de Áreas Comunes	Valor Unitario de Áreas Comunes (US$/$m^2$)	Valor de Reconstrucción Áreas Comunes (US$)	FD (*)	Valor de Áreas Comunes (US$)
		0.00			
Subtotal Áreas Comunes (VAC)		US$	0.00	US$	0.00

D. VALOR DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (VI + VOC)

Descripción	Cantidad	Unidad (u)	Valor Unitario (US$/u)	Valor de Reconstrucción (US$)	Edad (años)	Estado de Conservación	FD (*)	Valor de Inst. y Obras Complem. (US$)
Subtotal Instalaciones y Obras Complementarias (VI + VOC)			US$	0.00			US$	0.00

(*) Factor de Depreciación

E. VALOR TOTAL DEL PREDIO (VTP1) [Mediante el Método de Costos Directos = VT + VE + VAC + VI + VOC]	US$	174,897.28
F. VALOR DE RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE TASADO (VSN) [= VSNE + VSNAC + VSNVI + VSNVOC]	US$	133,007.68

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

RESULTADOS

1. RESUMEN GENERAL DE TASACIÓN

A. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DIRECTOS

	VTP (US$)	VU (US$/m²)	VTP (S/)
Método de Costos o Reposición	174,897.28	997.59	595,175.44
Método de Comparación o de Mercado	No considerado		

B. RESULTADO DEL MÉTODO INDIRECTO

Método de la Renta o Capitalización	No considerado		

2. VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE

A. VALOR COMERCIAL (VC)

Para determinar la conclusión del Valor Comercial del inmueble motivo de la presente tasación, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones

a.

b.

c.

d. El método que mejor refleja el Valor Comercial es por: Método Directo de Costos (O de Reposición)

	Valor Comercial
Valor Comercial en Dólares (Moneda Extranjera)	
#¿NOMBRE?	US$ 174,897.28
Valor Comercial en Soles (Moneda Local)	
#¿NOMBRE?	S/ 595,175.44

VALOR DE REALIZACIÓN

A. VALOR DE REALIZACIÓN INMEDIATA (VRI)

El Valor de Realización Inmediata, es el Valor Neto del inmueble que se esperaría recuperar como consecuencia de la eventual venta del bien en el menor tiempo posible y en las condiciones actuales del inmueble y el mercado. Se obtiene descontando los castigos y cargos por los conceptos indicados a continuación:

	Concepto de la Deducción	% de la Deducción	Importe (US$)
A	Gastos de Publicidad.	2.00%	3,497.95
B	Gastos de tasación del inmueble para la Realizacion.	0.20%	349.79
C	Comisiones de Ventas.	5.00%	8,744.86
D	Mantenimiento.	2.00%	3,497.95
E	Factor por la venta del inmueble (Realización) en un plazo de 60 dias.	10.80%	18,888.91
F	Otras Deducciones (Sólo casos especiales)	5.00%	8,744.86
	Total Deducciones	25.00%	US$ 43,724.32

	Valor Realización Inmediata
En Dólares (Moneda Extranjera)	
#¿NOMBRE?	US$ 131,172.96
En Soles (Moneda Local)	
#¿NOMBRE?	S/ 446,381.58

RESPONSABLE

PERITO TASADOR
REGISTRO REPEV
PERITO RESPONSABLE DE INSPECCION OCULAR — ARQ. XIMENA SALAZAR ARCE



TINSA S.A.C.
REPEV N° 702-98



PERITO	Arq. Evelyn Limaymanta Sánchez
PROFESIÓN	Arquitecto CAP: 21712
REPEV	1436-2020

PERITO	Arq. Lizardo Rodriguez Joh
PROFESIÓN	Arquitecto CAP: 23588
REPEV	1917 - 2024

OBSERVACIONES DEL PERITO

- El monto del presupuesto proporcionado por el cliente corresponde al monto contemplado en la "Solicitud Construyo".
- Las áreas construidas detalladas en la memoria corresponden a lo detallado en la Solicitud Construyo.
- En el presente informe el cliente ha presentado la Resolución de Licencia de Edificación N°052-2025-MDC/GDUREI-SGC con fecha 16/06/2025 (Ver anexo 6) donde el área construida es de 175.32m², la cual corresponde con la memoria, los planos y la Solicitud Construyo.
- El Valor Unitario de Edificación SI incluye los trabajos que se realizaran en obras complementarias (cisterna enterrada y tanque elevado) y equipamiento (kit de cocina, therma, interruptor con auricular).
- El presente informe se presenta en base a la documentación presentada (presupuesto de Obra y Memoria Descriptiva, resolución de licencia, planos de arquitectura).
- La fecha estimada de finalización de obra es 30/09/2026, al respecto el perito considera de acuerdo al estado de la construcción y a los materiales y mano de obra observada, sería conforme.

CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS

- La presente valorización considera las partidas ejecutadas al momento de la inspección, no incluye materiales puestos en obra.
- El presupuesto incluye IGV, no considera gastos generales y utilidades.
- Se sustenta la ubicación con el BGR, N° de suministro y recibo de servicio.
- La visita fue atendida por el propietario.
- El inmueble no cuenta con cargas o gravámenes inscritos vigentes.


BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Foto de fachada

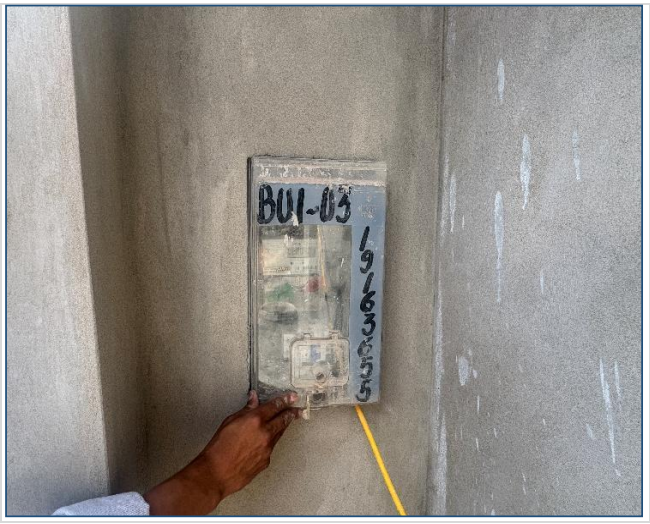

Suministro electrico



Colindante izquierdo



Colindante derecho



Colindante izquierdo



Colindante derecho

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Entorno Calle B



Entorno Calle B



1° piso - cochera



1° piso - patio delantero



1° piso - dormitorio



1° piso - baño incorporado a dormitorio

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



1° piso - Sala comedor



1° piso - escaleras



1° piso - cocina



1° piso - patio posterior



1° piso - medio baño



1° piso - Sala comedor

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



2° piso - pasadizo



2° piso - dormitorio principal



2° piso - WCL de dormitorio principal



2° piso - baño de dormitorio principal



2° piso - baño completo comun



2° piso - dormitorio 02

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



2° piso - dormitorio 03




3° piso - llegada de escaleras



3° piso - terraza



3° piso - baño

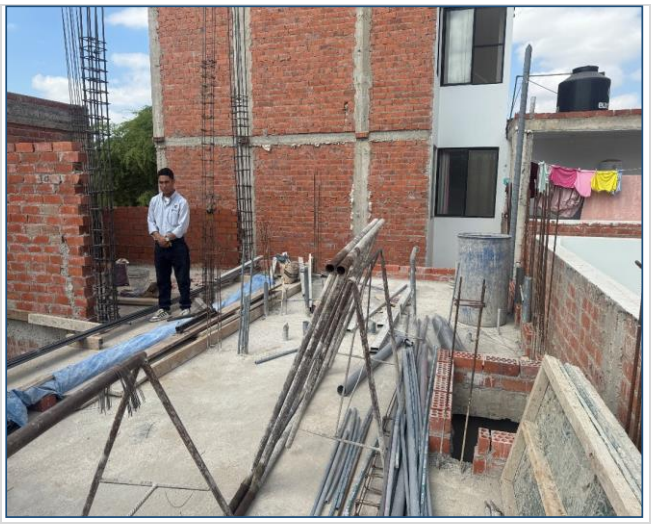

3° piso - lavanderia



3° piso - dormitorio

N° de Solicitud Banco	**0005-21**
N° de Servicio Tasadora	**44,259.00**
Fecha de Expedición	04-Mar-2021
Fecha de Caducidad	04-Mar-2022

SOLICITUD CONSTRUYO

1. Nombre del cliente:

HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR

2. Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):

CALLE B, MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA, DISTRITO CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

3. N° de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):

11166474

4. Cuadro de áreas (disgregar por pisos, áreas construidas existentes y nuevas) :

	ÁREAS TECHADAS (Existentes)	ÁREAS TECHADAS (Nuevas)
PRIMER PISO		71.36
SEGUNDO PISO		70.76
TERCER PISO		33.20
ÁREA TOTAL		**175.32**

5. Detalle del financiamiento (indicar si se va a financiar todos los niveles, solo en casco gris, los primeros dos pisos ,etc)

TODOS LOS NIVELES

6. Descripción del proyecto:

- 1° piso: cochera, cisterna (tanque enterrado), ingreso peatonal, patio delantero, dormitorio con baño completo incorporado, sala - comedor con cocina integrada, escaleras al 2° piso, patio posterior y medio baño.
- 2° piso: consta de llegada de escaleras, pasadizo de distribución, dormitorio principal con balcón, WCL y baño completo incorporados, baño completo comun, dos dormitorios con CL.
- 3° piso: consta de llegada de escaleras, terraza con parrilla, baño completo comun, dormitorio, lavandería - tendal.
- Sobre el techo del 3° piso se proyecta el tanque elevado.

7. Presupuesto global por especialidades (Soles):

PARTIDAS DE LA CONSTRUCCIÓN	VALOR (S/.)	VALORIZACION ACUMULADA		SALDO POR VALORIZAR	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
Estructura	S/ 143,140.56	85.20%	S/. 121,954.24	14.8%	S/. 21,186.32
Arquitectura	S/ 170,550.86	28.21%	S/. 48,109.52	71.8%	S/. 122,441.35
Instalaciones Sanitarias	S/ 34,287.00	50.51%	S/. 17,319.39	49.5%	S/. 16,967.61
Instalaciones Eléctricas	S/ 35,602.20	27.43%	S/. 9,765.80	72.6%	S/. 25,836.40
Costo Directo	**S/ 383,580.62**	**51.40%**	**S/. 197,148.95**		**S/. 186,431.68**
Utilidad	S/ 0.00				S/ 0.00
Gastos Generales	S/ 0.00	0%			S/ 0.00
IGV	S/ 69,044.51	51.40%	S/. 35,486.81		S/. 33,557.70
TOTAL	**S/ 452,625.13**	**51.40%**	**S/. 232,635.76**	**48.60%**	**S/. 219,989.38**

8. Fecha de finalización de obra estimada:

30/09/2026

KOKREAR
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

Presupuesto

Presupuesto **102054** **CONSTUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MZ "BU1" LOTE "03"; URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB**

Cliente **HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR** Costo al **3/07/2026**

Lugar **PIURA - PIURA - CASTILLA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS Y SERVICIOS PROVISIONALES**				**720.34**
01.06	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	glb	1.00	720.34	720.34
02	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**1,016.95**
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA EN OBRA	glb	1.00	1,016.95	1,016.95
03	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**8,087.80**
03.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION PROF. APROX=1.50M	m3	85.60	31.69	2,712.66
03.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	58.37	23.86	1,392.71
03.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL P/FALSO PISO	m2	105.75	2.98	315.14
03.04	BASE DE AFIRMADO DE 4" P/FALSO PISO	m2	105.75	15.38	1,626.44
03.05	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	m3	69.40	6.86	476.08
03.06	ELIMINACION DE MATERIAL ACARREADO	m3	69.70	22.45	1,564.77
04	**CONCRETO SIMPLE**				**27,845.38**
04.01	CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G.	m3	36.57	237.67	8,691.59
04.02	CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:8 + 30% P.G.	m3	48.57	301.02	14,620.54
04.03	SOLADO DE 4", MEZCLA 1:10 C:H	m2	23.14	38.88	899.68
04.04	FALSO PISO e=4" CONCRETO 1:12 (C:H).	m2	105.75	34.36	3,633.57
05	**CONCRETO ARMADO**				**105,470.09**
05.01	**ZAPATAS**				**6,434.14**
05.01.01	CONCRETO ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	m3	5.29	476.75	2,522.01
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	22.48	42.61	957.87
05.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60, ZAPATAS	kg	481.15	6.14	2,954.26
05.02	**VIGA DE CIMENTACION**				**5,859.06**
05.02.01	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	m3	4.75	491.53	2,334.77
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACION	m2	38.50	40.42	1,556.17
05.02.03	ACERO REFUERZO F'y=4200KG/CM2	kg	336.43	5.85	1,968.12
05.03	**SOBRECIMIENTOS REFORZADOS**				**11,256.42**
05.03.01	CONCRETO SOBRECIMIENTOS f'c=210 kg/cm2	m3	7.65	484.63	3,707.42
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	75.40	39.09	2,947.39
05.03.03	ACERO REFUERZO F'y=4200KG/CM2	kg	786.60	5.85	4,601.61
05.04	**COLUMNAS**				**21,062.67**
05.04.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	12.75	493.03	6,286.13
05.04.02	ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	95.60	39.76	3,801.06

05.04.03	ACERO REFUERZO F'y=4200KG/CM2	kg	1,876.15	5.85	10,975.48
05.05	**VIGAS**				**26,797.94**
05.05.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	18.45	481.63	8,886.07
05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	95.60	46.08	4,405.25
05.05.03	ACERO REFUERZO F'y=4200KG/CM2	kg	2,214.20	6.10	13,506.62
05.06	**LOSAS ALIGERADAS**				**28,687.53**
05.06.01	CONCRETO LOSAS ALIGERADAS f'c= 210 kg/cm2	m3	15.80	481.63	7,609.75
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADAS	m2	187.80	48.97	9,196.57
05.06.03	LADRILLO PARA TECHO DE h=0.15 m	und	1,450.60	2.93	4,250.26
05.06.04	ACERO Fy=4200KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA	kg	1,267.60	6.02	7,630.95
05.07	**LOSAS MACIZAS**				**5,372.33**
05.07.01	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	3.70	491.14	1,817.22
05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS	m2	43.50	49.42	2,149.77
05.07.03	ACERO Fy=4200KG/CM2 PARA LOSA MACIZAS	kg	235.40	5.97	1,405.34
06	**CASCO ROJO**				**24,531.88**
06.01	**MUROS DE ALBAÑILERIA**				**24,531.88**
06.01.01	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m2	470.41	52.15	24,531.88
07	**CASCO VERDE**				**39,614.14**
07.01	**REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**31,500.57**
07.01.01	TARRAJEO MUROS PRIMARIO	m2	57.80	27.58	1,594.12
07.01.02	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	665.70	25.97	17,288.23
07.01.03	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	82.78	29.19	2,416.35
07.01.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	47.50	34.54	1,640.65
07.01.05	TARRAJEO EN CIELO RASO	m2	187.80	37.81	7,100.72
07.01.06	TARRAJEO EN LOSAS MACIZAS	m2	23.50	39.99	939.77
07.01.07	DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:5	m	34.60	15.05	520.73
07.02	**PISOS Y PAVIMENTOS**				**8,113.57**
07.02.01	CONTRAPISO DE 2"	m2	268.04	19.74	5,291.11
07.02.02	CONTRAPISO DE CEMENTO PULIDO E= 5CM	m2	81.40	29.90	2,433.86
07.02.03	CONCRETO PARA RAMPAS F`C=140 KG/CM2 (12% PENDIENTE)	m2	5.30	73.32	388.60
08	**ACABADOS**				**111,077.40**
08.01	**CONTRAZOCALOS**				**5,459.31**
08.01.01	ENCHAPE CONTRAZOCALO CON PORCELANATO H= 50 cm	m	47.60	62.27	2,964.05
08.01.02	ENCHAPE CONTRAZOCALO CON PORCELANATO MARMOLIZADO DE 10 X 60 cm	m	114.60	16.94	1,941.32
08.01.03	ENCHAPE CONTRAZOCALO CON PORCELANATO CEMENTICIO DE 10 X 60 cm	m	32.70	16.94	553.94
08.02	**PISOS**				**32,209.02**
08.02.01	.PISO DE PORCELANATO MARMOLIZADO (60 X 60 cm)	m2	185.40	114.60	21,246.84
08.02.02	.PISO DE PORCELANATO CEMENTICIO (60 X 60 cm EXTERIORES)	m2	81.50	114.60	9,339.90

08.02.03	.PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE (60 X 60 cm RUSTICO)	m2	14.56	111.42	1,622.28
08.03	**ZOCALOS**				**8,160.98**
08.03.01	.PORCELANATO MARMOLIZADO EN MUROS DE BAÑOS (30X60CM LISO)	m2	57.80	122.10	7,057.38
08.03.02	.PORCELANATO MARMOLIZADO EN MUROS (30X60CM LISO)	m2	8.70	126.85	1,103.60
08.04	**PINTURA**				**16,568.56**
08.04.01	.PINTURA EN MUROS INTERIORES, DERRAMES (LATEX 2 MANOS)	m2	687.59	9.58	6,587.11
08.04.02	.PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS (LATEX 2 MANOS)	m2	130.28	11.04	1,438.29
08.04.03	.PINTURA EN CIELORASOS (LATEX 2 MANOS)	m2	187.80	7.28	1,367.18
08.04.04	.EMPASTADO EN MUROS INTERIORES (INC. LIJADO)	m2	687.59	6.65	4,572.47
08.04.05	.EMPASTADO EN COLUMNAS Y VIGAS (INC. LIJADO)	m2	130.28	6.65	866.36
08.04.06	.EMPASTADO EN CIELORASO (INC. LIJADO)	m2	187.80	9.25	1,737.15
08.05	**CARPINTERIA DE MADERA**				**8,755.99**
08.05.01	PUERTA BATIENTE MACHIMBRADA MADERA CEDRO AMARGO COLOR NATRAL 0.90 X 2.80m)	und	1.00	3,813.56	3,813.56
08.05.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE 35mm TRIPLAY 4mm Y MARCO DE MADERA	m2	12.96	381.36	4,942.43
08.06	**CARPINTERIA METALICA**				**4,938.09**
08.06.01	PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.40M	und	1.00	1,124.53	1,124.53
08.06.02	PORTON METALICO (2.80 x 2.60) inc. SISTEMA LEVADIZO	und	1.00	3,813.56	3,813.56
08.07	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**				**8,260.20**
08.07.01	VENTANA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO CRUDO INCOLORO 6MM MARCO DE ALUMINIO	m2	8.55	322.03	2,753.36
08.07.02	MAMPARA CORREDIZA SISTEMA DIRECTO CON VIDRIO DE 8 MM /MARCO DE ALUMINIO	m2	14.44	381.36	5,506.84
08.08	**COBERTURAS**				**2,511.74**
08.08.01	ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	24.70	101.69	2,511.74
08.09	**MELAMINA**				**15,690.95**
08.09.01	CLOSET EN HABITACIONES CON MELAMINA DE COLOR BLANCA	m	6.40	1,123.73	7,191.87
08.09.02	REPOSTEROS ALTOS Y BAJOS EN COCINA	m	5.15	1,123.73	5,787.21
08.09.03	MUEBLE BAJO DEL COMEDOR DIARIO MELAMINA 18MM	m	1.80	677.97	1,220.35
08.09.04	MUEBLES BAJO MESADA DE BAÑOS CON MELAMINE DE 18MM (Hmax=0.50m)	m	3.20	466.10	1,491.52
08.10	**GRANITOS PULIDO Y CUARZOS**				**3,850.00**
08.10.01	MESADA DE COCINA CON GRANITO BLANCO SERENA	m	4.20	500.00	2,100.00
08.10.02	MESADA DE COMDEDOR DE DIARIO CON GRANITO BLANCO SERENA	m	1.80	500.00	900.00
08.10.03	REVESTIMIENTO EN MESADA DE BAÑOS CON GRANITO BLANCO SERENA (ancho=60cm)	m	1.70	500.00	850.00
08.11	**EQUIPAMIENTO**				**4,672.56**
08.11.01	KIT DE COCINA (INC. COCINA 4 HORNILLAS, HORNO, CAMPANA)	und	1.00	3,220.96	3,220.96
08.11.02	TERMA ELECTRICA 80 LTS	und	1.00	902.31	902.31
08.11.03	INTERCOMUNICADOR CON AURICULAR	und	1.00	549.29	549.29
09	**DESAGUE**				**5,351.57**

KOKREAR
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

09.01	**TUBERIA DE DESAGUE**				**2,318.56**
09.01.01	.SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 4"	m	43.90	33.20	1,457.48
09.01.02	.SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 2"	m	35.70	24.12	861.08
09.02	**MONTANTES DE DESAGUE**				**685.01**
09.02.01	.MONTANTE DE PVC SAL 2" Hmax= 3.00m	und	5.00	76.57	382.85
09.02.02	MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"	und	3.00	100.72	302.16
09.03	**SALIDAS DE DESAGUE**				**2,348.00**
09.03.01	SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"	pto	8.00	103.38	827.04
09.03.02	SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"	pto	9.00	60.39	543.51
09.03.03	.SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" (C/TRAMPA P)	pto	12.00	56.75	681.00
09.03.04	SALIDA DE EVENTILACION PVC SAL 2" (INC. SOMBRERO)	pto	5.00	59.29	296.45
10	**SISTEMA DE AGUA PLUVIAL**				**5,173.36**
10.01	**TUBERIA DE DE AGUA PLUVIAL**				**2,597.59**
10.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3"	m	91.95	28.25	2,597.59
10.02	**MONTANTES PLUVIAL**				**755.02**
10.02.01	MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 3"	m	7.00	107.86	755.02
10.03	**SALIDAS DE PLUVIAL**				**1,820.75**
10.03.01	. SALIDA PLUVIAL PVC- SAL DE 3" (INC. SOMBRERO)	pto	7.00	98.15	687.05
10.03.02	. SALIDA PLUVIAL PVC- SAL DE 3" (INC. SUMIDERO)	pto	10.00	113.37	1,133.70
11	**RED DE AGUA FRIA**				**5,276.06**
11.01	**TUBERIA DE AGUA FRIA**				**1,979.80**
11.01.01	.RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC C-10 CR 3/4"	m	65.89	16.48	1,085.87
11.01.02	.RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC C-10 CR 1"	m	14.80	29.16	431.57
11.01.03	. RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA C-10 PVC-CR 1/2"	und	30.20	15.31	462.36
11.02	**SALIDA DE AGUA FRIA**				**2,237.06**
11.02.01	.SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2"	pto	29.00	77.14	2,237.06
11.03	**VALVULAS**				**1,059.20**
11.03.01	.VALVULA COMPUERTA DE 1/2" AF	und	8.00	132.40	1,059.20
12	**RED DE AGUA CALIENTE**				**1,464.57**
12.01	**TUBERIA DE AGUA CALIENTE**				**657.81**
12.01.01	.RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CPVC 3/4"	m	16.70	25.16	420.17
12.01.02	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CPVC DE 1/2"	m	11.90	19.97	237.64
12.02	**SALIDA DE AGUA CALIENTE**				**393.30**
12.02.01	.SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC 1/2"	pto	6.00	65.55	393.30
12.03	**VALVULAS**				**413.46**
12.03.01	.VALVULA COMPUERTA DE 1/2" AC	und	3.00	137.82	413.46
13	**MEZCLADORAS AF Y AC**				**2,011.37**
13.01	MEZCLADORA PARA DUCHA (PRINCIPAL)	und	1.00	500.45	500.45

KOKREAR
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

13.02	MEZCLADORA PARA DUCHA	und	2.00	106.29	212.58
13.03	MEZCLADORA PARA LAVATORIO	und	3.00	432.78	1,298.34
14	**AIRE ACONDICIONADO**				**521.91**
14.01	**TUBERIA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO**				**275.22**
14.01.01	.RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE PVC C-10 CR 3/4"	m	16.70	16.48	275.22
14.02	**SALIDA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO**				**246.69**
14.02.01	SALIDA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO TUBERIA PVC C-10 3/4"	pto	3.00	82.23	246.69
15	**EQUIPAMIENTO**				**8,715.36**
15.01	**APARATOS SANITARIOS**				**5,127.12**
15.01.01	INODORO ONE PIECE COLOR BLANCO	und	4.00	677.97	2,711.88
15.01.02	.LAVATORIO EMPOTRADO COLOR BLANCO	und	4.00	338.98	1,355.92
15.01.03	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO	und	1.00	677.97	677.97
15.01.04	LAVADERO DE ROPA FIBRA DE VIDRIO	und	1.00	381.35	381.35
15.02	**GRIFERIAS**				**1,617.94**
15.02.01	GRIFERIA PARA LAVATORIO	und	4.00	289.15	1,156.60
15.02.02	GRIFERIA PARA LAVADERO EN COCINA	und	1.00	461.34	461.34
15.03	**ESPEJOS**				**823.62**
15.03.01	ESPEJO PARA BAÑO (0.85 X 1.15m)	und	3.00	274.54	823.62
15.04	**REGISTROS**				**517.24**
15.04.01	REGISTRO CROMADO DE 4"	und	7.00	46.48	325.36
15.04.02	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und	9.00	21.32	191.88
15.05	**INSTALACION**				**629.44**
15.05.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	4.00	157.36	629.44
16	**ELECTROBOMBA**				**888.04**
16.01	ELECTROBOMBA DE 0.75 HP (INC. ACCESORIOS E INSTALACION)	und	1.00	888.04	888.04
17	**CAJAS DE REGISTRO**				**426.06**
17.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	2.00	213.03	426.06
18	**CISTERNA**				**3,594.11**
18.01	EXCAVACION MANUAL PARA CISTERNA	m3	5.67	25.84	146.51
18.02	SOLADO DE 4", MEZCLA 1:10 C:H	m2	5.67	41.58	235.76
18.03	AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:4 SUBTERRANEO	m2	10.45	57.53	601.19
18.04	CONCRETO CISTENA f'c=210 kg/cm2 DUCTO DE CISTERNA	m3	0.76	473.01	359.49
18.05	ENCOFRADO NORMAL DE CISTERNA	m2	6.28	74.95	470.69
18.06	.TANQUE CISTERNA DE 2500 L (incl. accesorios)	und	1.00	1,780.47	1,780.47
19	**TANQUE ELEVADO**				**2,274.54**
19.01	ESTRCUTURA METALICA PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO	und	1.00	1,059.32	1,059.32
19.02	TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO 1100 L	und	1.00	1,215.22	1,215.22
20	**SALIDADAS DE ILUMINACION**				**1,882.87**

20.01	.SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	13.00	43.75	568.75
20.02	.SALIDA PARA CENTRO DE SPOT LIGHT	pto	16.00	46.47	743.52
20.03	.SALIDA PARA BRAQUETE	pto	6.00	48.59	291.54
20.04	.SALIDA PARA ILUMINACION EN PISO	pto	4.00	44.26	177.04
20.05	.SALIDA PARA LUZ LED	pto	2.00	51.01	102.02
21	**SALIDAS DE TOMACORRIENTE**				**1,593.17**
21.01	.SALIDA PARA TOMACORRIENTES	pto	29.00	44.14	1,280.06
21.02	.SALIDA DE FUERZA	pto	7.00	44.73	313.11
22	**SALIDAS DE INTERRUPTOR**				**2,045.26**
22.01	.SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	16.00	50.61	809.76
22.02	.SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	15.00	49.42	741.30
22.03	.SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	4.00	49.42	197.68
22.04	.SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE	pto	6.00	49.42	296.52
23	**CAJAS DE PASE**				**456.24**
23.01	.CAJA DE PASO OCTOGONAL DE PVC	pto	5.00	51.48	257.40
23.02	.CAJA DE PASE RECTANGULAR 20 X 15.5 X 8CM	pto	2.00	99.42	198.84
24	**CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS**				**3,800.60**
24.01	.TUBERIAS ELECTRICA DE PVC SEL 3/4" PARA ILUMINACION	m	345.00	3.51	1,210.95
24.02	.TUBERIAS ELECTRICA DE PVC SEL 3/4" PARA TOMACORRIENTES	m	285.00	3.51	1,000.35
24.03	.TUBERIAS ELECTRICA DE PVC SEL 3/4" PARA AIRE ACONDICIONADO	m	45.00	3.51	157.95
24.04	.TUBERIAS ELECTRICA DE PVC SEL 1"	m	45.60	23.99	1,093.94
24.05	MONTANTE ELECTRICA PVC SAP 3" PARA AIRE ACNDICIONADO	und	3.00	112.47	337.41
25	**CONDUCTORES Y/O CABLES**				**8,608.38**
25.01	CONDUCTOR ELECTRICO CABLE THW # 14	m	355.42	13.53	4,808.83
25.02	CONDUCTOR ELECTRICO CABLE THW # 12	m	209.40	15.73	3,293.86
25.03	CONDUCTOR ELECTRICO CABLE THW # 10	m	28.70	17.62	505.69
26	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**				**3,393.09**
26.01	TABLERO DE DISTRIBUCION DE 36 POLOS (TG)	und	3.00	1,131.03	3,393.09
27	**REDES DE COMUNICACION**				**1,593.28**
27.01	.SALIDA PARA TV	pto	12.00	52.37	628.44
27.02	.SALIDA PARA TELEFONO - INTERNET	pto	3.00	52.37	157.11
27.03	.SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR	pto	3.00	52.37	157.11
27.04	TUBERIAS ELECTRICA DE PVC SEL 3/4" PARA REDES DE COMUNICACION	m	156.40	4.16	650.62
28	**EQUIPAMIENTO**				**5,063.93**
28.01	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO PLAFON	und	12.00	69.03	828.36
28.02	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SPOT LIGHT	und	16.00	41.81	668.96
28.03	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO BRAQUETE	und	6.00	94.11	564.66
28.04	ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA PISO	und	2.00	206.07	412.14

KOKREAR
ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN

28.05	LUD LED PARA MUEBLES	und	2.00	111.82	223.64
28.06	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL + TIERRA COLOR BLANCO	und	28.00	44.35	1,241.80
28.07	INTERRUPTOR SIMPLE	und	13.00	27.21	353.73
28.08	INTERRUPTOR DOBLE	und	8.00	35.52	284.16
28.09	INTERRUPTOR TRIPLE	und	4.00	43.40	173.60
28.10	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	und	4.00	45.06	180.24
28.11	TAPAS CIEGAS RECTANGURALES 2" X 4"	und	10.00	8.92	89.20
28.12	TAPAS CIEGAS OCTOGONALES 4"	und	6.00	7.24	43.44
29	**POZO A TIERRA**				**1,082.87**
29.01	POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	1,082.87	1,082.87

COSTO DIRECTO	**383,580.62**
IGV (18.00%)	**69,044.51**
VALOR REFERENCIAL	**452,625.13**

Fecha : **03/07/2026 08:17:04 a.m.**

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**0**
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

SOLICITUD CONSTRUYO

BBVA

Solicitud Construyo

1. Nombre del cliente:

HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR

2. Dirección del inmueble o ubicación (indicar referencias):

URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB MZ "BU1" LT. 03, REFERENCIA POR LA CAPILLA.

3. N° de Partida Electrónica / Copia Literal (documentación registral):

N° PARTIDA: 11166474

4. Cuadro de áreas (disgregar por pisos, áreas construidas existentes y nuevas):

	ÁREAS TECHADAS (Existentes)	ÁREAS TECHADAS (Nuevas)
PRIMER PISO	0.00	71.36
SEGUNDO PISO	0.00	70.76
TERCER PISO	0.00	33.20
CUARTO PISO	0.00	0.00
ÁREA TOTAL	0.00	175.32

5. Detalle del financiamiento (indicar si se va a financiar todos los niveles, solo en cascogris, los primeros dos pisos, etc.)

SE FINANCIARÁN TODOS LOS NIVELES

6. Descripción del proyecto:

1 er piso

1 Ingreso
1 estacionamiento
1 terraza exterior
1 estudio
1 baño estudio
1 sala - comedor
1 cocina
1/2 baño
1 escalera

2do Piso
1 Dormitorio principal con baño, wolking closet y balcon

1 Dormitorio 1 con closet
1 Dormitorio 2 con closet
1 Baño compartido
1 escalera

3er Piso
1 parrilla
1 sala de tv
1 dormitorio visita

1 baño comun
1 lavanderia tendal

terraza con techo para lluvia con estructura liviana.

7. Presupuesto global por especialidades (Soles):

	PARTIDAS DE LA CONSTRUCCION	VALOR S/.
	Estructura	143,140.56
	Arquitectura	170,550.86
	Instalaciones Sanitarias	34,287.00
	Instalaciones Eléctricas	29,519.69
	Instalaciones Mecánicas	6,082.51
	Sub total	**383,580.62**
	Utilidad	-
	Gastos Generales	-
	IGV	69,044.51
	TOTAL	**452,625.13**

Gerson Campoverde Paucar
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 248285

8. Fecha de finalización de obra estimada:

FECHA DE FINALIZACION 30 SETIEMBRE DEL 2026

sunarp

CERTIFICADO LITERAL DE REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

Código de Verificación Digital
43396859

ZONA REGISTRAL N° I – SEDE PIURA

Publicidad Nro. 2026 – 4400067
02/07/2026 21:18:19

Partida Registral N°: 11166474

sunarp

ZONA REGISTRAL N° I - SEDE PIURA
OFICINA REGISTRAL PIURA
N° Partida: 11166474

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA
CASTILLA

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO: PARTIDA DE INDEPENDIZACION POR RECEPCIÓN DE OBRAS
G00001

RUBRO: ANTECEDENTE DOMINIAL
A00001: Independizado de la partida N°11164087.

RUBRO: DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
B00001:
Lote N°3 de la Manzana BU1 de la Urbanización Miraflores Country Club – 7ma. Etapa, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura. Cuenta con las siguientes características:
Área : 116.36 m²
Linderos y medidas perimétricas:
Por el frente : Con Calle B y mide 8.00 ml.
Por la derecha entrando : Con Lote 4 y mide 14.55 ml.
Por la izquierda entrando : Con Lote 2 y mide 14.54 ml.
Por el fondo : Con Urbanización Miraflores Country Club 5ta Etapa y mide 8.00 ml.

RUBRO: TÍTULOS DE DOMINIO
C00001:
Predio independizado a favor de la **ASOCIACIÓN CIVIL SAN JUAN BAUTISTA**, inscrita en la partida electrónica N°01861921 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, como consecuencia de haberse aprobado la correspondiente Recepción de Obras de Habilitación Urbana en la Urbanización Miraflores Country Club – 7ma. Etapa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40° y 41° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios; y, en mérito al Formulario Único de Habilitación Urbana – FUHU Recepción de Obras, con expediente N°017090-2016, debidamente visado por la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural – Subgerencia de Catastro y Control Urbano de la Municipalidad Distrital de Castilla; a la Resolución Gerencial de Recepción de Obras de Habilitación Urbana N°625-2016-GDUR-MDC de fecha 20/06/2016, expedida por el Gerente de Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Castilla, Ing. Albert Salazar Rojas; a la memoria descriptiva y planos que acompañan la referida resolución; y, al Informe Técnico N°2681-2016-ORP-SCR-ZR. N°I-UREG/SUNARP de fecha 11/07/2016, emitido por el Ing. Federico Trelles García, Coordinador Responsable de Catastro de esta Oficina Registral.

RUBRO: CARGAS Y GRAVÁMENES
D00001: Traslado del asiento D00002 de la partida N° 11164087 (Traslado del asiento D00002 de la partida N° 11162444 (traslado del asiento D00002 de la partida N°11160098)).
Servidumbre de paso sobre un área de 50.00 m2 y servidumbre de ocupación sobre 2800.00 m2, a favor de Electronoroeste S.A-ENOSA, según especificaciones contenidas en la Esc. Púb. de fecha 02.06.2003 extendida ante Not. Dr. Acosta Iparraguirre.- Tit. Pres. el 11.09.2003, bajo As. 21995/3RAVF del Diario. Rec. 0473915. Der. S/17.00 P-15-09-2003. Fdo. Jorge Salomón Reyes. Registrador Público – Zona Registral N° I Sede Piura.

RUBRO: OTROS

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

CERTIFICADO LITERAL DE REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

DOCUMENTO CON VALOR LEGAL PARA TODO TIPO DE TRÁMITE

Código de Verificación Digital
43396859

ZONA REGISTRAL Nº I – SEDE PIURA

Publicidad Nro. 2026 – 4400067

Partida Registral N°: 11166474

02/07/2026 21:18:19

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° I - SEDE PIURA
OFICINA REGISTRAL PIURA
N° Partida: 11166474

INSCRIPCION DE REGISTRO DE PREDIOS
MZ BU1 LOTE 3 URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA
CASTILLA

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO: TITULOS DE DOMINIO
C00003

COMPRAVENTA:

HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR, identificado con **DNI n° 43302024**, casado bajo el régimen de separación de patrimonios inscrito en la partida n° 11159577 del Registro Personal de Piura, ha adquirido la propiedad del inmueble inscrito en la presente partida, en mérito a la compraventa celebrada con la anterior propietaria, la sociedad conyugal conformada por Valentin Aponte Gallardo y Rosa Ysabel Coronado Molero, por el precio de **US$. 43,500.00 dólares americanos**, cancelados. Así consta en la escritura pública n° 669 otorgada con fecha 23/04/2025 ante la notaria de Piura, abogada Carolina Mercedes Núñez Ricalde.

El título fue presentado el 25/04/2025 a las 10:33:11 AM horas, bajo el N°2025-01224441 del Tomo Diario 0237. Derechos cobrados S/ 523.90 soles con Recibo(s) Número(s) 00026302-01.-PIURA, 29 de abril de 2025. ***Presentación electrónica.***


ANA KARINA KAMAHARA ATARAMA
REGISTRADOR PUBLICO
ZONA REGISTRAL N° I - SEDE PIURA

Página Número 1

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 124-97-SUNARP


N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

PLANO DE UBICACIÓN

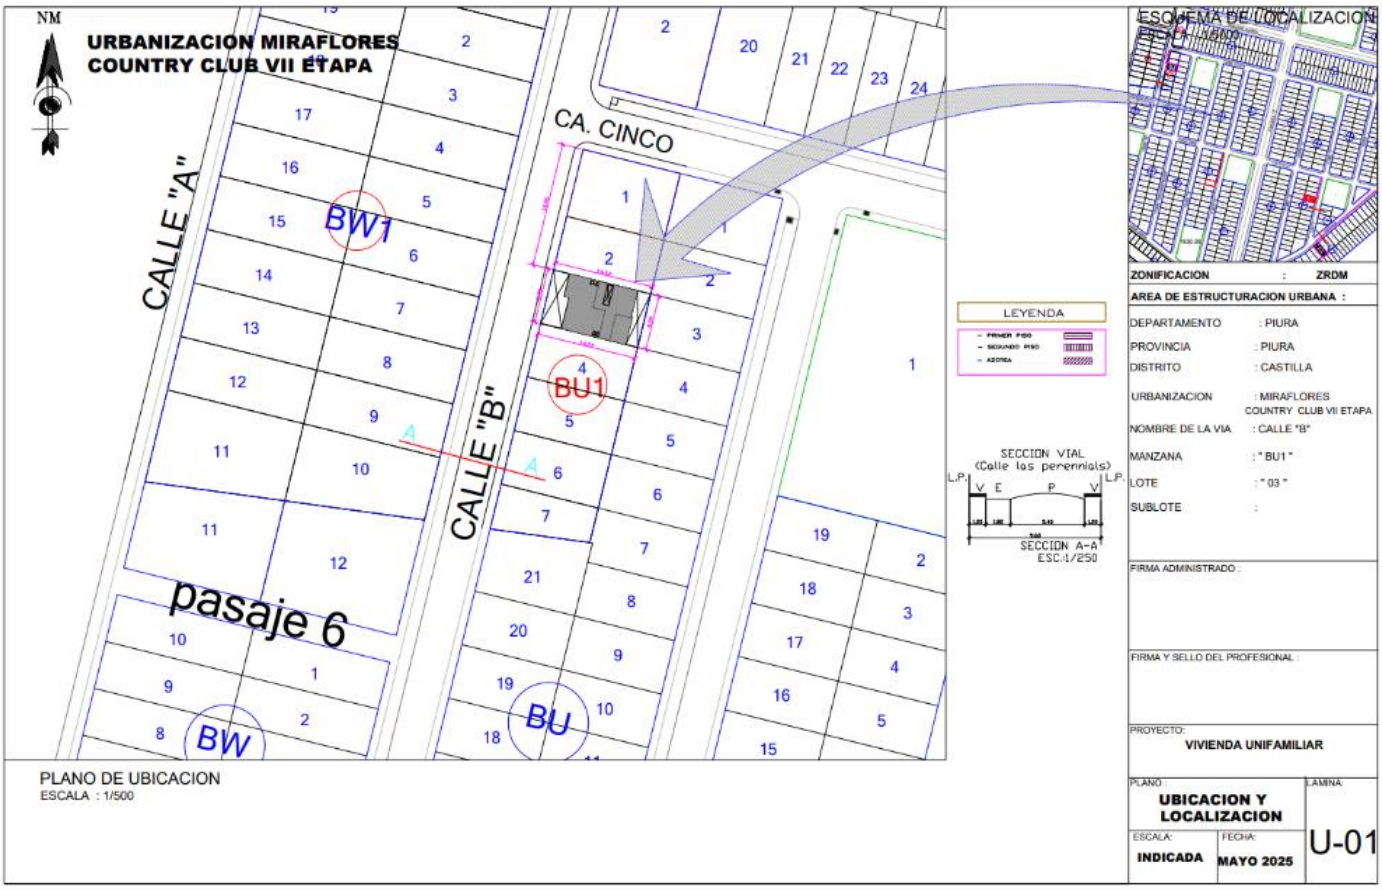


PLANOS

OTRA DOCUMENTACIÓN

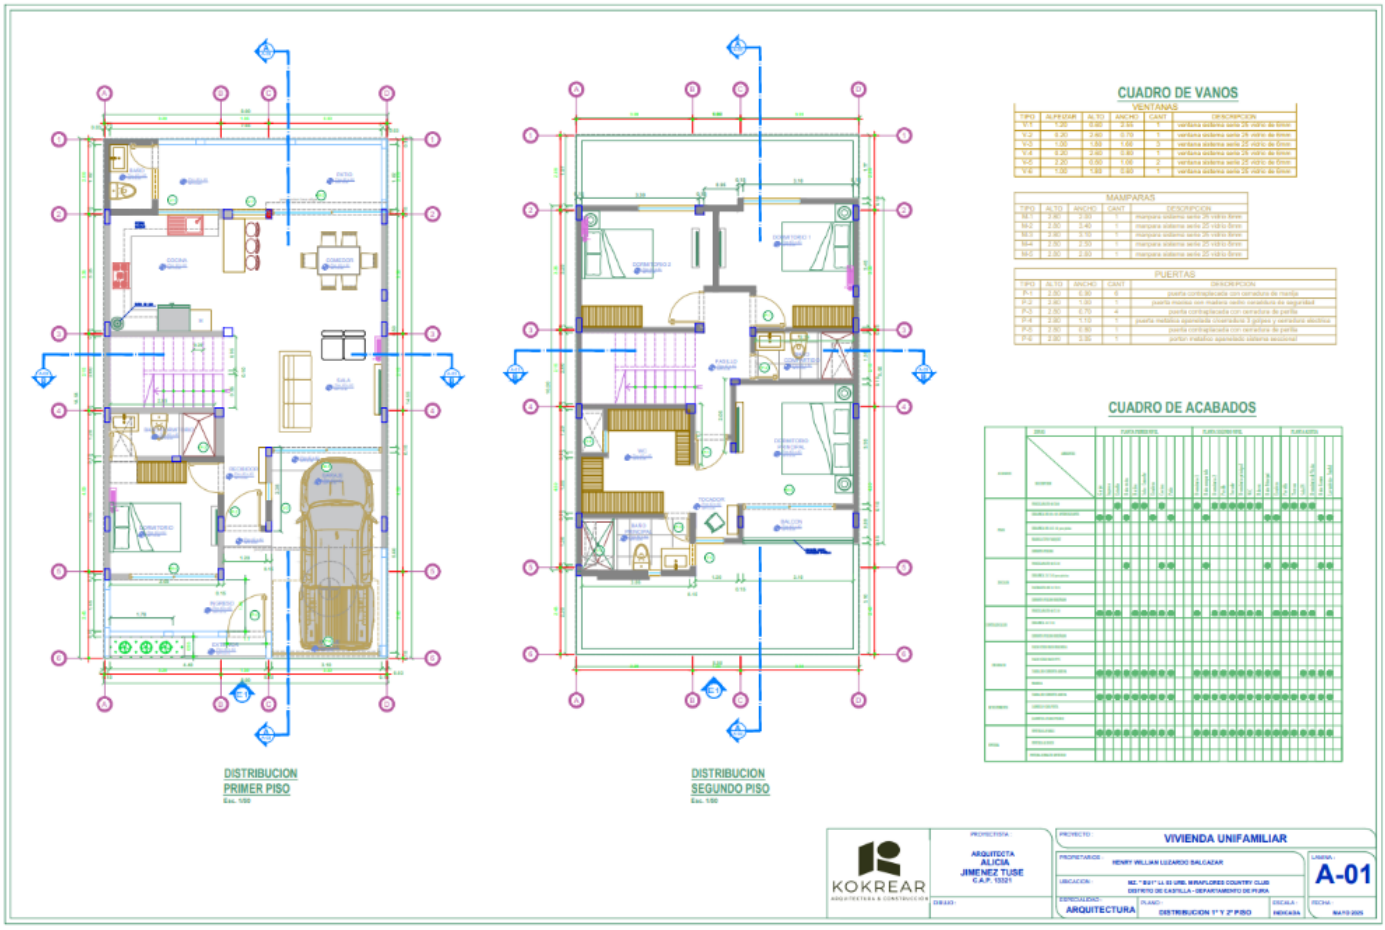

PLANOS

OTRA DOCUMENTACIÓN

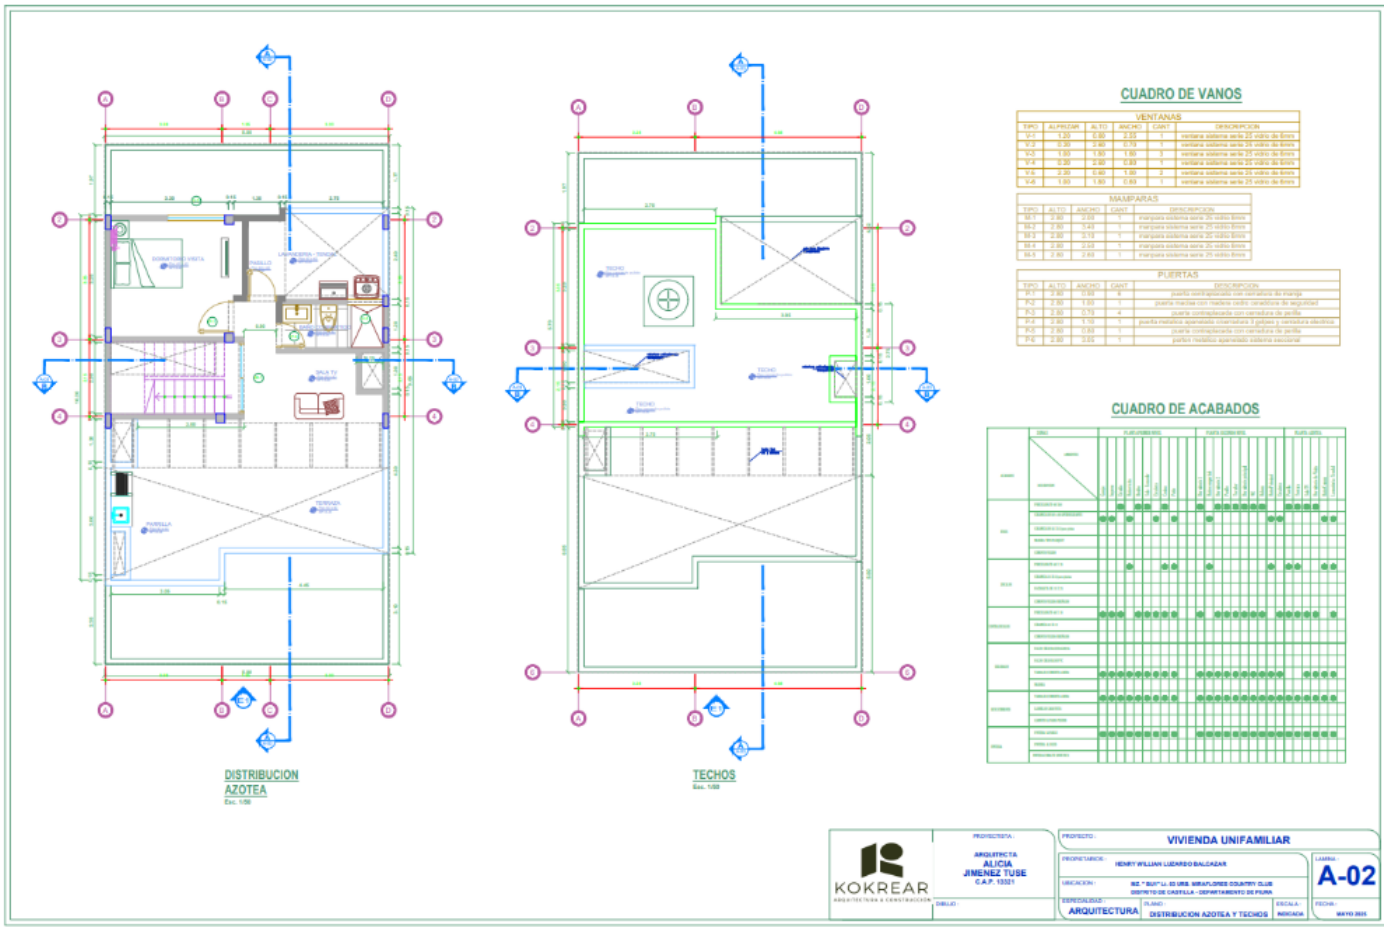

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR

1.- Objetivo:

Licencia de construcción

2.- Propietarios:

HENRY WILLIAM LUZARDO BALCÁZAR

3.- Ubicación del proyecto:

Departamento: Piura, Provincia: Piura, Distrito: Castilla
Urbanización Miraflores Country Club –7ma Etapa
Manzana: "BU1 "Lote Nº: 03

4.- Medidas y linderos del terreno:

Según partida Nº 11166474:

- Por el frente : con calle B y mide 8.00 ml.
- Por la derecha entrando : con lote 4 y mide 14.55 ml.
- Por la izquierda entrando : con lote 2 y mide 14.54 ml.
- Por fondo : con Urbanización Miraflores Country Club 5ta Etapa y mide 8.00 ml.

Área = 116.36 m2
Perímetro = 45.09 ml

5.- Descripción del Proyecto:

El proyecto contempla un (01) ingreso peatonal por el frente principal que se accede desde la Calle "B" y un (01) ingreso vehicular para un (01) estacionamiento que se accede por la misma Calle "B"
La edificación está conformada por dos (02) pisos más azotea.

Total, de área techada = 175.32 m^2
Área libre = 45.00 m^2 (38.67%)

A continuación, se describe el proyecto según plantas arquitectónicas.

PRIMER PISO: **Área techada = 71.36 m^2**
Se desarrolla en el nivel (+ 0.30)

Gerardo Camposverde Paucar
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 248285

- Ingreso
- Garaje
- Terraza exterior
- Estudio
- Baño visita
- Sala
- Escalera de acceso al 2º piso
- Comedor
- Cocina
- Terraza interior

SEGUNDO PISO: **Área techada = 70.76 m²**
Se desarrolla en el nivel (+ 3.35)

- Llega escalera al 2º piso
- Dormitorio principal
- Wolking closet
- Balcón de dormitorio principal
- Baño principal
- Dormitorio 1 c/closet
- Dormitorio 2 c/closet
- Pasillo
- Baño compartido
- Escalera de acceso al tercer piso

TERCER AZOTEA: **Área techada = 33.20 m²**
Se desarrolla en el nivel (+ 6.40)

- Llega escalera al 3º piso
- Terraza
- Parrilla
- Sala TV
- Baño común
- Dormitorio visita
- Lavandería - tendal

6.- <u>Especificaciones técnicas:</u>

- Muros de ladrillo tipo K.K 18 huecos. en aparejo de soga y de cabeza.
- Columnas con zapatas y vigas de amarre de concreto armado.
- Techos de losa aligerada horizontales.
- Pisos de porcelanato de 120 x 60.
- ventanas y mamparas de vidrio doble en ventanas y vidrio de 8 mm en mamparas, ambas con marco de aluminio sistema serio 25.

Gepry Campoverde Paucar
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 248285

- Puertas, en interiores puertas contraplacadas (cedro o similar) y en exteriores con puertas madera maciza (cedro o similar).
- Revestimientos, tarrajeo frotachado y pintura lavable.
- Baños nacionales blancos con porcelanato de 30 x 60 de color.
- Instalaciones eléctricas de primera, corriente monofásica empotrada.
- Instalaciones sanitarias de primera, agua y desagüe empotradas.
- Techo sol y sombra de estructura metálica con policarbonato alveolar.

Genaro Camposverde Paucar
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 248285

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**0**
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

ZONIFICACIÓN



PERÚ Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
PIURA - CATACAOS - CASTILLA Y VEINTISÉIS DE OCTUBRE
2020 - 2040
EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

COORDINADOR TÉCNICO:
DIRECCIÓN DE URBANISMO Y DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ELABORADO POR:
- Municipalidad Provincial de Piura
- Municipalidad Distrital de Catacaos, Castilla y Veintiséis de Octubre

UBICACIÓN:
Región (Departamento) : PIURA
Provincia : PIURA
Distrito : Piura, Catacaos, Castilla y Veintiséis de Octubre

FUENTE:
- AYESSA - UG21 Consultores de Ingeniería S.L.
- Gobierno Regional de Piura.
- Municipalidad Provincial de Piura
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
- Equipo Técnico - PDM Piura-Catacaos-Castilla-Veintiséis de Octubre

PLANO:
ZONIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

PROYECCIÓN / DATUM / ZONA:
Sistema de Coordenadas : UTM
Datum Horizontal : WGS 1984
Zona o Huso Horario : 17 Sur

NOTA:
Los límites político administrativos son censales (INEI 2017), el PDM no define los mismos.

ESCALA DE PRESENTACIÓN:
1:45,000

FECHA:
Febrero - 2026

LÁMINA:
P-3.7.1

ZONIFICACIÓN DE SUELOS

Residencial
- RDM-R
- RDB
- RDB-R
- I1-R-R
- RDA
- RDM
- RDA-R
- I1-R

Industrial
- I1
- I3
- I4

Comercial
- CE
- CE-R
- CM
- CM-R
- CV
- CV-R
- CZ
- CZ-R

Pre urbana
- PU

Zona de recreación pública
- ZRP

Otros usos
- OU

Servicios públicos complementarios
- E1
- E2
- E3
- E4
- H4
- H3
- H2
- H1

Zona de reglamentación especial
- ZRE-7
- ZRE7 - ZPA
- ZRE-CP
- ZRE-R-I
- ZRE-R-II
- ZRE-RUA
- ZRE - TC

Zona arqueológica monumental
- ZAM

Zona agrícola
- ZA

Zona de protección ambiental
- ZPA

Zona de riesgo no mitigable
- ZRNM


Zona eriaza
- ZE

Zona urbana de reserva
- ZUR

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**0**
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

LICENCIA

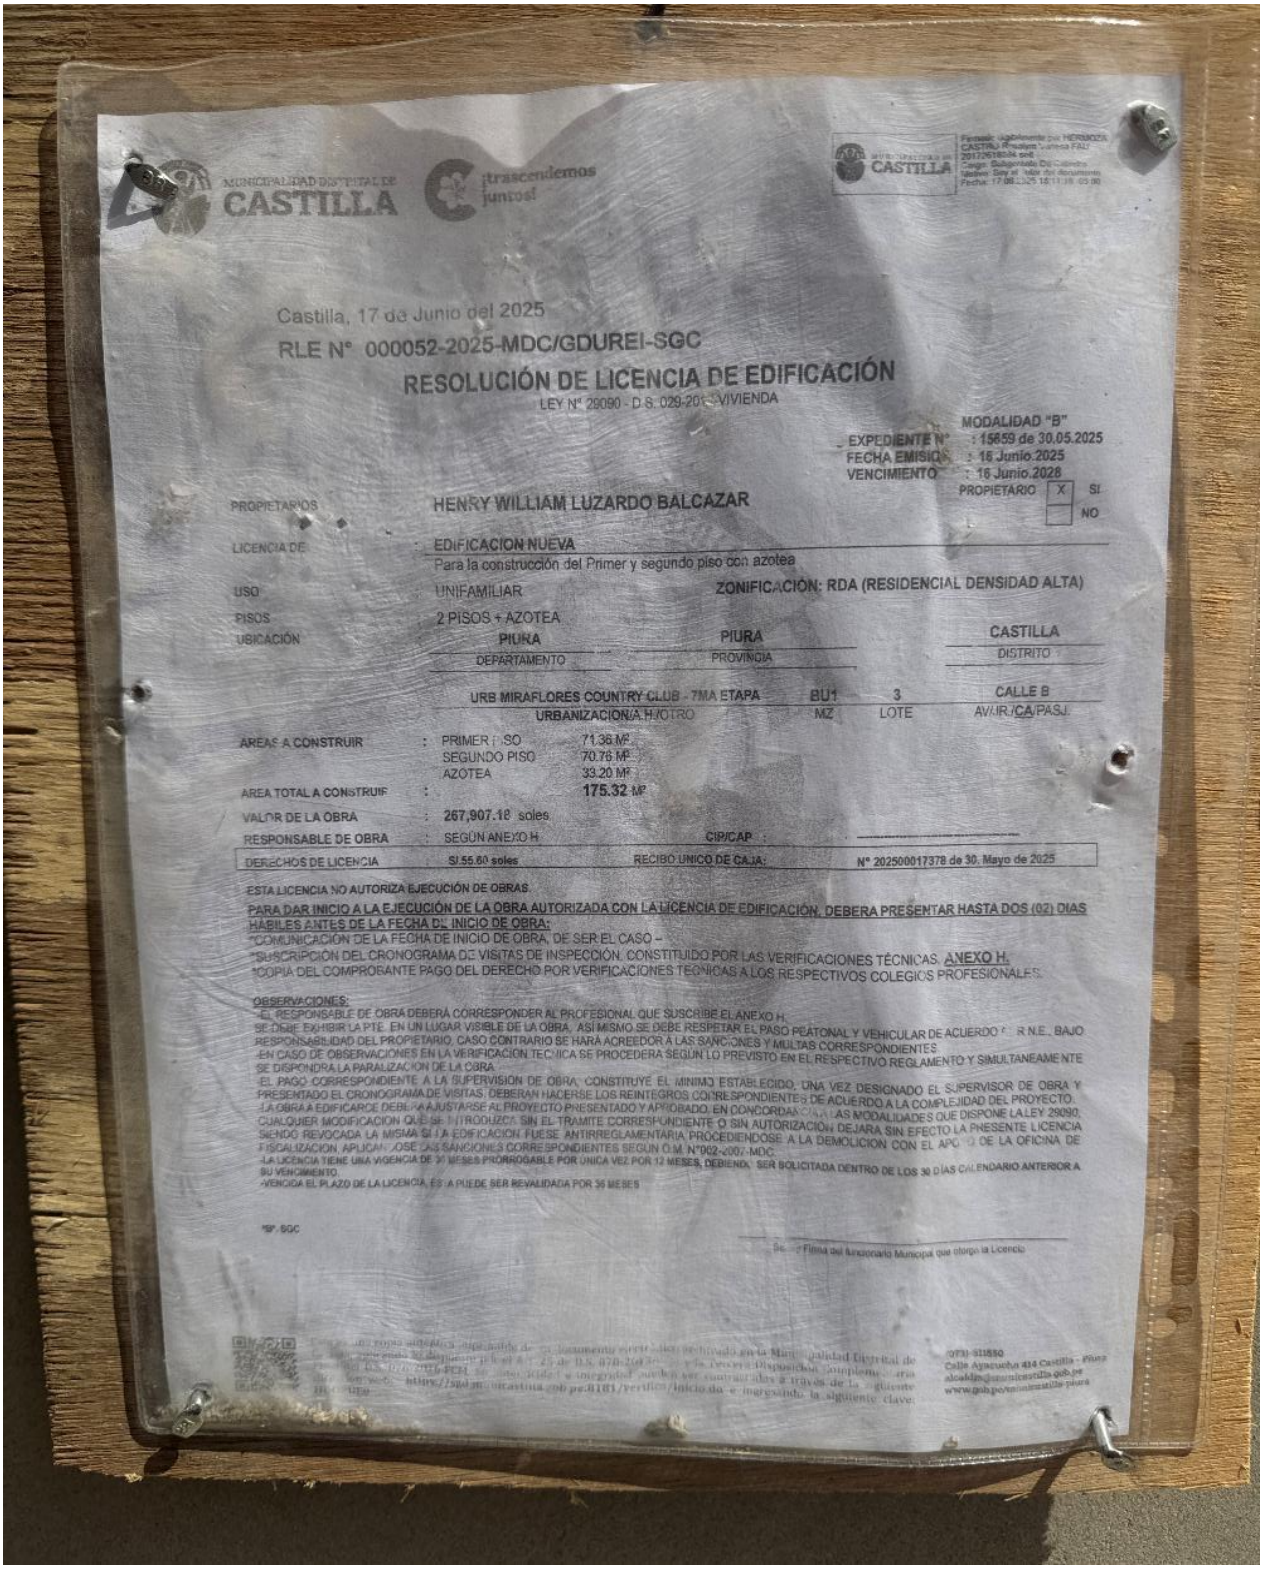

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

¡trascendemos juntos!

CASTILLA

Castilla, 17 de Junio del 2025

RLE N° 000052-2025-MDC/GDUREI-SGC

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN

LEY N° 29090 - D.S. 029-20[illegible] VIVIENDA

MODALIDAD "B"
EXPEDIENTE N° : 15859 de 30.05.2025
FECHA EMISIÓN : 16 Junio 2025
VENCIMIENTO : 16 Junio 2028

PROPIETARIO X SI / NO

PROPIETARIOS: HENRY WILLIAM LUZARDO BALCAZAR

LICENCIA DE: EDIFICACION NUEVA
Para la construcción del Primer y segundo piso con azotea

USO: UNIFAMILIAR — ZONIFICACIÓN: RDA (RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA)

PISOS: 2 PISOS + AZOTEA

UBICACIÓN:

PIURA	PIURA	CASTILLA
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO

URB MIRAFLORES COUNTRY CLUB - 7MA ETAPA	BU1	3	CALLE B
URBANIZACION/A.H./OTRO	MZ	LOTE	AV./JR./CA./PASJ.

AREAS A CONSTRUIR:
PRIMER PISO 71.36 M²
SEGUNDO PISO 70.76 M²
AZOTEA 33.20 M²

AREA TOTAL A CONSTRUIR: **175.32** M²

VALOR DE LA OBRA: 267,907.18 soles

RESPONSABLE DE OBRA: SEGÚN ANEXO H — CIP/CAP:

DERECHOS DE LICENCIA: S/ 55.60 soles — RECIBO UNICO DE CAJA: N° 202500017378 de 30. Mayo de 2025

ESTA LICENCIA NO AUTORIZA EJECUCIÓN DE OBRAS.

PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AUTORIZADA CON LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN, DEBERA PRESENTAR HASTA DOS (02) DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE OBRA:
*COMUNICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO DE OBRA, DE SER EL CASO –
*SUSCRIPCIÓN DEL CRONOGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN, CONSTITUIDO POR LAS VERIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO H.
*COPIA DEL COMPROBANTE PAGO DEL DERECHO POR VERIFICACIONES TÉCNICAS A LOS RESPECTIVOS COLEGIOS PROFESIONALES.

OBSERVACIONES:
-EL RESPONSABLE DE OBRA DEBERÁ CORRESPONDER AL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE EL ANEXO H.
-SE DEBE EXHIBIR LA PTE. EN UN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA, ASÍ MISMO SE DEBE RESPETAR EL PASO PEATONAL Y VEHICULAR DE ACUERDO A LA R.N.E., BAJO RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO, CASO CONTRARIO SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES Y MULTAS CORRESPONDIENTES
-EN CASO DE OBSERVACIONES EN LA VERIFICACIÓN TÉCNICA SE PROCEDERÁ SEGÚN LO PREVISTO EN EL RESPECTIVO REGLAMENTO Y SIMULTANEAMENTE SE DISPONDRÁ LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA.
-EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN DE OBRA, CONSTITUYE EL MÍNIMO ESTABLECIDO. UNA VEZ DESIGNADO EL SUPERVISOR DE OBRA Y PRESENTADO EL CRONOGRAMA DE VISITAS, DEBERÁN HACERSE LOS REINTEGROS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO.
-LA OBRA A EDIFICARCE DEBERÁ AJUSTARSE AL PROYECTO PRESENTADO Y APROBADO, EN CONCORDANCIA CON LAS MODALIDADES QUE DISPONE LA LEY 29090.
-CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE SE INTRODUZCA SIN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE O SIN AUTORIZACIÓN DEJARÁ SIN EFECTO LA PRESENTE LICENCIA SIENDO REVOCADA LA MISMA SI LA EDIFICACIÓN FUESE ANTIRREGLAMENTARIA, PROCEDIÉNDOSE A LA DEMOLICIÓN CON EL APOYO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN, APLICÁNDOSE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES SEGÚN O.M. N°002-2007-MDC.
-LA LICENCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 36 MESES PRORROGABLE POR ÚNICA VEZ POR 12 MESES, DEBIENDO SER SOLICITADA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO ANTERIOR A SU VENCIMIENTO.
-VENCIDO EL PLAZO DE LA LICENCIA, ESTA PUEDE SER REVALIDADA POR 36 MESES

*SGC

Sello y Firma del funcionario Municipal que otorga la Licencia

Para verificar los datos de este documento ingrese a la página web de la Municipalidad Distrital de Castilla (https://sgd.municastilla.gob.pe:8181/verifica/inicio.do) e ingrese la siguiente clave:

Calle Ayacucho 414 Castilla - Piura
alcaldia@municastilla.gob.pe
www.gob.pe/municastilla-piura

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

SUSTENTO DE UBICACIÓN



RECIBO Nº S001-31204301 **Junio-2026**

Castilla / Piura / Piura/

Para Consultas, su código **19163655**

Luzardo Balcazar, Henry William

Mz. BU1 Lote 3 Urb. Miraflores Country Club VII Etapa

Enosa


EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A.

Calle Callao N° 875 - Piura

R.U.C. 20102708394

DATOS DEL SUMINISTRO DE CONSUMO	
Tensión y SED	220 V - BT / D-102243
Sist. Eléctrico	SE0081 Piura (ST2)
Tipo de Conexión	Monofásica-Aérea(C1.1)
Opción Tarifaria	BT5B - Residencial
Medidor Nº	000000026172095 - Electrón.
Hilos	2
Lectura Anterior	37.00 (28/05/2026)
Lectura Actual	37.00 (27/06/2026)
Diferencia de	0.00
Factor	1.0000
Consumo	0.00 kWh

IMPORTES FACTURADOS	
Recibo por Consumo del 29/05/2026 al 27/06/2026	
Cargo Fijo	3.60
Cargo por Reposición y Mantenimiento	1.41
AlumbradoPublico (Alicuota : S/ 0.4500)	0.55
SUB TOTAL	5.56
Imp. Gral. a las Ventas	1.00
Diferencia de redondeo	0.04
TOTAL RECIBO DE JUNIO-2026	6.60
Aporte FOSE(Ley N°27510) S/ 0.08	

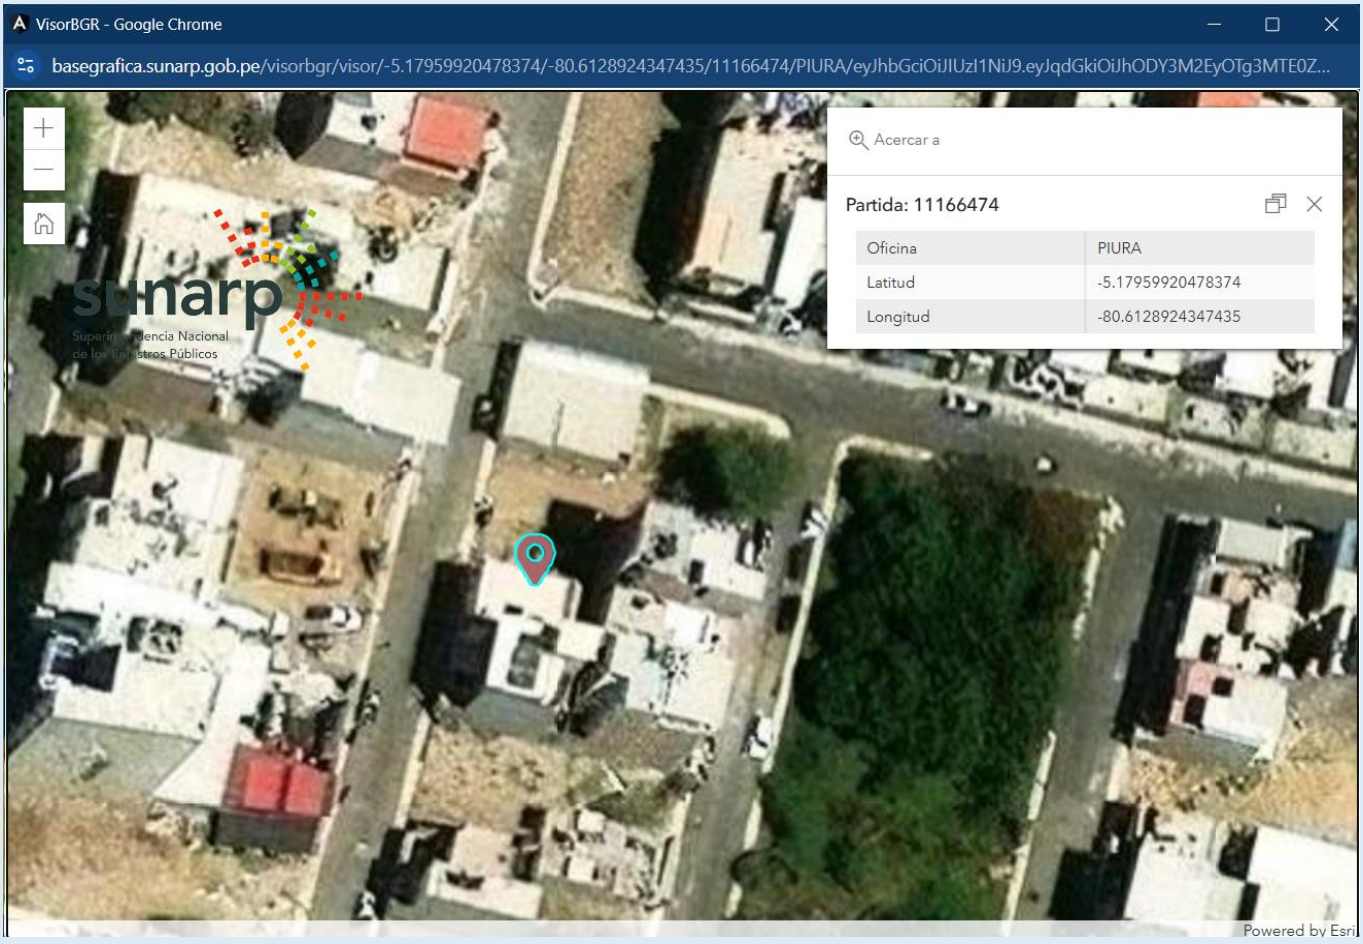

N° de Solicitud Banco	**0**
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

ANEXO DE REGLAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y DECLARACIONES

REGLAMENTACIÓN EMPLEADA

Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, R.M. N° 172-2016-Vivienda. Resolución S.B.S. Nº 11356-2008 para la determinación del valor de realización en el mercado.

METODOLOGÍA

Revisión de documentación: Para el desarrollo del presente informe, se analiza la documentación proporcionada y/o recabada del bien a valuar o tasar y esta sirve de base para el estudio del presente informe.

Inspección: Es realizada con el fin de identificar plenamente la información relevante del bien a valuar o tasar, en donde se recopilan datos cualitativos y cuantitativos que son empleados para el desarrollo del informe profesional de valuación. En la inspección se realiza un reporte fotográfico para registrar gráficamente las características del bien, así como su entorno y ubicación.

Elaboración del informe: En base a la información proporcionada y recabada, se analiza el bien y se desarrolla el informe de valuación (o tasación).
Control de calidad (visado): Elaborado el informe, antes de emitir el informe, pasa por un control de calidad o visado, que valida la información coherencia y metodología empleada por el perito.

De acuerdo a las mejores practicas de la valuación, existen las siguientes metodologías para determinar el valor de un bien y de acuerdo a las características del bien se determina la metodología aplicable para estimar el valor correspondiente:

Enfoque de Mercado (o comparación): Tiene por objetivo determinar el valor de mercado, que corresponde a la cantidad estimada, expresada en términos de dinero que razonablemente se puede esperar de una propiedad en un intercambio entre un vendedor y un comprador voluntario, con equidad para ambos, bajo ninguna presión para comprar o vender y ambos plenamente conscientes de todos los hechos relevantes, en una fecha específica.

Enfoque de Costos (o reposición): El principio de este enfoque, es el de sustitución, se fundamenta en el costo actual de su reproducción o reposición. Cuando se trata de inmuebles, inicialmente se estima el valor de terreno, posteriormente se determina el Costo de Reposición a Nuevo (C.R.N.) tanto de las edificaciones como de obras complementarias y se deduce la depreciación correspondiente (pérdida de valor causada por el deterioro físico, obsolescencia funcional u obsolescencia económica).

Enfoque de Capitalización (o rentas) / Residual (o de flujos): Considera las rentas o ingresos producidas y/o beneficios generados por el objeto de la valuación. La capitalización es un procedimiento por el cual se obtiene el valor de un bien con base en la cantidad de las rentas o beneficios netos futuros que se obtienen durante la vida económica del bien traído a valor presente.

DEFINICIONES

Tasación: Es el procedimiento a través del cual el perito tasador inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características de un bien en determinada fecha para fijar su valor razonable, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales. En caso que la tasación sea retrospectiva se consideran los valores a la fecha solicitada.

Costo: Se refiere a la cantidad de dinero empleada para la creación de una cosa. Dependiendo de lo que se está valorando, se consideran diferentes partidas al completar el costo. Típicamente se diferencia lo que son costos directos, costos indirectos y costos de coordinación.

Valor Similar a Nuevo (VSN): Es el valor de reposición del bien sin depreciar. Monto de un bien nuevo de similares características del analizado. Este método de valoración está basado en el principio del costo necesario para la reproducción o reposición del bien, tomando en cuenta materialidad y calidad constructiva.

Depreciación (Dep): Disminución del valor del bien en función de su uso, estado de conservación y antigüedad.
Homologación: Acción de poner en relación de igualdad o semejante a dos bienes, uno objeto de tasación, y otro objeto comparable, distinguiendo, cuantificando y haciendo intervenir todos aquellos factores que reflejen las diferencias sustantivas entre ambos. Los factores que se utilizan frecuentemente son: Zona, Superficie, Zonificación, Topografía, Ubicación, Negociación, Tipo, Antigüedad, Vistas, etc. Los factores aplicados se multiplican entre si obteniendo un Factor de Homologación Resultante el cual establece el que será el Valor Unitario Resultante a partir de la multiplicación con los valores unitarios de las muestras de mercado. Aplicando un promedio a estos valores resultantes se obtiene el Valor Unitario Aplicable al bien.

Precio: El concepto de precio se relaciona con el intercambio de una mercancía, objeto o servicio y es la cantidad asignada a la obtención del un bien.
Tasación comercial: Es la tasación en la que se utilizan valores del libre mercado aplicando métodos directos e indirectos u otros debidamente sustentados.
Valor comercial o razonable: Valor que se obtiene del estudio y análisis del mercado de bienes de similares características u homogenizados al bien tasado, en la fecha de tasación. Es una aproximación de lo que es el precio, el valor es indefinido y encuadra las cantidades numéricas contenidas ante una situación normal de mercado. Se entiende como la cantidad, expresada en términos monetarios, por la que se intercambiaría un bien en el mercado abierto y competido, entre un comprador y un vendedor, actuando sin presiones ni ventajas de uno u otro, en las circunstancias prevalecientes, en un plazo razonable de exposición.

Valor de Realización: Es el que se obtiene por la compra - venta de un bien, tomando como base el valor comercial y aplicando un factor de reducción, en consideración a la necesidad de vender el bien en el menor tiempo posible.

Factores de Homologación: La homologación es un proceso que tiene como finalidad identificar las pequeñas diferencias que tienen los testigos (bienes inmobiliarios o mobiliarios) comercializados en el mercado y aquel que se quiere valuar, y a la vez cuantificar dichas diferencias expresadas en porcentajes. En términos llanos se puede decir que estos factores bonifican o castigan las características que comparten los testigos con el bien a valuar. Algunos factores usados comúnmente son:

Zonificación La norma urbanística que le aplica y que permite o prohíbe distintos giros, además que indica la intensidad de construcción permisible (niveles) y las áreas libres que deben dejarse.

Antigüedad o Edad: La relación entre la edad del inmueble testigo y la edad del bien a valuar.

Superficie: La relación entre el área de construcción del inmueble testigo y el área de construcción edad del bien a valuar.

Ubicación o Zona: Ubicación relativa en la manzana, puede ser exterior (solo un frente), esquina, doble frente, etc.

Entorno: Características urbanas predominantes en la zona inmediata del testigo, por ejemplo su nivel de equipamiento, de servicios públicos, las actividades colindantes, etc.

Conservación: Las condiciones físicas del inmueble o el mantenimiento del testigo en relación al bien a valuar.

Negociación: Lo que la oferta del testigo cedería en su precio de mercado ante una compra inmediata.

Construcción / Terreno (C/T): La relación entre el área construida y el área de terreno.

BBVA tinsa

N° de Solicitud Banco	**0**
N° de Servicio Tasadora	**260704334**
Fecha de Expedición	17-Jul-2026
Fecha de Caducidad	17-Jul-2027

ANEXO DE REGLAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y DECLARACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE EDIFICACIÓN DE ACUERDO AL MINISTERIO DE VIVIENDA

CLASIFIC.	ESTRUCTURAS		ACABADOS				INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
	MUROS Y COLUMNAS	TECHOS	PISOS	PUERTAS Y VENTANAS	REVESTIMIENTOS	BAÑOS	
A	Estructuras laminadas curvadas de concreto armado que incluyen en una sola armadura la cimentación y el techo (para este caso no se considera el componente N° 2)	Losa o aligerado de concreto armado con luces mayores de 6m con sobrecarga mayor a 300 Kg/m2	Mármol importado, piedras naturales, porcelanato importado	Aluminio pesado con perfiles especiales, madera fina ornamental (caoba, cedro o pino selecto), vidrio insulado	Mármol importado, madera fina (caoba o similar), baldosa acústica en techo o similar	Baños completos de lujo importados con enchape fino (mármol o similar)	Aire acondicionado, iluminación especial, ventilación forzada, sistema hidroneumático, agua caliente y fría, intercomunicador, alarmas, ascensor, sistema de bombeo de agua y desagüe, teléfono, gas natural
B	Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o metálicas	Aligerados o losas de concreto armado inclinadas	Mármol nacional o reconstituido, parquet fino (olivo, chonta o similar), cerámica importada, madera fina	Aluminio o madera fina (caoba o similar) de diseño especial, vidrio tratado polarizado y curvado, laminado o templado	Mármol nacional, madera fina (caoba o similar), enchapes en techos	Baños completos importados con mayólica o cerámico decorativo importado	Sistema de bombeo de agua potable, ascensor, teléfono, agua caliente y fría, gas natural
C	Placas de concreto e=10 a 15cm, albañilería armada, ladrillo o similar con columnas y vigas de amarre de concreto armado	Aligerado o losas de concreto armado horizontales	Madera fina machihembrada, terrazo, porcelanato nacional	Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado polarizado, laminado o templado	Superficie caravista obtenida mediante encofrado especial, enchape en techos	Baños completos nacionales con mayólica o cerámico nacional de color	Sistema de bombeo de agua potable, teléfono, agua caliente y fría, gas natural
D	Ladrillo o similar sin elementos de concreto armado, drywall o similar, incluye techo (para este caso no se considera el componente N° 2)	Calamina metálica, fibrocemento sobre viguería metálica	Parquet de primera, laja, cerámica nacional, loseta veneciana 40x40, piso laminado	Ventanas de aluminio, puertas de madera selecta, vidrio tratado transparente	Enchape de madera o laminados, piedra o material vitrificado	Baños completos nacionales blancos con mayólica blanca	Agua fría, agua caliente, corriente trifásica, teléfono, gas natural
E	Adobe, tapial o quincha	Madera selecta tratada con material impermeabilizante	Parquet de segunda, loseta veneciana 30x30, lajas de cemento con canto rodado	Ventanas de fierro, puertas de madera selecta (caoba o similar), vidrio simple transparente	Superficie de ladrillo caravista	Baños con mayólica blanca parcial	Agua fría, agua caliente, corriente monofásica, teléfono, gas natural
F	Madera (estoraque, pumaquiro, huayruro, machinga, catahua amarilla, copaiba, diablo fuerte, tornillo o similares), drywall o similar sin techo	Calamina metálica, fibrocemento o tejas sobre tijerales o viguería de madera corriente	Loseta corriente, canto rodado, alfombra	Ventanas de fierro o aluminio industrial, puertas contraplacadas de madera (cedro o similar), puertas en material MDF o HDF, vidrio simple transparente	Tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable o barnizado sobre madera	Baños blancos sin mayólica	Agua fría, corriente monofásica, teléfono, gas natural
G	Pircado con mezcla de barro	Madera rústica o caña con torta de barro	Loseta vinílica, cemento bruñado coloreado, tapizón	Madera corriente con marcos en puertas y ventanas de PVC o madera corriente	Estucado de yeso y/o barro, pintura al temple o agua	Sanitarios básicos de losa de segunda, fierro fundido o granito	Agua fría, corriente monofásica, teléfono
H	(No corresponde)	Sin techo	Cemento pulido, ladrillo corriente, entablado corriente	Madera rústica	Pintado en ladrillo rústico, placa de concreto o similar	Sin aparatos sanitarios	Agua fría, corriente monofásica sin empotrar
I	(No corresponde)	(No corresponde)	Tierra compactada	Sin puertas ni ventanas	Sin revestimientos, en ladrillo, adobe o similar	(No corresponde)	Sin instalación eléctrica ni sanitaria

Nota	El valor de la edificación por metro cuadrado se obtiene sumado los valores seleccionados de cada una de las 7 columnas del cuadro de acuerdo a las características predominantes. Estos valores previamente son ajustados. Para este ajuste se multiplica el valor que aparece en la tabla por un factor de ajuste de 1.45. Dicho factor es el resultante de multiplicar 1.18, correspondiente al IGV por un factor de comercialización de 1.25. El factor de comercialización se basa en presupuestos, valorizaciones de obra llevados a cabo por nuestra empresa.

DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS SOBRE LA TASACIÓN

La valuación se ha efectuado con total independencia de criterio, aplicando las normas vigentes de valuación y tasación.
La presente tasación constituye un dictamen de valor para uso exclusivo del propósito expresado en los Antecedentes del mismo, por lo tanto carece de validez si es utilizado para otros fines.

La presente tasación no constituye un dictamen estructural, de cimentación o de cualquier otra rama de la ingeniería civil o la arquitectura que no sea objeto de la valuación, por lo tanto no puede ser utilizado para fines relacionados con esas ramas ni se asume responsabilidad por vicios ocultos u otras características del inmueble que no puedan ser apreciadas en una visita normal de inspección física para efectos de tasación. Incluso cuando se aprecien algunas características que puedan constituir anomalías con respecto al estado de conservación normal -según la vida útil consumida- de un inmueble o a su estructura, el valuador no asume mayor responsabilidad que así indicarlo cuando son detectadas, ya que aunque se presenten estados de conservación malos o ruinosos, es obligación del perito realizar la tasación según los criterios y normas vigentes y aplicables según el propósito del mismo.

ANEXO DE REGLAMENTACIÓN, METODOLOGÍA Y DECLARACIONES

Las superficies utilizadas en la tasación son obtenidas de las fuentes indicadas en la misma. Cuando se indica según medidas, corresponde a una medición física para efectos de avalúo, sin que esto represente un levantamiento exacto, considerando las variantes y hábitos de medición existentes, por lo que su resultado únicamente se destina para fines de cálculo de la tasación.

La edad del inmueble se considera en base a la información documental existente (licencias de construcción, predio urbano, escrituras u otros) y en su caso, se estima en base a lo apreciado físicamente.

La probable existencia de gravámenes, reservas de dominio, adeudos fiscales o de cualquier otro tipo que pudieran afectar el bien que se valúa, que no hayan sido declarados por el solicitante y/o propietario del mismo, no serán de nuestra responsabilidad por información omitida en la solicitud de la tasación.

La presente tasación es de USO exclusivo del(os) solicitante(s) para el destino o propósito expresado en los Objetivos y Propósitos planteados en el numeral 1. Antecedentes del Informe, por lo que no podrá ser utilizado para fines distintos.
